



ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 DE ABRIL DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0042 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 1RA SECC. LOCALIDAD: 0028.- R/A. REFORMA 1RA SECC. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 29,045.95

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NAT.

UNIDAD: REHABILITACION

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-mar-2022
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 15-abr-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 494 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Table with 6 columns: Clave, Conceptos, Unidad, Cantidad, P.IJ, IMPORTE. Contains 15 rows of work items and a summary row.

META: 1 REHABILITACION

INICIO REAL: 1-mar-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 29,045.95

TERMINO REAL: 15-abr-2022

SALDO POR CANCELAR: \$ 0.00

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

Table with 3 columns: No. De Oficio, Fecha, Inversión (\$). Row 1: 15 SESIÓN EXTRAORDINARIA, 18-feb-2022, \$ 29,045.95

MODIFICACIONES (DE METAS)

Table with 3 columns: No. de oficio, Fecha, Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

Año de 2021

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISIÓN

ING. ANYELÓ VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIDAD ARNULFO OLAN CHABLE DELEGADO MUNICIPAL

COMITÉ (x)



Presidente

MATEO DE LA O CRUZ GARCIA

1ER. Vocal

Rubi del Carmen Hernandez J. RUBI DEL CARMEN HERNANDEZ JIMENEZ

2DO. Vocal

EVARISTA DE LA CRUZ GARCIA

3ER. Vocal

Veronica de la C. G. VERONICA DE LA CRUZ GARCIA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRICAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10042 **DESCRIPCIÓN:** REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 1RA SECC.

LOCALIDAD: 0028.- R/A. REFORMA 1RA SECC.

GENERADOR DE OBRA

| Clave | Conceptos | Unidad | MATERIAL |
|-------|--|--------|----------|
| | ADQUISICION DE: | | |
| 1 | SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO | PIEZA | 36 |
| 2 | SUMINISTRO DE FOTOCONTROL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK | PIEZA | 18 |
| 3 | SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK | ML | 100 |
| 4 | SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR | ML | 22 |
| 5 | SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY | PIEZA | 40 |
| 6 | SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16 TORK | PIEZA | 16 |
| 7 | SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER | PIEZA | 1 |
| 8 | SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER | PIEZA | 1 |
| 9 | SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER | PIEZA | 1 |
| 10 | SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER | PIEZA | 1 |
| 11 | SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER | PIEZA | 1 |
| 12 | SUMINISTRO SOQUET MOGUL REDUCTOR REDUCTOR | PIEZA | 10 |
| 13 | SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER | PIEZA | 7 |
| 14 | SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG. SCOTCH | PIEZA | 2 |
| 15 | SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILO DE ACERO, SOQUET E29. SOLA | PIEZA | 4 |

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

12/Abril/2022

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10042.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Reforma 1ra Sección.

Localidad: 0028.- R/a. Reforma 1ra. Sección.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 29,045.95

Fecha de inicio: 01/ Marzo /2022

Fecha de terminación: 15/ Abril /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en la R/a. Reforma 1ra. Sección de Jalpa de Méndez, para realizar los trabajos correspondientes al proyecto 10042: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Reforma 1ra. Sección.

En la R/a. Reforma 1ra. Sección se instaló el siguiente material eléctrico.

36 pzas de Focos LED de 50 W.

16 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

18 pza de Foto celdas de 220 V.

100 mts (1 rolló) de Cable forrado THW cal. 12.

22 mts cable de aluminio 1+1 baja tención cal. 6

4 pza. Gabinete Suburbano de aluminio completo.

40 pza Conector bimetálico 6-8

10 pza de Soquet mogul reductor

7 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

2 pza Cinta Aislante super 33

Mano de obra

3 oficiales electricistas

2 ayudantes

1 chofer

Herramienta y equipo




Herramienta menor

1 Camioneta Chevrolet pikup

SUPERVISOR

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMÉNEZ

SUPERVISOR

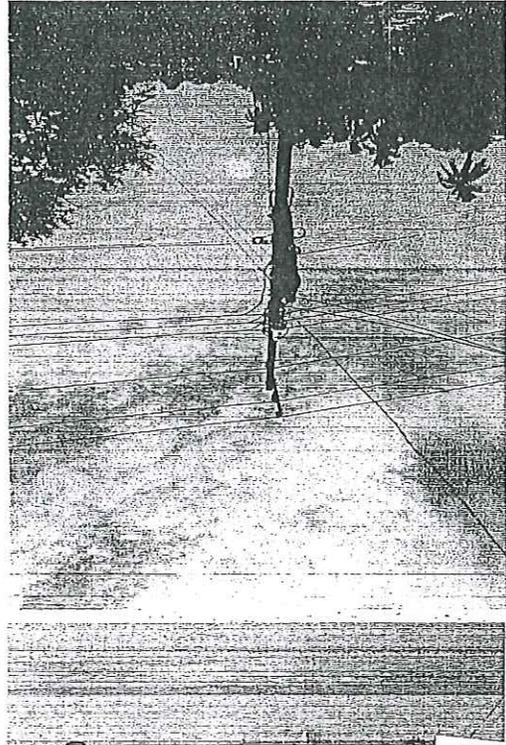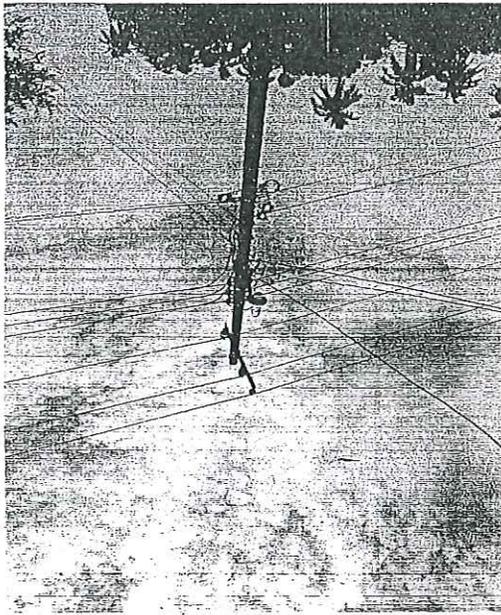

ALBUM FOTOGRAFICO

| | | |
|--|--------------|----------------------------------|
| LOCALIDAD R/A. REFORMA 1RA SECC. | 10042 | LOCALIDAD R/A. REFORMA 1RA SECC. |
| REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 1RA SECC. | DESCRIPCIÓN: | PROYECTO: |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

DEPENDENCIA:

SECRETARÍA DE LA SECCIÓN MUNICIPAL
Rigardo



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES






Ricardo
Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------------|--|
| PROYECTO: | 10042 | DESCRIPCIÓN: | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 1RA SECC. |
| LOCALIDAD: | 0028.- R/A. REFORMA 1RA SECC. | | |

ALBUM FOTOGRAFICO

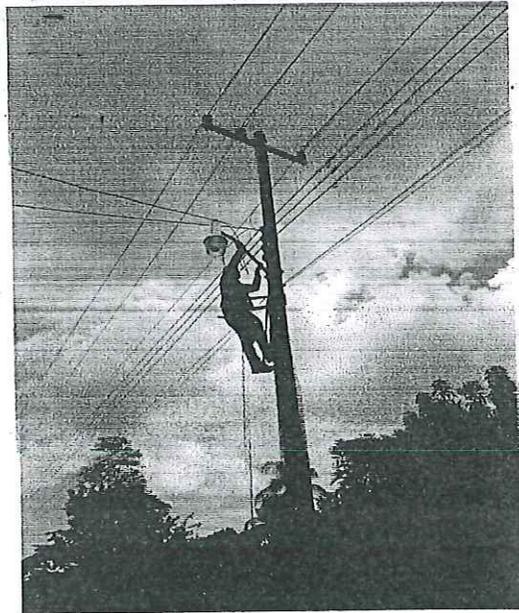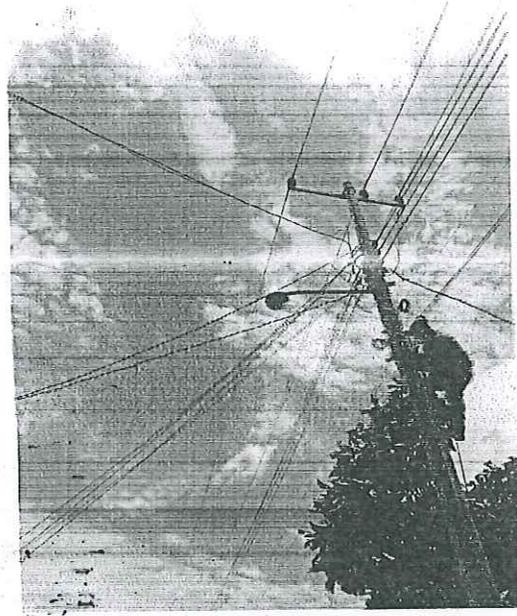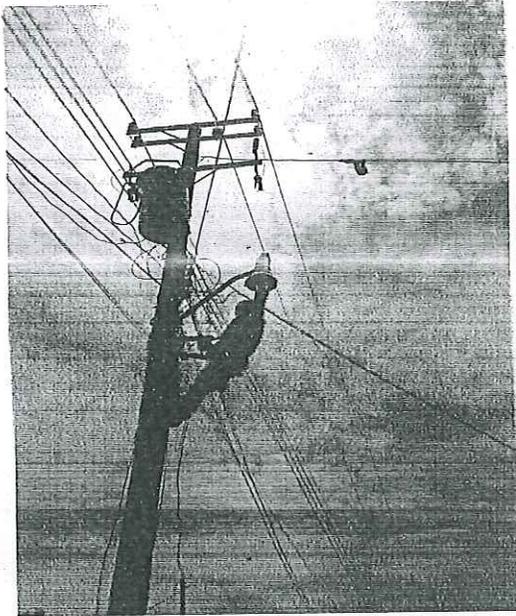

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo

Año de

PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ 10042.-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD RA. REFORMA 1RA. SECC.

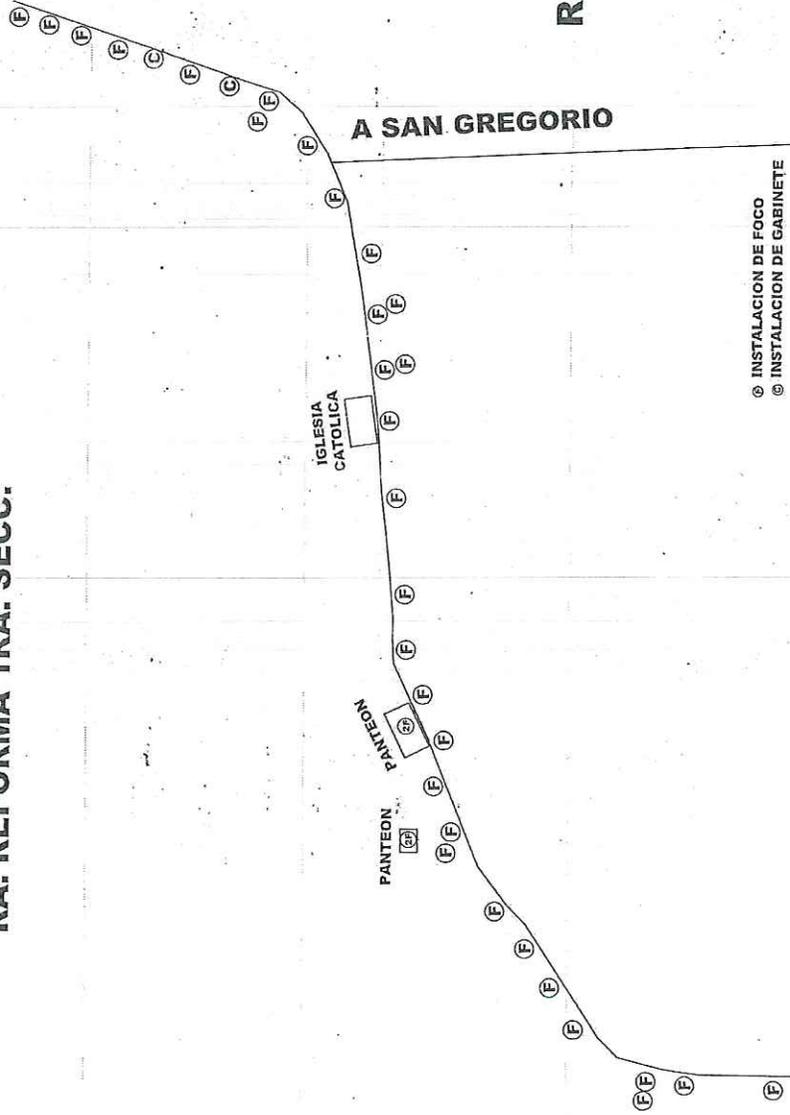

CROQUIS

RA. REFORMA 1RA. SECC.

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

© INSTALACION DE FOCO
© INSTALACION DE GABINETE
