



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Maíz
PATRIOTAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 07 DE ABRIL DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10056 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN

LOCALIDAD: 0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA SECC MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 71,902.96

META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NAT.

UNIDAD: REHABILITACION INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-mar-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 15-abr-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 974 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U.	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE					
1	SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO	PIEZA	90	\$ 350.00	\$ 31,500.00
2	SUMINISTRO DE FOTOCONTROL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK	PIEZA	65	\$ 227.59	\$ 14,793.35
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK	ML	100	\$ 12.98	\$ 1,298.00
4	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10 VOLTECK	ML	30	\$ 19.50	\$ 585.00
5	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR	ML	30	\$ 25.00	\$ 750.00
6	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY	PIEZA	65	\$ 28.79	\$ 1,871.35
7	SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16 TORK	PIEZA	25	\$ 62.93	\$ 1,573.25
8	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER	PIEZA	1	\$ 64.66	\$ 64.66
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER	PIEZA	1	\$ 64.66	\$ 64.66
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER	PIEZA	2	\$ 64.66	\$ 129.32
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER	PIEZA	3	\$ 64.66	\$ 193.98
12	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER	PIEZA	3	\$ 64.66	\$ 193.98
13	SUMINISTRO SOQUET MOGUL REDUCTOR REDUCTOR 220V A 110V ROYER	PIEZA	25	\$ 60.34	\$ 1,508.50
14	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER	PIEZA	10	\$ 27.59	\$ 275.90
15	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG. SCOTCH	PIEZA	4	\$ 108.34	\$ 433.36
16	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILO DE ACERO, SOQUET E29. SOLA	PIEZA	9	\$ 750.00	\$ 6,750.00
SUBTOTAL					\$ 61,985.31
16% IVA					\$ 9,917.65
TOTAL					\$ 71,902.96

META: 1 REHABILITACION

INICIO REAL: 1-mar-2022

TERMINO REAL: 15-abr-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 71,902.96

SALDO POR CANCELAR: \$ 0.00

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE

No. De Oficio
15 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha
18-feb-2022

Inversión (\$)71,902.96

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIDAD: C. ISMAEL PEREZ HERNANDEZ DELEGADO MUNICIPAL

COMITE

Presidente

C. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ISIDRO

1ER. Vocal

C. SILVESTRE ROSCA CERINO

Secretario

C. SEBASTIAN FRIAS TOSCHI

2DO. Vocal

C. LUIS DOMINGO ISIDRO ALMEIDA

3ER. Vocal

C. MANUEL ANTONIO IZQUIERDO

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:		H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.	
PROYECTO:	10056	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN
LOCALIDAD:		0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA SECC	
GENERADOR DE OBRA			

Clave	Conceptos	Unidad	MATERIAL
1	ADQUISICION DE:		
1	SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO	PIEZA	90
2	SUMINISTRO DE FOTOCONTROL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK	PIEZA	65
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK	ML	100
4	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10 VOLTECK	ML	30
5	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR	ML	30
6	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8-MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY	PIEZA	65
7	SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16 TORK	PIEZA	25
8	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER	PIEZA	1
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER	PIEZA	1
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER	PIEZA	2
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER	PIEZA	3
12	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER	PIEZA	3
13	SUMINISTRO SOQUET MOGUL REDUCTOR REDUCTOR	PIEZA	25
14	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER	PIEZA	10
15	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG.	PIEZA	4
16	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO	PIEZA	9

Total de lamparas reparadas 100


 SUPERVISOR
 ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

7/Abril/2022

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10056.- Rehabilitación del alumbrado público, en la comunidad: R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

Localidad: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 71,902.96

Fecha de inicio: 01/ Marzo /2022

Fecha de terminación: 15/ Abril /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección de Jalpa de Méndez, para realizar los trabajos correspondientes al proyecto 10056: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección.

En la R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección, se instaló el siguiente material eléctrico.

90 pzas de Focos LED de 50 W.

25 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

65 pza de Foto celdas de 220 V.

100 mts de Cable forrado THW cal. 12.

30 mts de Cable forrado THW cal. 10.

30 mts Cable de aluminio 1+1 Baja tensión cal. 6

9 pza Gabinete suburbana de aluminio completo.

65 pza Conector Bimetálico 6-8

1 pza Eslabón fusible de 60 kva.

1 pza Eslabón fusible de 50 kva.

2 pza Eslabón fusible de 30 kva.

3 pza Eslabón fusible de 15 kva.

3 pza Eslabón fusible de 3 kva.

4 pza Cinta aislante súper Scotch super 33

25 pza Soquet Mogul reductor.

10 pza Soquet para interperie

Mano de obra

7 Oficiales eléctricos

3 ayudantes

2 Choferes

Herramienta y equipo

Herramienta menor

2 Camioneta Chevrolet pikut

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES





2022 Ricardo Flores
Año de **MAJÓN**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO:	10056	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN
LOCALIDAD:	0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA SECC		

ALBUM FOTOGRAFICO

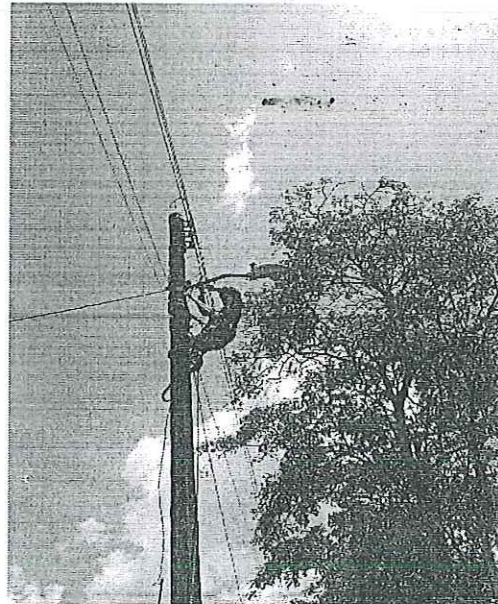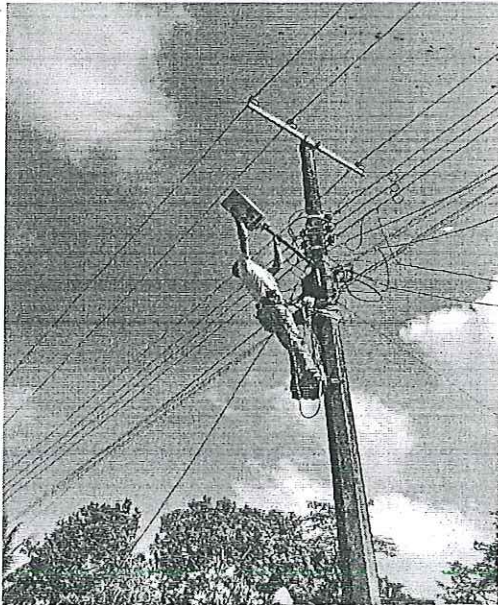

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES






2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ.

PROYECTO:	10056	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN
LOCALIDAD:	0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA SECC		

ALBUM FOTOGRAFICO

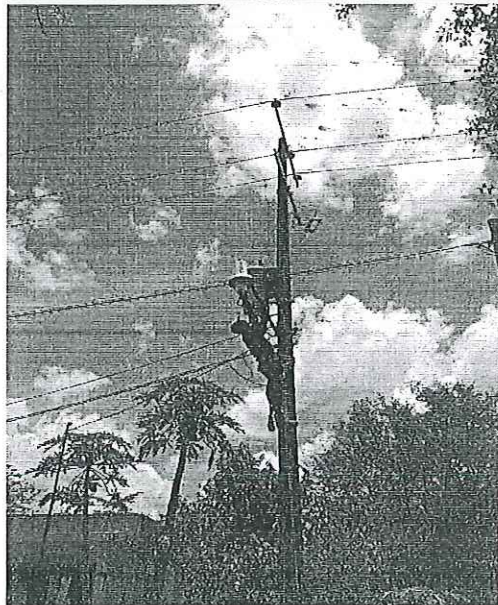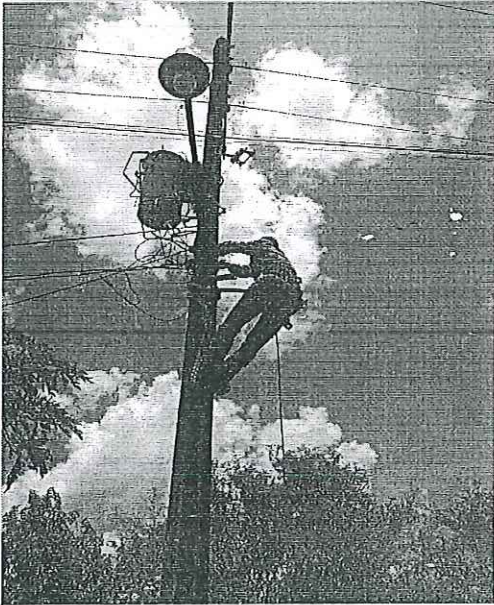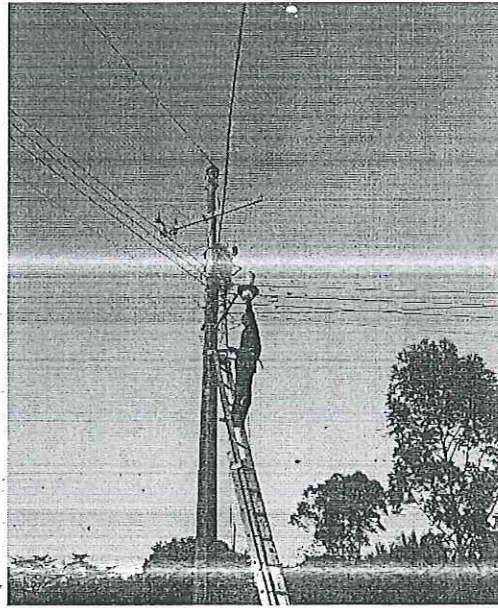

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo
AÑO DE
PRECURSOR DE LA REVOLUCION MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10056. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD
RA. VICENTE GUERRERO 1RA SECC

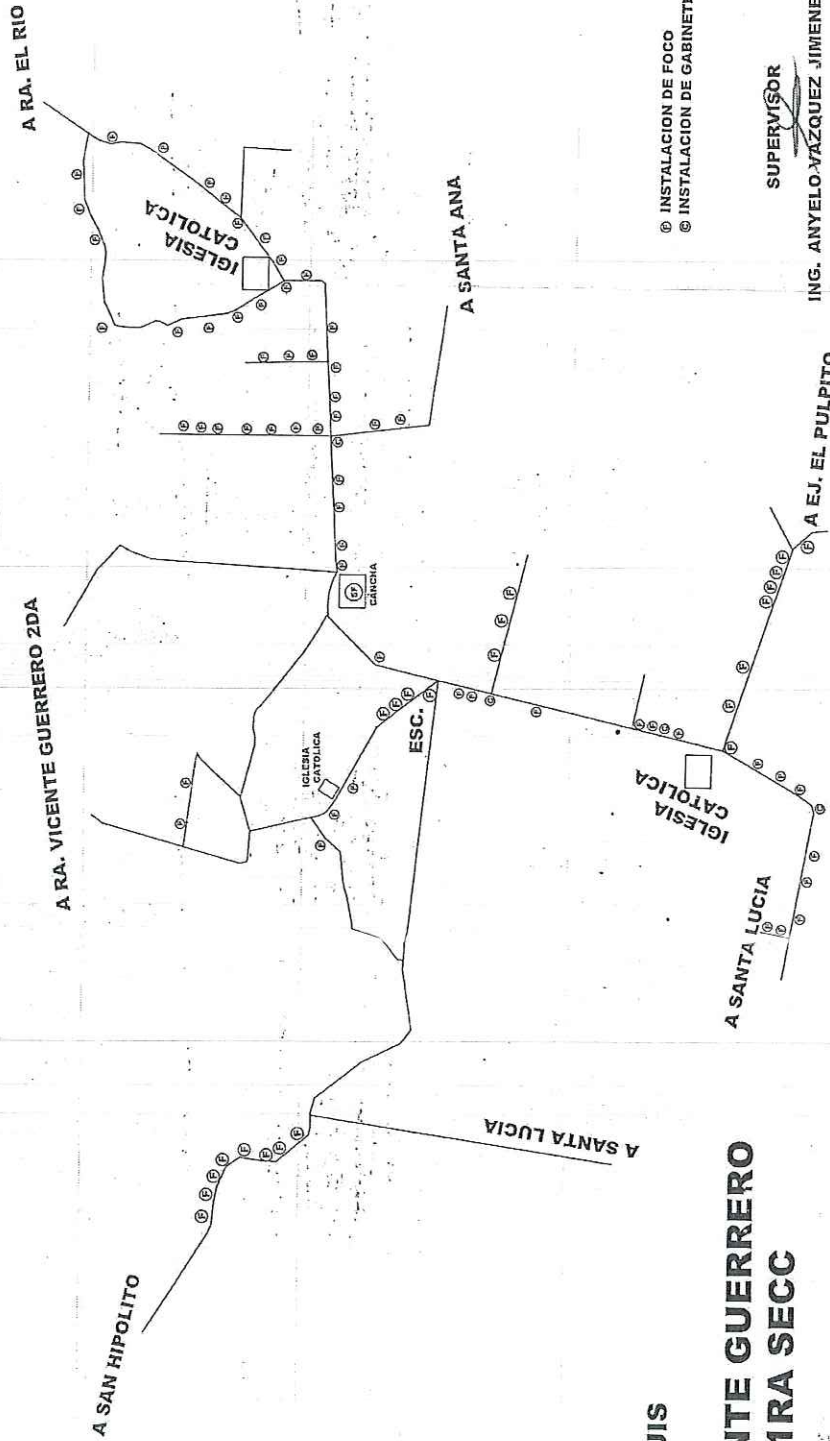

CROQUIS

**RA. VICENTE GUERRERO
1RA SECC**

⊙ INSTALACION DE FOCO
⊙ INSTALACION DE GABINETE

SUPERVISOR

ING. ANYELO YAZQUEZ JIMENEZ
