

RAMO 33 FONDO III

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 05 DE ABRIL DE 2022  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10046 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA)

LOCALIDAD: 0054.- R/A. TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 23,360.09

META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NAT.

UNIDAD: REHABILITACION INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-mar-2022  
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 15-abr-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 348 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
1	<b>ADQUISICION DE:</b>				
1	SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO	PIEZA	30.00	\$ 350.00	\$10,500.00
2	SUMINISTRO DE FOTOCONTROL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK	PIEZA	12.00	\$ 227.59	\$2,731.08
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK	ML	60.00	\$ 12.98	\$1,038.40
4	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10 VOLTECK	ML	15.00	\$ 19.50	\$292.50
5	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR	ML	10.00	\$ 25.00	\$250.00
6	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY	PIEZA	30.00	\$ 28.79	\$863.70
8	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER	PIEZA	1.00	\$ 64.66	\$64.66
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER	PIEZA	1.00	\$ 64.66	\$64.66
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER	PIEZA	1.00	\$ 64.66	\$64.66
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER	PIEZA	1.00	\$ 64.66	\$64.66
12	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER	PIEZA	1.00	\$ 64.66	\$64.66
13	SUMINISTRO SOQUET MÓGUL REDUCTOR REDUCTOR 220V A 110V ROYER	PIEZA	10.00	\$ 62.93	\$629.30
14	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER	PIEZA	5.00	\$ 27.59	\$137.95
15	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG. SCOTCH	PIEZA	2.00	\$ 108.34	\$216.68
16	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILO DE ACERO, SOQUET E29. SOLA	PIEZA	3.00	\$ 750.00	\$2,250.00
				SUBTOTAL	\$ 19,232.91
				16% IVA	\$ 3,077.27
				TOTAL	\$ 22,310.18

META: 1 REHABILITACION

INICIO REAL: 1-mar-2022

TERMINO REAL: 15-abr-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 22,310.18

SALDO POR CANCELAR: \$ 1,049.91

DATOS GENERALES

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
15 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha  
18-feb-2022

Inversión (\$)  
\$ 23,360.09



MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ FERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISIÓN

ING. ANSELMO VAZQUEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( : )

Presidente

*[Signature]*

C. MAURA OVAHDO GOMEZ

1ER. Vocal

*[Signature]*

C. MARIA ASPEEL GARCIA AVALOS

3ER. Vocal

*[Signature]*

C. BLANCA MARIA AVALOS SANCHEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

*[Signature]*

ARQ. WENERGE VARGAS MADRIGAL

Secretario

*[Signature]*

C. ROMANA SANCHEZ ALVAREZ

2DO. Vocal

*[Signature]*

C. MATILDE AVALOS SANCHEZ



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Razones: \_\_\_\_\_

Nombre y firma: \_\_\_\_\_



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10046 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA DESCRIPCIÓN: LOCALIDAD R/A. TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA)

LOCALIDAD: 0054.- R/A. TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA)

**GENERADOR DE OBRA**

Clave	Conceptos	Unidad	MATERIAL
1	<b>ADQUISICION DE:</b>		
1	SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO	PIEZA	30
2	SUMINISTRO DE FOTOCONTROL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK	PIEZA	12
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK	ML	80
4	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10 VOLTECK	ML	15
5	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR	ML	10
6	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY	PIEZA	30
8	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER	PIEZA	1
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER	PIEZA	1
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER	PIEZA	1
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER	PIEZA	1
12	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER	PIEZA	1
13	SUMINISTRO SOQUET MOGUL REDUCTOR REDUCTOR	PIEZA	10
14	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER	PIEZA	
15	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG. SCOTCH	PIEZA	2
16	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILO DE ACERO, SOQUET E29. SOLA	PIEZA	3

NOTA: TOTAL DE LAMPARAS REPARADAS 40

SUPERVISOR  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

05/Abril/2022

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10046.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección.

Localidad: 0054.- R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 23,360.09

Fecha de inicio: 01/ Marzo /2022

Fecha de terminación: 15/ Abril /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en la R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección de Jalpa de Méndez, para realizar los trabajos correspondientes al **proyecto 10046: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección.**

En la R/a. Tierra Adentro 3ra. Sección se instaló el siguiente material eléctrico.

30 pzas de Focos LED de 50 W.

10 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

12 pza de Foto celdas de 220 V.

80 mts de Cable forrado THW cal. 12.

15 mts de Cable forrado THW cal. 10.

10 mts cable de aluminio 1+1 baja tención cal. 6

3 pza. Gabinete Suburbano de aluminio completo.

30 pza Conector bimetálico 6-8

15 pza de Soquet mogul reductor

5 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

- 1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.
- 1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.
- 1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.
- 2 pza Cinta Aislante super 33

**Mano de obra**

- 3 oficiales electricistas
- 2 ayudantes
- 1 chofer

**Herramienta y equipo**

- Herramienta menor
- 1 Camioneta Chevrolet pikup

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**





**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO:	10046	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA)
LOCALIDAD:	0054.- R/A. TIERRA ADENTRO 3RA SECCIÓN (EL VIGIA)		

ALBUM FOTOGRAFICO

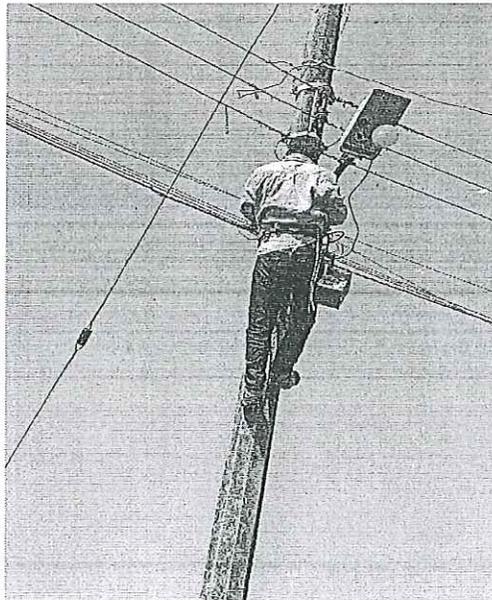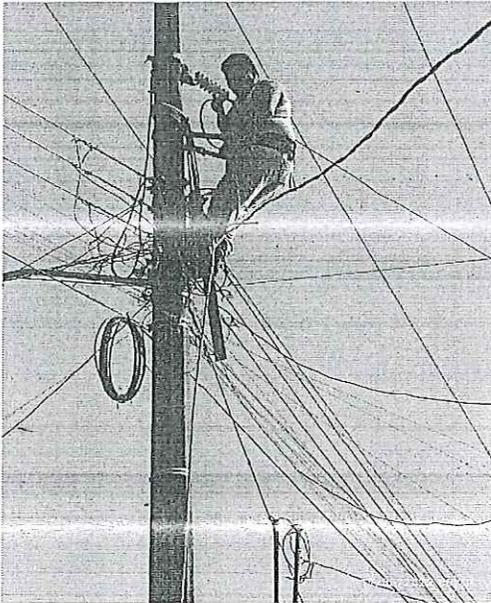

SUPERVISOR  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo López Maza**  
Año de  
PRECURSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**I0046. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD  
H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ  
A RA, TIERRA ADENTRO 3RA. SECC.  
A RA, TIERRA ADENTRO 1RA**

**AL BORDO NACAJUCA**

**A RA. SAN NICOLAS**

**IGLESIA  
SAN JOSE**

**A SANTA ISABEL**

**CROQUIS**

**RA. TIERRA ADENTRO  
3RA SECC.**

**SUPERVISOR**

**ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ**

**A TIERRA  
ADENTRO 2DA**
