



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## ACTA DE RECEPCION FISICA CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD:001 JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 09:30 HRS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2023 SE ENCUENTRAN EL ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. JOSUE GARCIA GERONIMO(REPRESENTANTE LEGAL): PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0018.-CONSTRUCCION DE BANQUETA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO DE CALLE NEGRETE AL CENTRO CULTURAL, BARRIO LA GUADALUPE.

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
<b>PRELIMINARES</b>			
LET-OBRA	Construcción de letrero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de ptr de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm <sup>2</sup> . de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1.00
<b>DEMOLICIONES</b>			
CCC-389	Demolición con herramienta manual de guarnición de concreto simple	m <sup>3</sup>	19.58
CCC-390	Demolición con herramienta manual de banquetas de concreto hidráulico reforzado	m <sup>3</sup>	32.41
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m <sup>3</sup> .	51.99
CCC-106	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m <sup>3</sup> /km	51.99
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m <sup>3</sup> /km	207.96
CORTE-MTERRA	Corte de terreno natural tipo "A" por medios manuales de 0.00 a 15.00 cm de esp. Incluye: acopio de material para su posterior retiro de la obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m <sup>3</sup> .	53.07
CCC-013	Compactación de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavación adicional con equipo mecánico al noventa por ciento (90%) M.V.S.M.	m <sup>3</sup>	45.35
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (ballarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m <sup>3</sup> .	69.51



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## ACTA DE RECEPCION FISICA CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m <sup>3</sup>	45.35
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m <sup>3</sup> /km	45.35
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m <sup>3</sup> /km	181.40
<b>GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>			
GUARN 15X25	Construcción de guarnición de concreto hecho en obra f'c = 150kg/cm <sup>2</sup> . de 15x30cms. sin armar, incluye: cimbra metálica, descimbra, fabricación y vaciado de concreto, desperdicios, volteador en las aristas, junta de celotex de 13 mm (1/2") o similar a cada 12 mt., mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	12.00
CCC-295	Banqueta de concreto premezclado tiro directo, F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> con t.m.a. de 19 mm (3/4"), de 10 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado con volteador en las aristas	m <sup>2</sup> .	408.87
CCC-145	Construcción de junta en banqueteta de concreto hidráulico a cada 2.50 m a base de junta de plástico premoldeada Juntacreto T marca Curacreto o similar de 3.8 cm de altura	ml.	163.55
CCC-823	Pintura para tránsito base solvente (alquidial - hule clorado) libre de plomo color amarillo línea Via Color marca Comex o similar sobre guarniciones de 30 cm de desarrollo promedio con espesor de película húmeda de 381 micras (0.015")	ml.	96.00
CCC-419B	Suministro y colocación de placa de discapacitados a base de poli concreto de 40x40x2.5 cm., sin relieve color azul y blanco, incluye; materia y mano de obra	Pieza	6.00
CCC-419C	Construcción de rampa de 1.50 x 1.00 y 8 cm de espesor para personas con capacidades diferentes, a base de concreto F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> , t.m.a. de 19 mm (3/4") de diámetro, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado.	Pieza	6.00
CCC-197	Construcción de rampa vehicular de 1.35 x 3.00 m y 10 cm de espesor, con concreto F'c = 200 kg/cm <sup>2</sup> , t. m. a. 19 mm (3/4") de diámetro, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado	pza.	22.00
<b>JARDINERIA</b>			



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## ACTA DE RECEPCION FISICA CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

ALMA KERPI	Suministro y sembrado de planta kerpis de 1.50 mts de altura: suministro de material, apertura de cepa y agua de riego hasta recepción física de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	10.00
<b>CANTIDADES ADICIONALES</b>			
CCC-389	Demolición con herramienta manual de guarnición de concreto simple	M <sup>3</sup>	1.55
CCC-106	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m <sup>3</sup> /km	4.74
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	M <sup>3</sup>	37.19
CCC-197	Construcción de rampa vehicular de 1.35 x 3.00 m y 10 cm de espesor, con concreto F'c = 200 kg/cm <sup>2</sup> , t. m. a. 19 mm (3/4") de diámetro, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado	pza.	5.00
CCC-145	Construcción de junta en banquetta de concreto hidráulico a cada 2.50 m a base de junta de plástico premoldeada Juntacreto T marca Curacreto o similar de 3.8 cm de altura	ml.	7.79
ALMA KERPI	Suministro y sembrado de planta kerpis de 1.50 mts de altura: suministro de material, apertura de cepa y agua de riego hasta recepción física de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00

### DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023  
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 23 DE JUNIO DEL 2023  
 FECHA INICIO DIFERIDA:  
 FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO: 12 DE JULIO DEL 2023  
 FECHA DE TERMINACION DIFERIDA:  
 FECHA DE TERMINACION REAL POR CONVENIO  
 DE SUSPENSION TEMPORAL  
 PLAZO DE EJECUCION : 20 DIAS NATURALES  
 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 352,975.08  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 348,209.91  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 319,455.27

### FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: \$ 2,806,055.00



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## ACTA DE RECEPCION FISICA CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

EMPRESA AFIANZADORA:	SOFIMEX		
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	21 DE JUNIO DEL 2023		
No. DE FIANZA DE ANTICIPO:	\$ -		
EMPRESA AFIANZADORA:	\$ -		
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	\$ -		
No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:	1821886	\$	31,945.53
EMPRESA AFIANZADORA:	DORAMA		
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	24 DE JULIO DEL 2023		
<b>PERIODO DE EJECUCION</b>			
FECHA DE INICIO:	23 DE JUNIO DEL 2023		
FECHA DE TERMINACION:	12 DE JULIO DEL 2023		

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
01 (UNO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDAD	\$ 319,455.27	\$ -
	\$ 319,455.27	\$ -

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE

QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA. LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001 JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 24 DE JULIO DEL 2023.

ING. JOSE ALFREDO VIMÉNEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA

ING. JOSUE GARCIA GERONIMO  
REPRESENTANTE LEGAL



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

### CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 28 DE JULIO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING.CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING.JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C. JOSUE GARCIA GERONIMO, EN SU CARACTER DE (REPRESENTANTE LEGAL).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

#### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023
FECHA DE FORMALIZACION:	21 DE JULIO DEL 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE BANQUETA SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO;DE LA CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.
MONTO AUTORIZADO:	\$ 352,975.08
MONTO CONTRATADO:	\$ 348,209.91
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 319,455.27
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	20 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	23 DE JUNIO DEL 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	12 DE JULIO DEL 2023

#### II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
01 (UNO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y NO PREVISTOS	18-jul-23	DEL	23/06/2023	AL	12/07/2023	\$ 319,455.27	\$ 319,455.27
					TOTAL	\$ 319,455.27	

#### III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO.1821886 EXPEDIDA POR ASEGURADORA DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

POR SU PARTE EL C. JOSUE GARCIA GERONIMO, REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 28 DE JULIO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.


### POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

\_\_\_\_\_  
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA

### POR EL CONTRATISTA

\_\_\_\_\_  
C. JOSUE GARCIA GERONIMO  
REPRESENTANTE LEGAL



Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.

RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO; DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.

PROCEDENCIA DE RAMO 33 FONDO III


LOS RECURSOS CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

PERIODO 23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023

LOCALIDAD 0001: Cd. Jalpa de Mendez FECHA 18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

CONSTRUCCIÓN DE LA TRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, LAMINA NEGRA CAL. 22, INCLUYE: VINIL CON LA LEYENDA QUE INDIQUE LA DEPENDENCIA, EXCAVACIÓN HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F' C= 150 KG/CM2 DE 30 X 30 X 100 CM PARA EMPOTRAR MARCO METALICO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

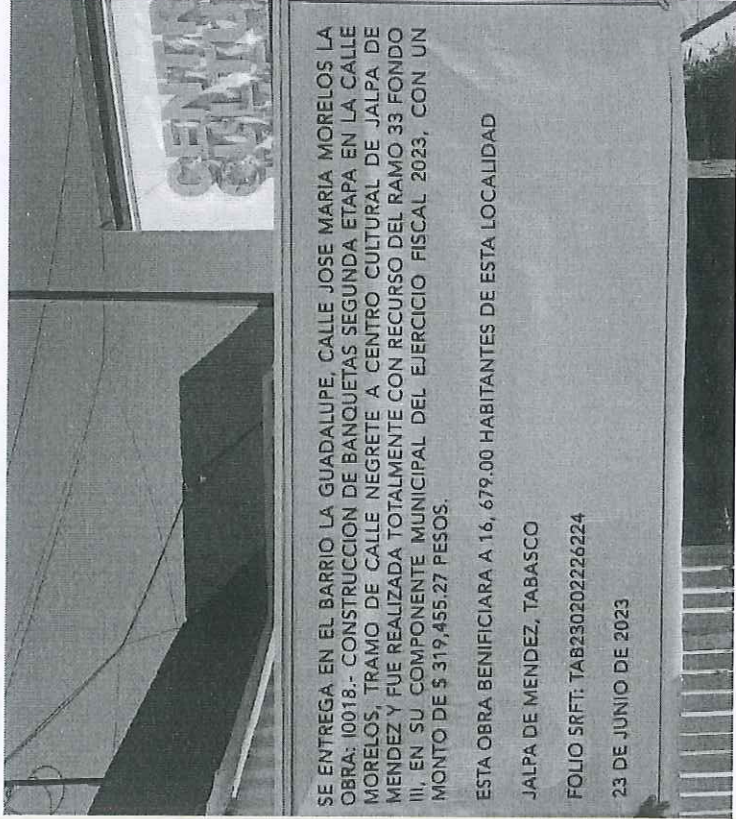

ELABORO

*Angela Zapata Perez*

ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA



Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.

RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO; DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

PERIODO: 23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023




LOCALIDAD: 0001: Cd. Jalpa de Mendez      FECHA: 18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

CLAVE

CCC-052

Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.

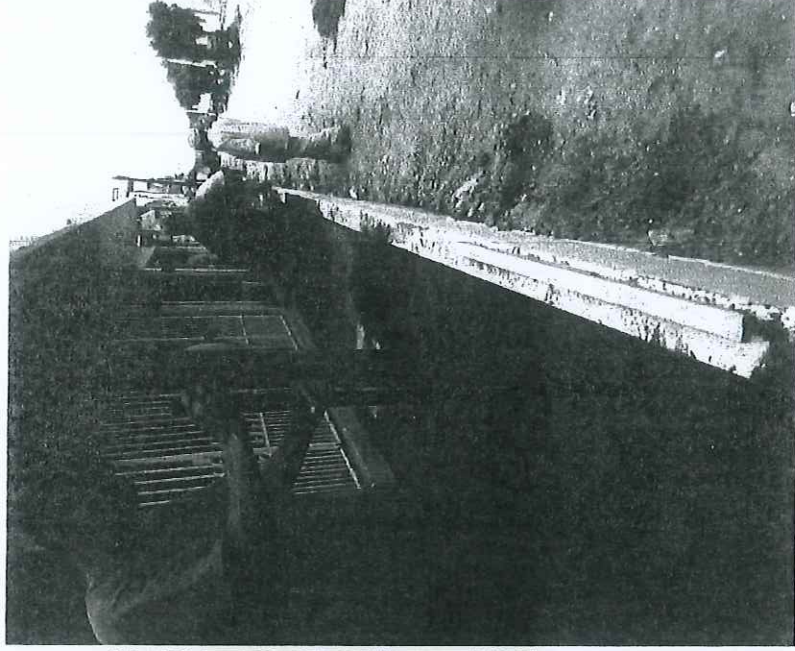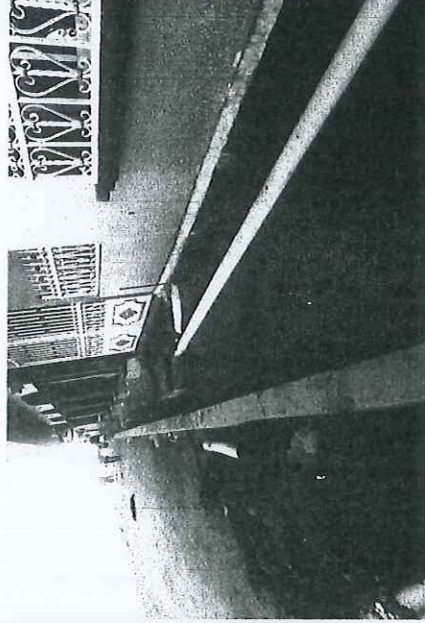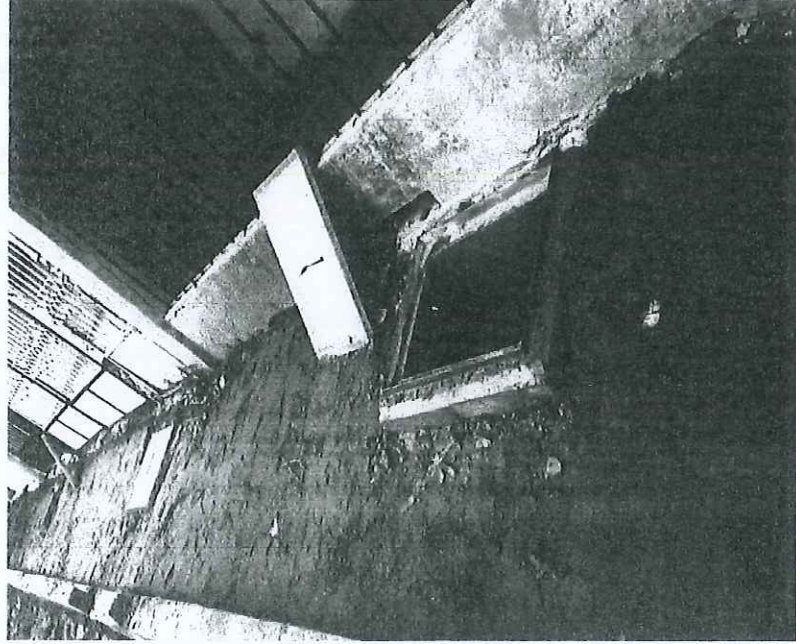

ELABORO

*Angela Zapata Perez*  
ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
CI 18821415411127VE5

*Autorizo*  
AUTORIZO

ING. JOSE ALFREDO VIMENEZ GONZALEZ  
RECIBIENTE DE OBRA





Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.


RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	I0018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO: DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RAMO 33 FONDO III		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023		
PERIODO	23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023		
LOCALIDAD	0001: Cd. Jalpa de Mendez	FECHA	18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

CLAVE CCC-106 Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad

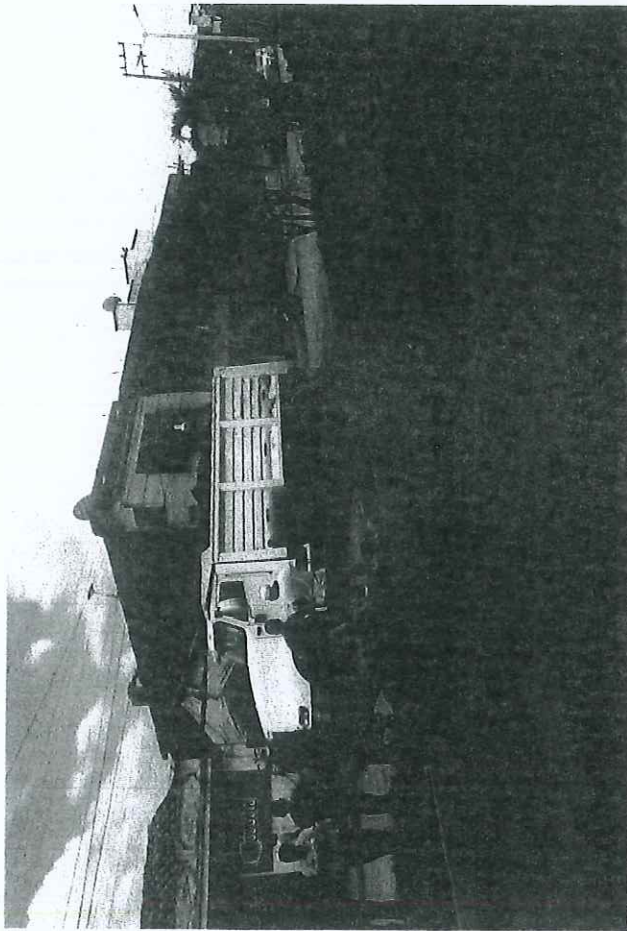

ELABORO

*Angela Zapata Perez*  
ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
CI INDEFINITEFINTEFINTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
PRESIDENTE DE OBRA




Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.  
 RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

<b>OBRA:</b>	10018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO; DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.		
<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	RAMO 33 FONDO III		
<b>CONTRATO</b>	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023		
<b>PERIODO</b>	23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023		
<b>LOCALIDAD</b>	0001: Cd. Jalpa de Mendez	<b>FECHA</b>	18 DE JULIO DEL 2023


## CONCEPTO

CCC-175 Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco

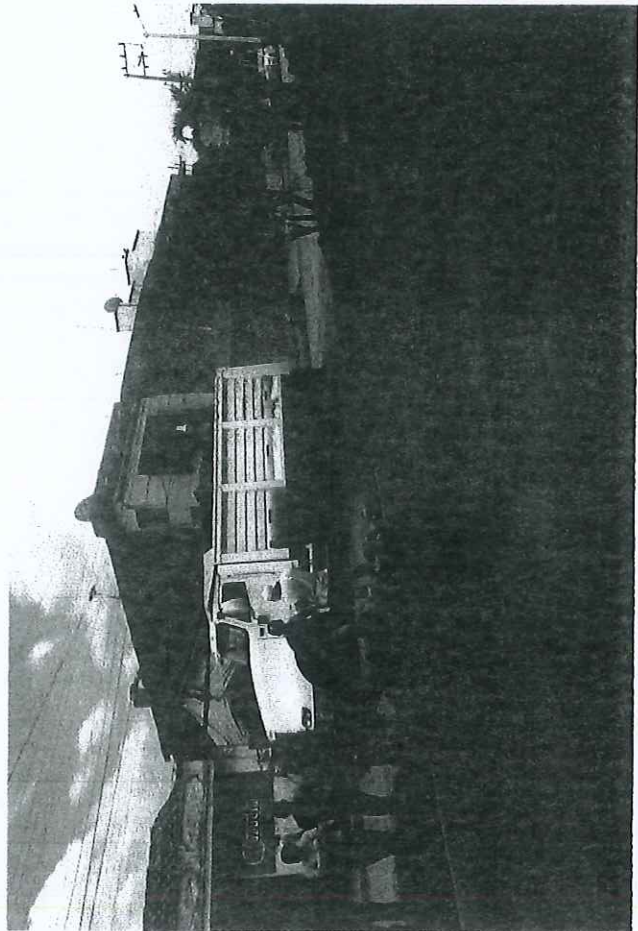

ELABORO  
*Angela Zapata Perez*  
 ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
 CREDITO: INFRAMITTE DE OBRA

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZO  
 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RECIBIENTE DE OBRA



Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.

RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6


# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO; DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RAMO 33 FONDO III		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023		
PERIODO	23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023		
LOCALIDAD	0001: Cd. Jalpa de Mendez	FECHA	18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

Corte de terreno natural tipo "A" por medios manuales de 0.00 a 15.00 cm de esp. Incluye: acopio de material para su posterior retiro de la obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.

CLAVE	
CORTE-M	
TERRA	

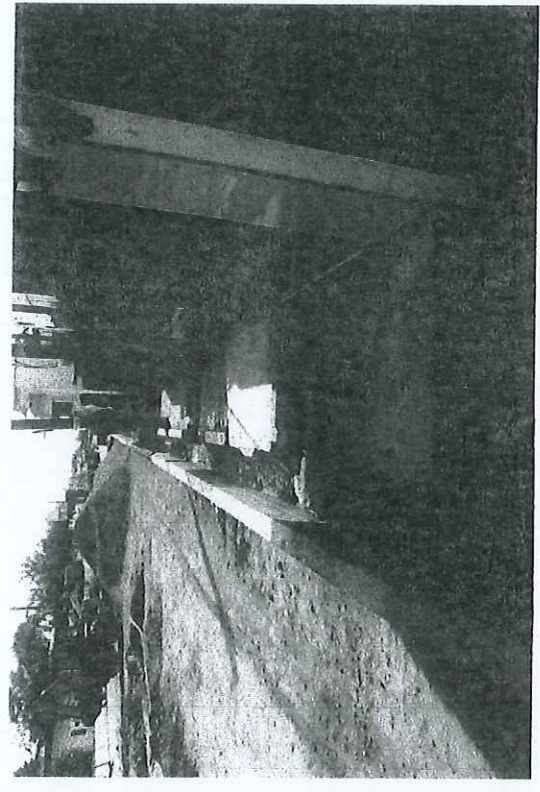

ELABORO

*Angela Zapata Perez*  
 ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
 CI INDEFINITAMENTE DE OBRAS

*[Handwritten Signature]*  
 AUTORIZO

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE DE OBRAS



Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.

RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** 10018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO; DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.

**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS** RAMO 33 FONDO III

**CONTRATO** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023

**PERIODO** 23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023

**LOCALIDAD** 0001:Cd. Jalpa de Méndez **FECHA** 18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

CCC-012 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno

CCC-004 Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco


CCC-002 Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco



ELABORO

*Angela Zapata Perez*  
ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
CIUDADANÍA DEL ESTADO DE TABASCO

*Autentico*  
ING. JOSE ALFREDO NIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DEL ESTADO DE TABASCO



Dimensiones Chaloz, S.A. De C.V.

RFC: DCA181127VE5 Registro Patronal: E75-66669-10-6

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** I0018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO; DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.

**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS** RAMO 33 FONDO III

**CONTRATO** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023


**PERIODO** 23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023

**LOCALIDAD** 0001: Cd. Jaipa de Mendez **FECHA** 18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

CLAVE


CCC-197 Construcción de rampa vehicular de 1.35 x 3.00 m y 10 cm de espesor, con concreto F'c = 200 kg/cm<sup>2</sup>, t. m. a. 19 mm (3/4") de diámetro, armado con malla electrosoldada 6x6-10/10, acabado escobillado

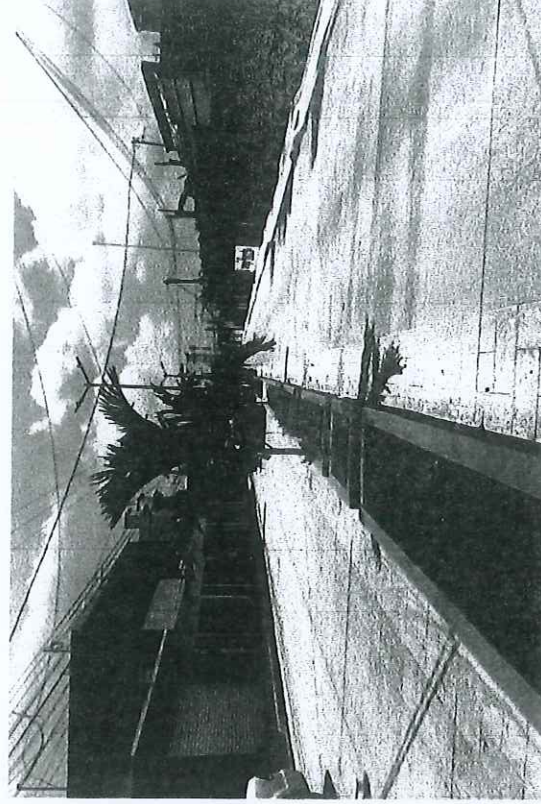

ELABORO

*Angela Zapata Perez*  
ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
CI INDEFINIDA DE CARRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE CARRA



# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0018.- CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA EN LA CALLE MORELOS TRAMO;DE CALLE NEGRETE A CENTRO CULTURAL.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS RAMO 33 FONDO III

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-021-2023




PERIODO 23 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL 2023

LOCALIDAD 0001:Cd.Jalpa de Mendez FECHA 18 DE JULIO DEL 2023

## CONCEPTO

JARDINERIA

PALMA KERPIS Suministro y sembrado de planta kerpis de 1.50 mts de altura: suministro de material, apertura de cepa y agua de riego hasta recepción física de obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

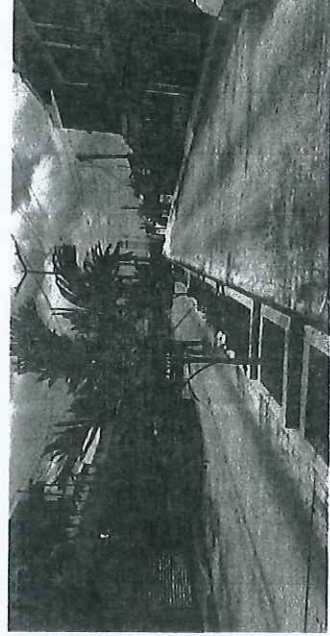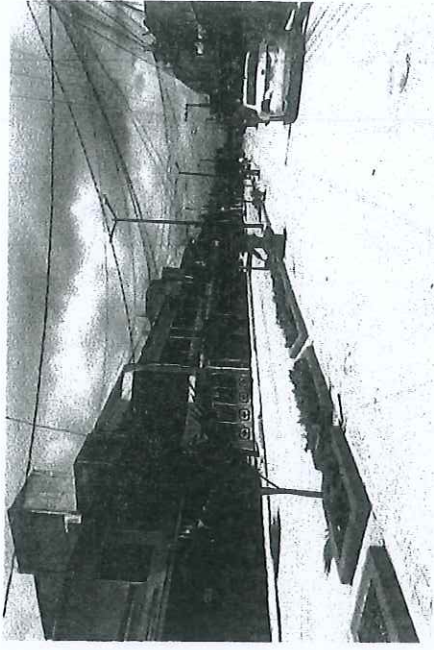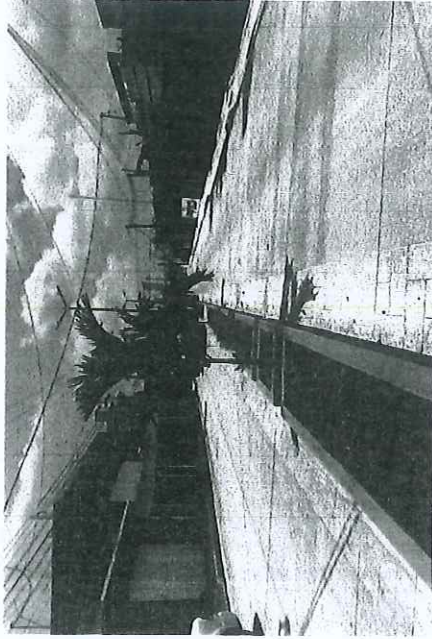

ELABORO

*Angela Zapata Perez*

ING. ANGELA ZAPATA PEREZ  
CI INDEFINIDA DE C.R.R.A

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
CI INDEFINIDA DE C.R.R.A

23 de Junio del 2023

Folio 001

Contrato: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-021-2023

I 0018.- Construcción de banquetas Segunda etapa en la calle Morelos tramo de calle Negrete a Centro Cultural.

Para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 95 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma del estado de Tabasco y con fecha 23 de Junio del 2023, Se procede a abrirse la presente bitácora.

DATOS DE LA OBRAS

I 0018.- construcción de banquetas segunda etapa en la calle Morelos, tramo de calle negrete a centro cultural.

Localidad: 30001.- cd. de Telpa de Mendez

Numero de contrato: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-021-2023

Plazo de ejecución: 20 días Naturales

Fecha de inicio: 23 de Junio del 2023

Fecha de Terminación: 12 de Julio del 2023

Meta: 453.55 M2

Importe autorizado: \$ 352,975.08

Importe contratado: \$ 348,209.91

Origen del recurso: Ramo 33 Fondo III

Contratista: Dimensiones Chaloz s.a. de c.v.

Domicilio: Alvaro Obregón No 212, col. Nueva Villahermosa Centro, Tabasco C.P. 86070.

Registro Federal de Comercio: DCA181127VE5

Registro IMSS: E7566689106

Pátron de contratista: SFP-RUC-04157

Se establece que las notas de bitácora deberán de asentarse de lunes a viernes de 08:00 Hrs a 16:00 Hrs y los sábados de 8:00 Hrs a 13:00 Hrs. y se acuerda un máximo de tres días para firmar la Dirección de obras ordenamiento y servicios municipales designe al Sr. José A. Jimenez Gonzalez con céd. prof. No 2009061, por parte del contratista Inga Angélica Zapata Perez No. 13185992, quien funge como Superintendente de obra. Siendo la persona autorizada para firmar la presente bitácora de obra, se formalizó el registro a las 08:00 Hrs del 23 de Junio 2023

Inga Angélica Zapata Perez  
Superintendente

Ing. José A. Jimenez Gonzalez  
Residente

contrato: CTO-OP-MJAL-DOOTAM-021-2023


ECO18 - Construcción de banquetas segunda etapa en la Calle Morelos, Tramo de Calle negra a Centro Cultural.

Nota #01

Junio-23-23.

Este día se inician los trabajos de demolición con herramienta manual en querriciones de concreto en caso al izquierdo, de igual manera se realiza demolición de banquetas del mismo tramo, de igual manera el material producto de la demolición se apila en lugar indicado por la residencia, para después ser cargado y transportado en camion volter.

ing. Angela Zapata Perez  
ing. Angela Zapata Perez  
Superintendente



ing. Jose A. Jimenez  
Residente de obra



contrato. CTO-OP-UNAL-DOOTSM-021-2023

10018.- Construcción de banquetas, segunda etapa, en la calle Morelos, Tramo de calle negreta a Centro Cultural

Nota #02

Junio 27 del 2023

Este día se continuan con las demoliciones de guarniciones y banquetas en area de Canal Izquierdo y se prosigue apilando el material para su proximo retiro del area de trabajo.

Angela zapata perez  
ING. Angela Zapata Perez  
Superintendente

ING. Jose A Jimenez  
Residente

Contrata . CTO-OP-MUAL-DOOTSM-021-2023


I 0018.- Construcción de banquetas segunda etapa en la calle Mpio.los Tlame de calle negrete a Centro cultural

Nota # 03

Junio-30 del 2023

Este día se concluyen los trabajos referente a demolición de guarniciones y banquetas en lado izquierdo, así también se realiza afre del terrazo en zonas de banquetas en forma manual así también se realiza compactación del terrazo natural, también se inician los trabajos de demolición de guarniciones y banquetas en carril derecho

Angela zapata perez  
ing. Angela Zapata Perez  
Supervisante



ing. Jose A Jimenez Gomez  
Residente

Contrato: CTO-OP MUAL-POSTSM-021-2023


10018.- Construcción de banquetas: Segunda etapa en la calle Morelos tramo de calle Negrete a Centro Cultural

Nota # 04

Julio 03 del 2023.

Se realiza relleno y compactado de material de banco en áreas de banquetas de forma manual en canal izquierdo y se continúa con los trabajos de demolición del lado derecho, concluyéndose estos trabajos. y se inician los trabajos de relleno

Angela Zapata Perez  
ing. Angela Zapata Perez  
Superintendente



ing. Jose A. Jimenez Cruz  
Residente

Contrato: CTO-OP MUAL-DOSTEN-021-2023

10018.- Construcción de banquetas segunda etapa en la calle Morelos Tramo de calle Negrorete a Centro Cultural

Nota #05

Julio 06 del 2023

Este día se continúan los trabajos de rellenos en un área de banquetas lado izquierdo y se prosiguen también con el relleno en áreas de banquetas.

compactándose de forma manual, se realiza el cimbrado de fronteras en banquetas del lado izquierdo; Así también se solicita a la residencia la autorización de cantidades adicionales generadas.

Angela Zapata Perez  
Ing Angela Zapata Perez  
Superintendente

Mg Jose A. Sanchez Gil  
Residencial

Contrato: ETO-OP-MUAL-DOOTSM-021-2023


70018, - Construcción de Banqueta, Segunda etapa, en la Calle Morelos Tramo: de calle Negrete a Centro Cultural.

Nota # 06

Julio 08 del 2023.

Este día se realiza el colado vibrado así como la colocación de la Junta de PVC en áreas de banqueta de carril izquierdo así también se realiza el sembrado de Palmas Kerpis en Camellon Central, este día se avanza la ~~de~~ contratista los conceptos que generan cantidades adicionales.

Angela Zapata Perez  
Ing. Angela Zapata Perez  
Superintendente.



Ing. Jose A. Jimenez Cruz.  
Residente de obra.

Folio 008  
Contrato: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-021-2023


10018.- Construcción de banquetas segunda etapa en la calle Morelos tramo: de calle Negrete a Centro Cultural.

Nota # 07

Julio 10 del 2023

Este día se concluyó el colado de banquetas en carril izquierdo y se inicia el colado de banquetas de carril derecho, también se viene colocando la vante de PVC según determina el concepto de trabajo, se prosigue con el sembrado de palma Kerpis en área de camellón central.

Angela Zapata, perez  
Ing. Angela Zapata Perez  
Superintendente



Ing. Jose A. Jimenez Glez  
Presidente

contrato: CTO-OP-MNAL-DOOTSM-021-2023.

10018 - Construcción de banquetas. Segunda etapa en la Calle Morelos tramo: de Calle Negrete a Centro cultural

Nota # 08

Julio 12 del 2023.

Este día se concluye con el colado de banquetas y la colocación de tarja de PVC en carril derecho. así también este día se realiza limpieza general en ambos carriles, así también este día se dan por terminados los trabajos amparados por este contrato, así también quedo en espera que la residencia determine la fecha para efectuar la recepción física de los trabajos

Ing. Angela Zapata Perez  
 Ing. Angela Zapata Perez  
 Representante

Ing. Jose A. Jimenez Cedez  
 Residente

Contrato : CTO-OP-MJAL - DCOOTSM - 021 - 2023.

10018 -





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Año de  
Francisco  
Villa  
El revolucionario del pueblo

## EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL

PROYECTO: I0018.- Construcción de Banquetas Segunda Etapa en la Calle Morelos Tramo: de Calle Negrete a Centro Cultural.

LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 30 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A
