



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL CAMPO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0069

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0069

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 18 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 84200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$15,779.65

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$15,779.65

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 18.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 24-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 29-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA





**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 245 hombres y 268 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 85200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).
CANTIDAD: 18.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 24-jul-23
TERMINO: 29-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE

I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	18.00	\$ 498.75	\$ 8,977.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	18.00	\$ 127.69	\$ 2,298.42
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	36.00	\$ 25.00	\$ 900.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	25.7990	\$ 14.69	\$ 378.99
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	14.40	\$ 16.40	\$ 236.16
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU25	Suministro de eslabon fusible 25A	pza	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU30	Suministro de eslabon fusible 30A	pza	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU40	Suministro de eslabon fusible 40 A	pza	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$	13,603.15
16% IVA:	\$	2,176.50
TOTAL:	\$	15,779.65

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 24-jul-23

TERMINO : 29-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

CANTIDAD: 18.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						\$13,603.15
ESLFU25A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .25 AMP	PZA	2.00	\$ 69.89	\$	139.78
ESLFU30A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .30 AMP	PZA	2.00	\$ 69.89	\$	139.78
ESLFU40A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .40 AMP	PZA	2.00	\$ 69.89	\$	139.78
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (Luz Fría)	Pza	18.00	\$ 498.75	\$	8,977.50
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	18.00	\$ 127.69	\$	2,298.42
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	14.40	\$ 16.40	\$	236.16
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	36.00	\$ 25.00	\$	900.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	25.7990	\$ 14.69	\$	378.99
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$	249.24
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$	143.50
Total de Materiales						\$13,603.15
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 13,603.15

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

INICIO : 24-Jul-23

CANTIDAD: 18.00

TERMINO: 29-Jul-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	Jul-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	18.00	\$ 8,977.50	\$ 8,977.50	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	18.00	\$ 2,298.42	\$ 2,298.42	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	36.00	\$ 900.00	\$ 900.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	25.80	\$ 378.99	\$ 378.99	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	14.40	\$ 236.16	\$ 236.16	
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ 249.24	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50	\$ 143.50	
ESLFU25	Suministro de eslabon fusible 25A	pza	2.00	\$ 139.78	\$ 139.78	
ESLFU30	Suministro de eslabon fusible 30A	pza	2.00	\$ 139.78	\$ 139.78	
ESLFU40	Suministro de eslabon fusible 40 A	pza	2.00	\$ 139.78	\$ 139.78	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO						

SUBTOTAL: \$ 13,603.15 \$ 13,603.15 \$ -
 16% IVA: \$ 2,176.50 \$ 2,176.50 \$ -
 TOTAL: \$ 15,779.65 \$ 15,779.65 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Año de
Francisco
VELA
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

CANTIDAD: 18.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 24-jul-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 29-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 18.00	MONTO (PESOS) \$15,779.65
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 15,779.65
JULIO	100.00%	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 15,779.65



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

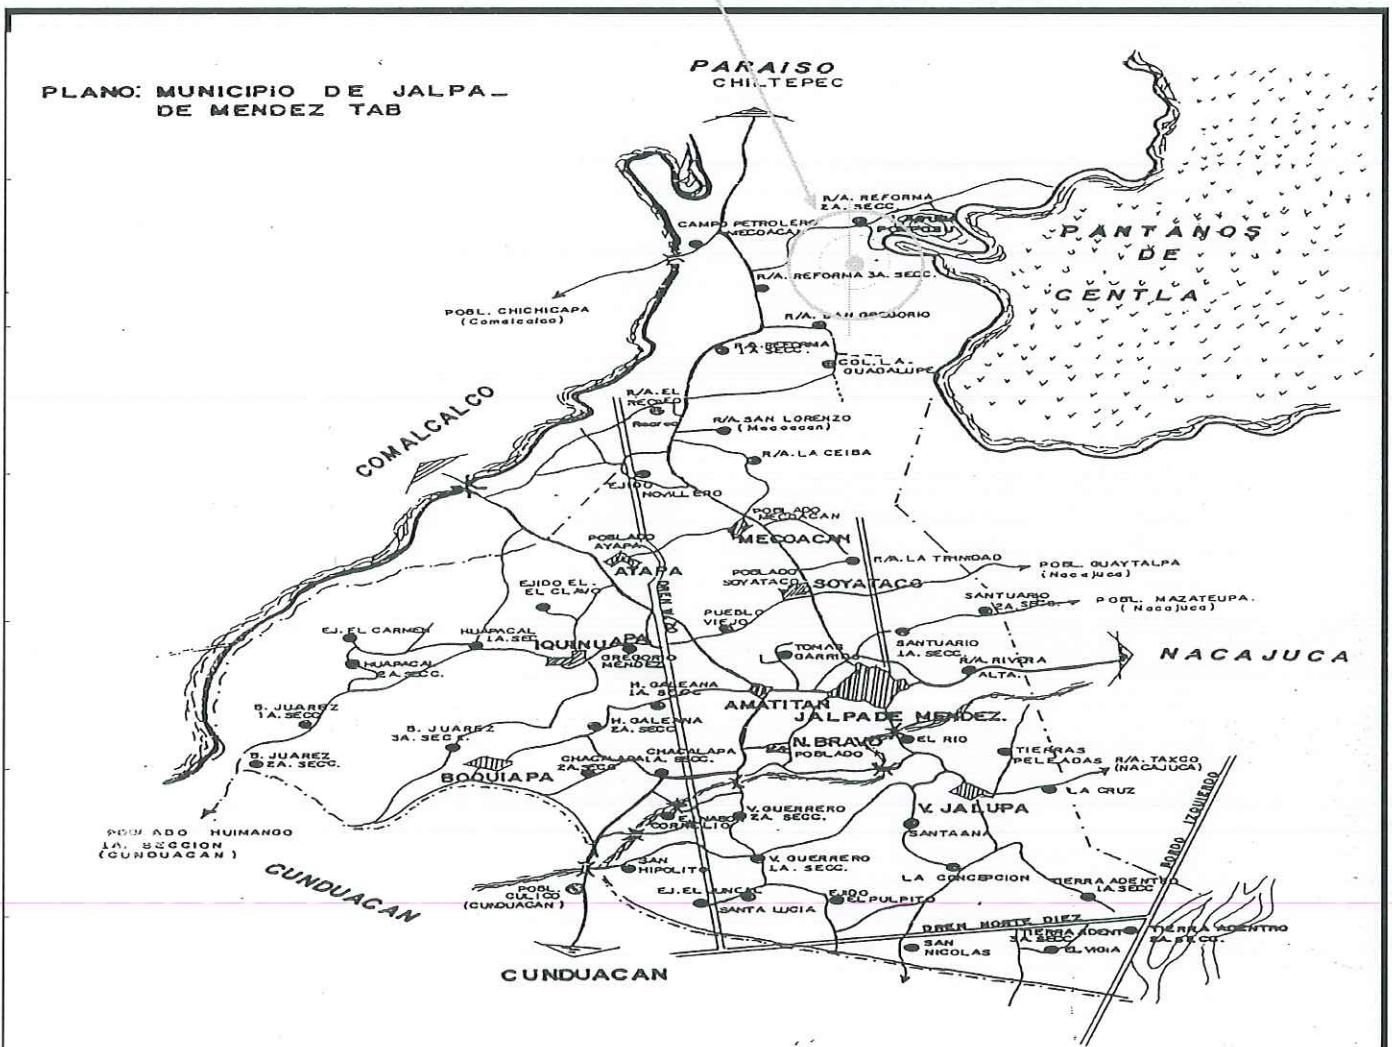

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo 11, 85200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

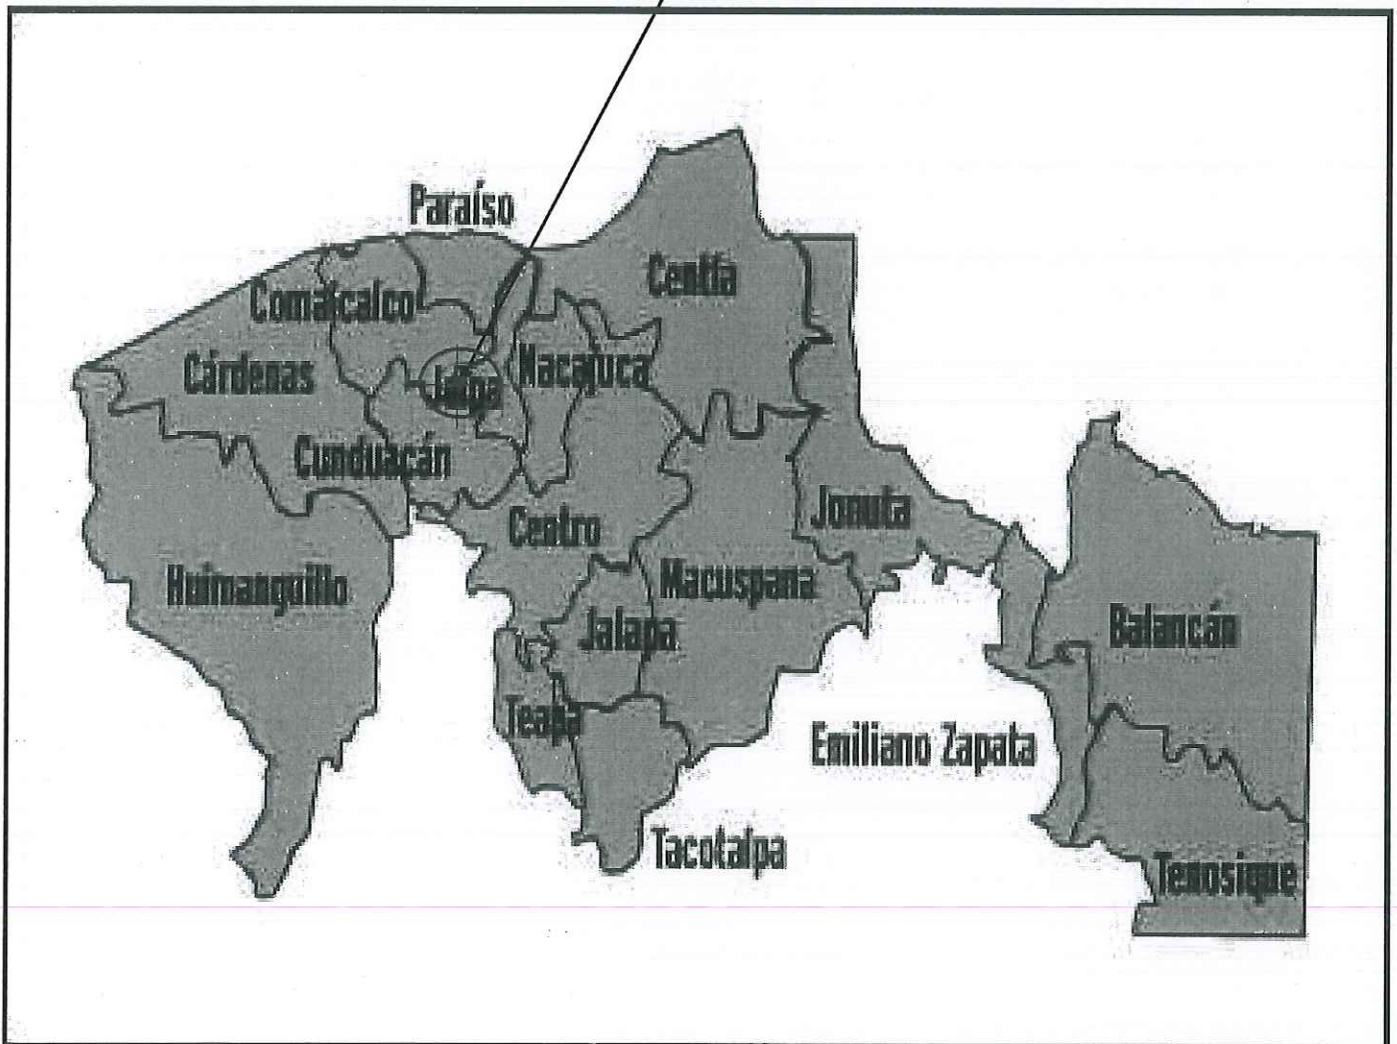

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo 01, 03200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0069.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10069	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección (El Guano).	18 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 15,779.65

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0069
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ**

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0069		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				
Localidad (clave y descripción)	0030		Reforma 3ra. Sección (El Guano), Jalpa de Méndez, Tabasco				
Proyecto Antecedente	Nuevo						
Empleos generados	0	Población Beneficiada	513	Hombres	245	Mujeres	268
						Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00	0.00		0.00		0.00		
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente		
18.00	PIEZAS		18.00		0.00		
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio	24/07/2023			Administración			
Término	29/07/2023						
ESTRUCTURA ECONOMICA							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	100.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trím.	0.00	2do Trím.	0.00	3er Trím.	100.00	4to Trím.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				15,779.65
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	15,779.65	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trím.	0.00	2do Trím.	15,779.65	3er Trím.	0.00	4to Trím.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	15,779.65	0.00	15,779.65



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10069	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,779.65
Total Capitulo		15,779.65
Global		15,779.65

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO SUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0069 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0030.-RA. REFORMA 3RA SECC (EL GUANO) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 15,779.65

META PROGRAMADA: 18.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 24-jul-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29-jul-2023

POBLACION BENEFICIADA: 513 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	18.00	\$ 402.50	\$ 7,245.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	18.00	\$ 108.00	\$ 1,944.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	36.00	\$ 32.02	\$ 1,152.72
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	25.00	\$ 20.30	\$ 507.50
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	14.00	\$ 30.44	\$ 426.16
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
ESLFU25	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:25 AMP	PZ	2.00	\$ 116.15	\$ 232.30
ESLFU30	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:30 AMP	PZ	2.00	\$ 116.15	\$ 232.30
ESLFU40	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:40 AMP	PZ	2.00	\$ 116.15	\$ 232.30
SUBTOTAL					\$ 12,460.94
16% IVA					\$ 1,993.75
TOTAL					\$ 14,454.69

META ALCANZADA: 18.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 1-sep-2023

TERMINO REAL: 2-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 14,454.69 SALDO POR CANCELAR: \$ 1,324.96

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversión (\$)
\$ 15,779.65

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRM: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRM MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. ELIGRAFIO OVANDO SILVAN DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

Secretario

Ernestina Glez Jauregui Ernestina Glez Jauregui

12th Daniela Frias Ramon c.12th Daniela Frias Ramon

1ER. Vocal

2DO. Vocal

FRANCISCA Torres Silvan FRANCISCA Torres Silvan

Dominga Ade da c. Dominga Ade da

3ER. Vocal

Olga Lidia Olan Garcia c. O.O.G.

ENLASE FAIMIN

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y LIBRE DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 01-sep-23

PROYECTO: I0069.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0030.- RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)

FECHA DE TERMINACION 02-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL	
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes			18.00	18.00	
				18.00					
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos			18.00	18.00	
				18.00					
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja			36.00	36.00	
				36.00					
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.60 ml x conector			36.00	14.00	
				0.60					
				Cambio de cable a 3 luminarias			3.00	3.67	11.00
				Total				25.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.50 ML X CONECTOR			36.00	14.00	
				0.39					
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ				2.00	2.00	
SOQM OIA		SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES			5.00	5.00	
				5.00					
ESLFU 25		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 25 AMP	PZ	REENERGIZACION DE ENTONQUES			2.00	2.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 01-sep-23

PROYECTO: I0069.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD: 0030.- RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)

FECHA DE TERMINACION 02-sep-23 PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ESLFU 30	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 30 AMP		ENERGIZACION DE LINEA DE ALTA 2.00		2.00
ESLFU40	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:40 AMP	PZ	ENERGIZACION DE ENTRONQUES DE LINA DE ALTA 2.00		2.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0069

Descripción: Rehabilitación del alumbrado Público

Localidad: R/a. Reforma 3ra. Secc.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 18 Piezas


Meta Alcanzada: 18 Piezas

Inversión programada: \$15,779.65

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 01/09/2023

Fecha de terminación: 02/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jimenez  ced. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se inicia y se concluyen los trabajos referentes al proyecto 10069, Rehabilitación del alumbrado público, Ubicado en las calles de la localidad R/a. Reforma 3ra. Secc.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad estando presente el delegado y el Comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto 10069.

Proseguimos en las calles de esta localidad con la instalación de 18 Piezas de Focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y Conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 5 piezas de soquet mogul para sustituir el soquet mogul deteriorado en las luminarias suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de eslabon fusible universal de 25 Amp: 15KV, 2 piezas de eslabon fusible universal de 30 Amp: 15KV y 2 Piezas de eslabon fusible universal de 40 Amp: 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se utilizo para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Mando de obra

3 Oficiales Eléctricos.
3 Ayudantes Eléctricos.

Herramienta.

3 Pinzas eléctricas
3 Desarmadores de cruz
1 Pertiga
1 Pinea buca.

Residente: Ing. Aníelo Vázquez Jimenez ced. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL BICENTENARIO DEL NUESTRO

FECHA DE INICIO 01-sep-23

PROYECTO: I0069.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:0030.- RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)

FECHA DE TERMINACION 02-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO

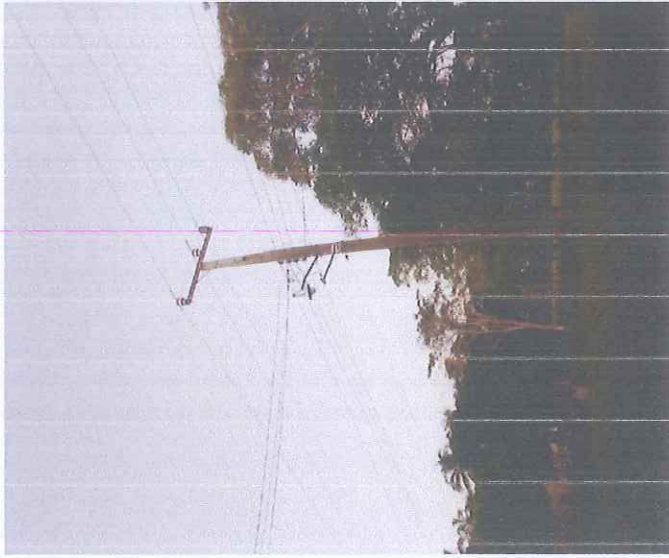

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco VILLA

FECHA DE INICIO 01-sep-23

PROYECTO: 10069.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0030.- RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)

FECHA DE TERMINACION 02-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYEEO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Villa Francisco

FECHA DE INICIO 01-sep-23

PROYECTO: I0069.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0030.- RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)

FECHA DE TERMINACION 02-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-sep-23

PROYECTO: I0069.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0030.- RA. REFORMA 3RA. SECCION (EL GUANO)

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

FECHA DE TERMINACION 02-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
