



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0083

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** Rehabilitación del Alumbrado Público.

**PROYECTO:** I0083

**PARTIDA** 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

**LOCALIDAD:** 0031.- R/a. El Río.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 40 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 36200, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$233,276.60

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$233,276.60

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 40.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 07-ago-23

FECHA DE TERMINACION: 12-ago-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- ( ) CONTRATO
( X ) ADMINISTRACION DIRECTA
( ) ADMINISTRACION COMITÉ
( ) ADMINISTRACION MUNICIPAL
( ) MIXTA





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



### DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0031.- R/a. El Río.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0031.- R/a. El Río.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

### TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 895 hombres y 940 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.

INICIO : 07-ago-23

CANTIDAD: 40.00

TERMINO: 12-ago-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0083.-	Rehabilitación del Alumbrado Público.				
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	30.00	\$ 5,325.00	\$ 159,750.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	60.00	\$ 498.75	\$ 29,925.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : código 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	50.00	\$ 127.69	\$ 6,384.50
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	100.00	\$ 25.00	\$ 2,500.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	81.0510	\$ 14.69	\$ 1,190.64
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	50.00	\$ 16.40	\$ 820.00
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	3.00	\$ 45.88	\$ 137.64
	**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**				
	**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**				

SUBTOTAL:	\$ 201,100.52
16% IVA:	\$ 32,176.08
TOTAL:	\$ 233,276.60

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMT

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 07-ago-23

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.

CANTIDAD: 40.00

TERMINO : 12-ago-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>						<b>\$201,100.52</b>
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..10 AMP	PZA	3.00	\$ 45.88	\$ 137.64	
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	60.00	\$ 498.75	\$ 29,925.00	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	30.00	\$ 5,325.00	\$ 159,750.00	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	50.00	\$ 127.69	\$ 6,384.50	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	50.00	\$ 16.40	\$ 820.00	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	100.0000	\$ 25.00	\$ 2,500.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	81.0510	\$ 14.69	\$ 1,190.64	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24	
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50	
<b>Total de Materiales</b>						<b>\$201,100.52</b>
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						<b>\$0.00</b>
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>\$ -</b>
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>						<b>\$ -</b>
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>						<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>						<b>\$ 201,100.52</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMS

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.

CANTIDAD: 40.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 07-ago-23

TERMINO: 12-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	Jul.-23	ago.-23
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	30.00	\$ 159,750.00	\$ -	\$ 159,750.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	60.00	\$ 29,925.00	\$ -	\$ 29,925.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	50.00	\$ 6,384.50	\$ -	\$ 6,384.50
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	100.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	81.05	\$ 1,190.64	\$ -	\$ 1,190.64
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	50.00	\$ 820.00	\$ -	\$ 820.00
CINAI33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ -	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50	\$ -	\$ 143.50
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	3.00	\$ 137.64	\$ -	\$ 137.64
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**						

SUBTOTAL: \$ 201,100.52 \$ - \$ 201,100.52  
 16% IVA: \$ 32,176.08 \$ - \$ 32,176.08  
 TOTAL: \$ 233,276.60 \$ - \$ 233,276.60  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO PAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILA**  
EL RENOVADOR DEL PAÍS

DATOS DEL PROYECTO:

I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0031.- R/a. El Río.

CANTIDAD: 40.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 07-ago-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 12-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 40.00	MONTO (PESOS) \$233,276.60
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 233,276.60
JULIO		
AGOSTO	100.00%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 233,276.60</b>





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0031.- R/a. El Rfo.

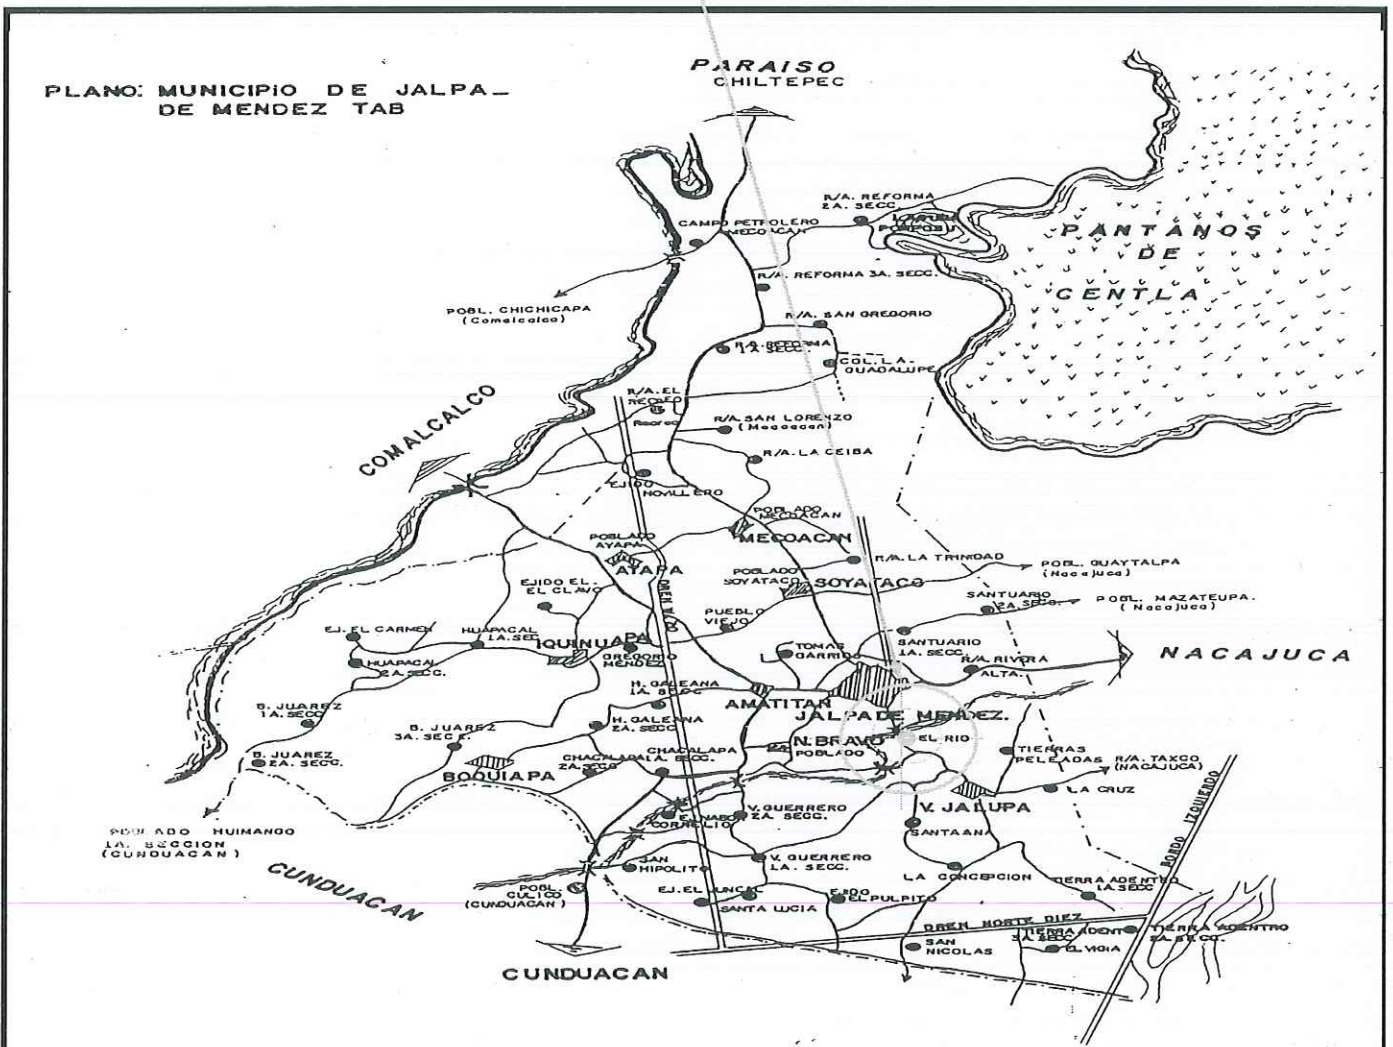

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

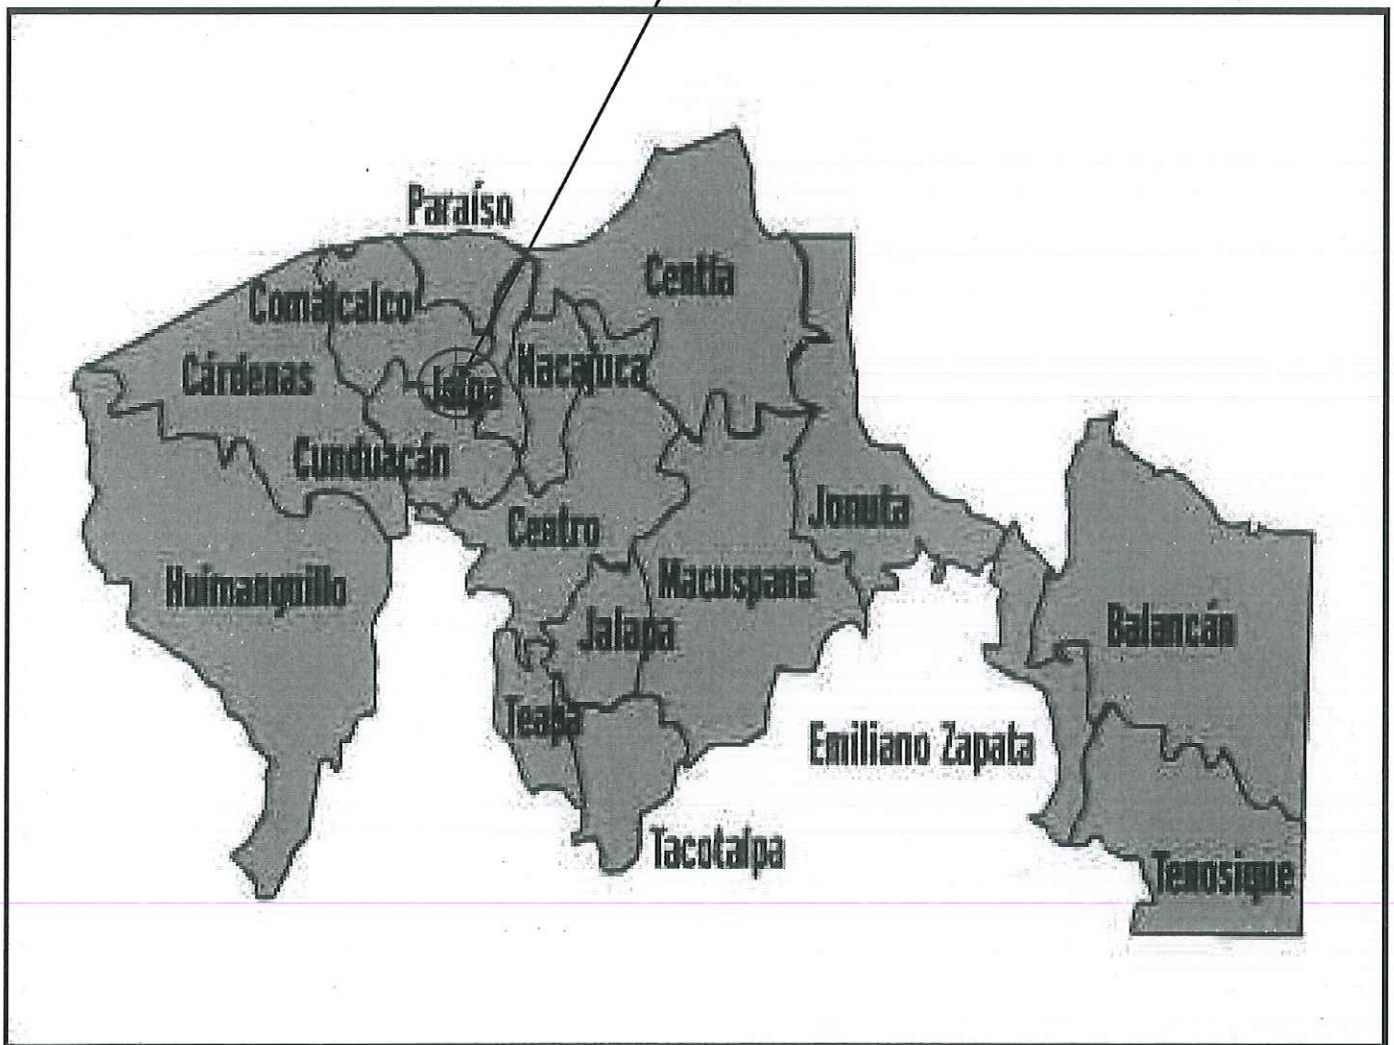

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 85200, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

**I0083.- Rehabilitación del Alumbrado Público.**

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0031.- R/a. El Río.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0031.- R/a. El Río., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10083	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0031.- R/a. El Río.	40 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 233,276.60

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable







CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10083
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0083		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO					
Localidad (clave y descripción)	0031		El Río, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,835	Hombres	895	Mujeres	940	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
40.00	PIEZAS		40.00		0.00			
Periodo de ejecución:	Modalidad de ejecución:							
Inicio 07/08/2023	Administración							
Término 12/08/2023								
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				233,276.60
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	233,276.60	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	233,276.60	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00	

<b>ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS</b>							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	233,276.60	0.00	233,276.60



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0083	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	233,276.60
	Total Capitulo	233,276.60
	Global	233,276.60

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO DORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOREZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

RAMO 33 FONDO III

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

**MODALIDAD: ADMINISTRACION**

Fecha: 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

**ANTECEDENTES**

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

**DEPENDENCIA:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

**PROYECTO:** I0083 **DESCRIPCION:** REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

**LOCALIDAD:** 0031.-RA. EL RIO **MUNICIPIO** JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**RAMA PRESUP:** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**MODALIDAD:** ADMINISTRACION **INVERSIÓN PROGRAMADA :** \$ 233,276.60

**META PROGRAMADA:** 40.00 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 06 DIAS NAT.

**UNIDAD:** PIEZA **INICIO DE OBRA PROGRAMADA:** 7-ago-2023

**TERMINO DE OBRA PROGRAMADA:** 12-ago-2023

**POBLACION BENEFICIADA:** 1,835 HABITANTES

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	30.00	\$ 4,615.34	\$ 138,460.20
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	60.00	\$ 402.50	\$ 24,150.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	50.00	\$ 108.00	\$ 5,400.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	100.00	\$ 32.02	\$ 3,202.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	81.00	\$ 20.30	\$ 1,644.30
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	50.00	\$ 30.44	\$ 1,522.00
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	3.00	\$ 95.96	\$ 287.88
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 175,155.04</b>
<b>16% IVA</b>					<b>\$ 28,024.81</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 203,179.85</b>

**META ALCANZADA:** 90.00 **UNIDAD:** PIEZAS **INICIO REAL:** 18-sep-2023

**TERMINO REAL:** 21-sep-2023

**IMPORTE TOTAL EJERCIDO:** \$ 203,179.85 **SALDO POR CANCELAR:** \$ 30,096.75

**DATOS GENERALES**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha  
18-may-2023

Inversión (\$)  
\$ 233,276.60

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

No. de oficio

Fecha

Metas





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 JALPA DE MÉNDEZ FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOTSMM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOTSMM

SUPERVISIÓN

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. JUAN ANTONIO DOMINGUEZ ESTRADA DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( X )

Presidente

C. YAZMIN MADRIGAL CERINO

Secretario

C. OFELIA CASTILLO RICARDEZ

1ER. Vocal

C. CRISTINA ULIN DIAZ

2DO. Vocal

C. ROSALBA CERINO SOBERANO

3ER. Vocal

C. DANIELA DEL CARMEN OVANDO ULIN

ENLACE FAISMUN

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_
Cargo: \_\_\_\_\_
Razones: \_\_\_\_\_
Nombre y firma: \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0083. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD: 0031. -RA. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 21-sep-23  
PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
ADM-001		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias		
				30.00		30.00
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACION VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes		
				60.00		60.00
FOTCAU		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos		
				50.00		50.00
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en línea de baja		
				100.00		100.00
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.37 ML X LUMNARIA		
				1.37	30.00	41.00
				0.40 ml x conector		
				0.40	100.00	40.00
					<b>Total</b>	<b>81.00</b>
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.36 ML X CONECTOR		
				0.50	100.00	50.00
CINAIS33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00		2.00
ESLFU10		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	REENERGIZACION DE ENTRONQUES DE LINA DE ALTA		
				2.00		2.00
		SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE 5 SOQUES DE CARCAZAS DAÑADAS		
				5.00		5.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0083

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: R/a. El Rio

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 40 Piezas


Meta Alcanzada: 90 Piezas

Inversión Programada: \$233,276.60

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 18/09/2023

Fecha de terminación: 21/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jimenez  Ced. 336391



## Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto 10083. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad R/a. El Rio.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad, estando presente el delegado y el Comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al Proyecto 10083.

Proseguimos con el desmantelado de 30 piezas de luminarias Led fundidas en la calle principal de esta localidad. Concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 30 piezas de luminarias Led Loma 1M 60 Watts 120-277 Volts 5000K // Larga vida sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias Led Loma 1M 60 Watts y para empalmar o cablear los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1+1 Cal. 6 S. utiliza para cablear los conectores bimetálicos.

Los Conectores bimetálicos se utilizarán para evitar Sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las nuevas luminarias Led Loma 1M 60 Watts y los cables de la red de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Supr 33 se realiza el encintado de las uniones de los cables de cobre.

## Mano de Obra

5 Oficiales Electricistas  
5 Ayudantes Eléctricos

## Herramienta

5 Pinzas Eléctricas  
5 Desarmadores Planos y de cruz  
5 Juegos de llaves Allen  
5 llaves Perico No 10.  
5 Marros de 2 libras  
1 Pinza buca y.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ced. 3363900



## Nota: 02

Con esta fecha continuamos con los trabajos referentes al Proyecto E0083. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad R.la. El Rio.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 30 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 5 piezas de socket mogul para sustituir el socket mogul deteriorado en las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se utilizo para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la saltación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.


Con 2 piezas de cinta aislante super 33 se realizo el encintado de las uniones en los cables de cobre.

## Mano de obra

5 oficiales electricistas  
5 Ayudantes electricos

## Herramienta

5 Pinzas electricas  
5 Desarmadores Planos y de cruz.  
5 llaves Perico No 10.  
5 Cuchillas Pala Cable.  
5 Marros de 2 libras.  
1 Pinza burny.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jimenez  Céd. 3363900



## Nota: 03

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al proyecto 10083. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad R/a. El Río.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 30 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buena funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Proseguimos con la instalación de 3 piezas de eslabon fusible universal de 10 Amp: 15 KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo Cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se utilizo para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realizó el encintado de las uniones en los cables de cobre.


## Mano de obra

5 oficiales Electricistas  
5 Ayudantes Electricistas

## Herramienta

5 Pinzas Eléctricas  
5 Desarmadores planos y de Cruz.  
5 llaves Perico No. 10  
5 Marros de 2 libras.  
1 Partiga  
1 Pinza buca y.

Con esta fecha se concluye la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  3363900





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0083.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:0031. -R/A. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 21-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO

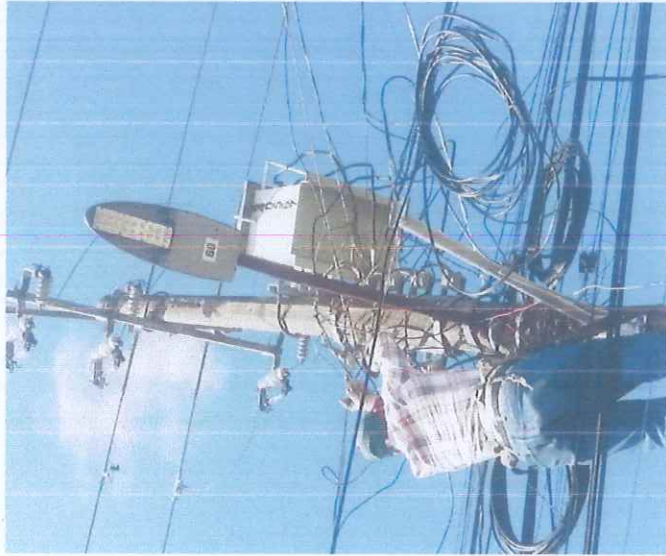

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0083.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:0031. -R/A. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 21-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

**ALBUM FOTOGRAFICO**

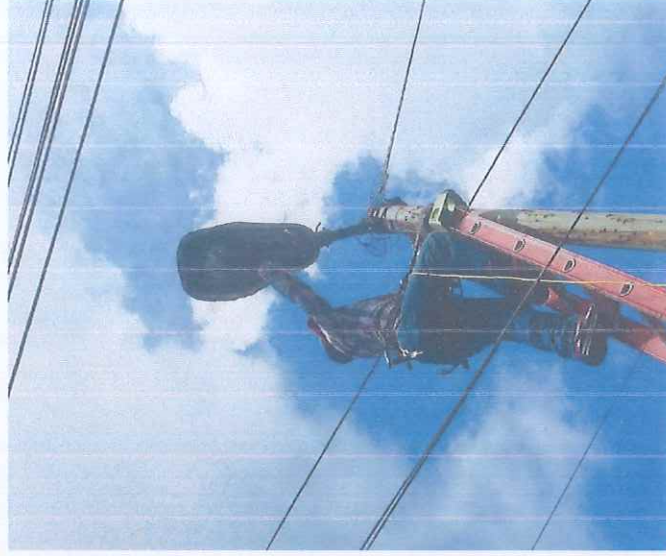

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0083.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0031. -R/A. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 21-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Villa Francisco

FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0083.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:0031. -R/A. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 21-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO

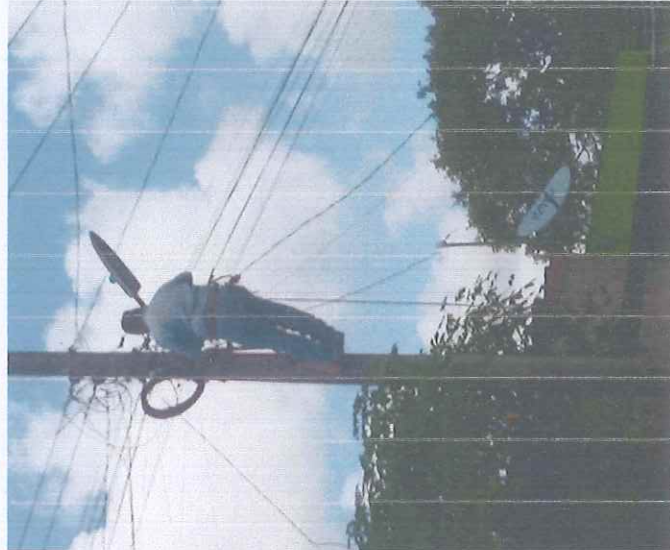

SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 18-sep-23

PROYECTO: I0083.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0031. -R/A. EL RIO

FECHA DE TERMINACION 21-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 4 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
