



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 12 DE ABRIL DE 2022  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10044 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)

LOCALIDAD: 0030.- R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 30,540.79

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 46 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-mar-2022

UNIDAD: REHABILITACION

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 15-abr-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 513 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
1	ADQUISICION DE: SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKIP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO	PIEZA	43.00	350.00	\$ 15,050.00
2	SUMINISTRO DE FOTOCENTRAL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK	PIEZA	17.00	227.59	\$ 3,869.03
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK	ML	100.00	12.98	\$ 1,298.00
4	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR	ML	21.00	25.00	\$ 525.00
5	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY	PIEZA	22.00	28.79	\$ 633.38
6	SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16 TORK	PIEZA	5.00	62.93	\$ 314.65
7	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER	PIEZA	1.00	64.66	\$ 64.66
8	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER	PIEZA	1.00	64.66	\$ 64.66
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER	PIEZA	1.00	64.66	\$ 64.66
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER	PIEZA	1.00	64.66	\$ 64.66
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER	PIEZA	1.00	64.66	\$ 64.66
12	SUMINISTRO SOQUET MOGUL REDUCTOR REDUCTOR 220V A 110V ROYER	PIEZA	15.00	60.34	\$ 905.10
13	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER	PIEZA	7.00	27.69	\$ 193.13
14	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG. SCOTCH	PIEZA	2.00	108.34	\$ 216.68
15	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILO DE ACERO, SOQUET E29, SOLA	PIEZA	4.00	750.00	\$ 3,000.00
SUBTOTAL					\$ 26,328.27
16% IVA					\$ 4,212.52
TÓTAL					\$ 30,540.79

META: 1 REHABILITACION

INICIO REAL: 1-mar-2022

TERMINO REAL: 15-abr-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 30,540.79 SALDO POR CANCELAR: -\$ 0.00

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
15 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha  
18-feb-2022

Inversión (\$)  
\$ 30,540.79

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOTSMT:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOTSMT

SUPERVISIÓN

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

CARGO:

C. NARCISO CONTRERAS RUIZ DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

*[Signature]*

C. ARIEL HERNANDEZ SILVAN

Secretario

*Rosa Angelica Cruz Garcia*

C. ROSA ANGELICA CRUZ GARCIA

1ER. Vocal

*[Signature]*

C. JOSEFINA MAGAÑA GARCIA

2DO. Vocal

*Ana Laura Magaña G.*

C. ANA LAURA MAGAÑA GARCIA

3ER. Vocal

*[Signature]*

C. MARIA RAQUEL SILVAN FRIAS

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

*[Signature]*

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_
Cargo: \_\_\_\_\_
Razones: \_\_\_\_\_
Nombre y firma: \_\_\_\_\_



**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
2022 Flores  
Año de  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10044 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)

LOCALIDAD: 0030.- R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)

### GENERADOR DE OBRA

Clave	Conceptos	Unidad	MATERIAL
1	<b>ADQUISICION DE:</b>		
1	SUMINISTRO DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, IGOTO	PIEZA	43
2	SUMINISTRO DE FOTOCONTROL MODELO ZTL124-510 MODELO ZTL124-510L-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA) TORK	PIEZA	17
3	SUMINISTRO DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12 VOLTECK	ML	100
4	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6 NEUTRANOR	ML	21
5	SUMINISTRO DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA BURNY	PIEZA	22
6	SUMINISTRO DE BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16 TORK	PIEZA	5
7	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 60 KVA HESSER	PIEZA	1
8	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 50 KVA HESSER	PIEZA	1
9	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 30 KVA HESSER	PIEZA	1
10	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 15 KVA HESSER	PIEZA	1
11	SUMINISTRO DE ESLABON FUSIBLE 3 KVA HESSER	PIEZA	1
12	SUMINISTRO SOQUET MOGUL REDUCTOR REDUCTOR	PIEZA	15
13	SUMINISTRO DE SOQUET PARA INTEMPERIE HESSER	PIEZA	7
14	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE 3/4 SUPER 33 18M LONG. SCOTCH	PIEZA	2
15	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILO DE ACERO, SOQUET E29. SOLA	PIEZA	4

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

12/Abril/2022

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10044.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Reforma 3ra Sección.

Localidad: 0030.- R/a. Reforma 3ra. Sección.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 30,540.79

Fecha de inicio: 01/ Marzo /2022

Fecha de terminación: 15/ Abril /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en la R/a. Reforma 3ra. Sección de Jalpa de Méndez, para realizar los trabajos correspondientes al proyecto 10044: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Reforma 3ra. Sección.

En la R/a. Reforma 3ra. Sección se instaló el siguiente material eléctrico.

43 pzas de Focos LED de 50 W.

5 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

17 pza de Foto celdas de 220 V.

100 mts (1 rollo) de Cable forrado THW cal. 12.

21 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6

4 pza. Gabinete Suburbano de aluminio completo.

22 pza Conector bimetálico 6-8

15 pza de Soquet mogul reductor

7 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

2 pza Cinta Aislante super 33

**Mano de obra**

3 oficiales electricistas

2 ayudantes

1 chofer

**Herramienta y equipo**

Herramienta menor

1 Camioneta Chevrolet pikup

SUPERVISOR

  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**




Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO:	10044	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)
LOCALIDAD:	0030.- R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)		

ALBUM FOTOGRAFICO

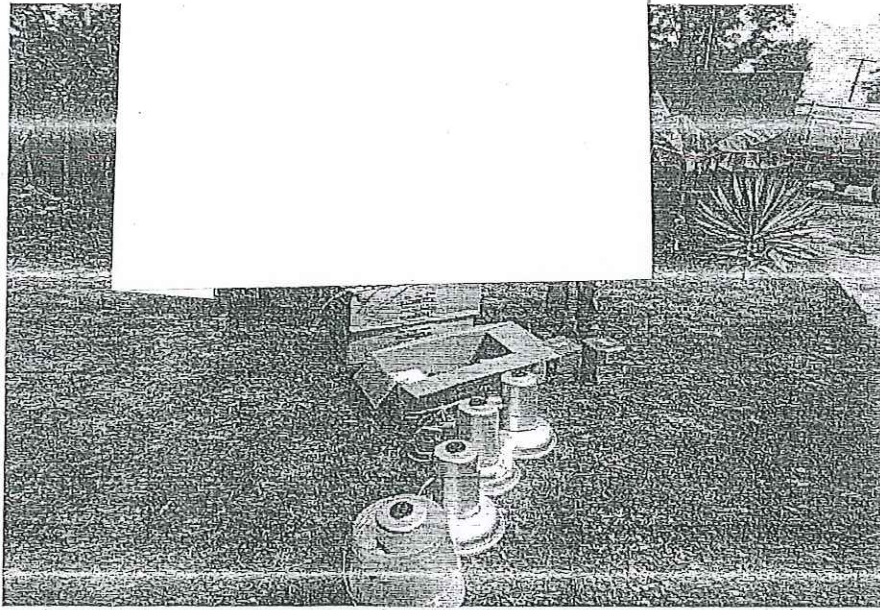

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**




**2022 Flores Magón**  
Año de  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ.

PROYECTO:	10044	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)
LOCALIDAD:	0030.- R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)		

**ALBUM FOTOGRAFICO**

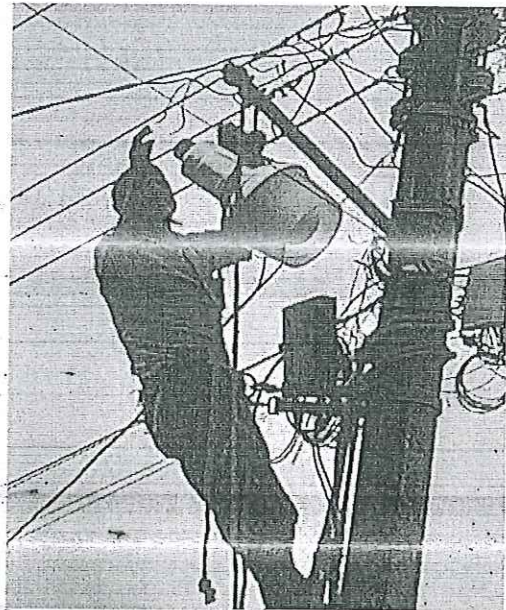

SUPERVISOR  
ING. ANYEL VAZQUEZ JIMENEZ



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**




**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ.

PROYECTO:	10044	DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)
LOCALIDAD:	0030.- R/A. REFORMA 3RA SECCIÓN (EL GUANO)		

**ALBUM FOTOGRAFICO**

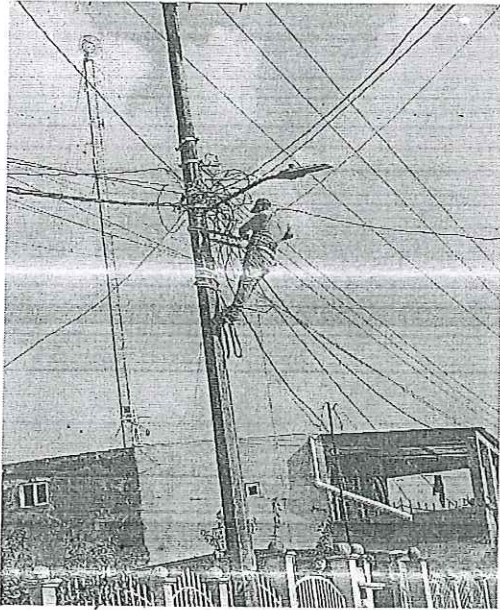

SUPERVISOR  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**




Ricardo

Flores Magón  
Año de  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10044.-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD  
R/A. REFORMA 3RA. SECC. (EL GUANO)

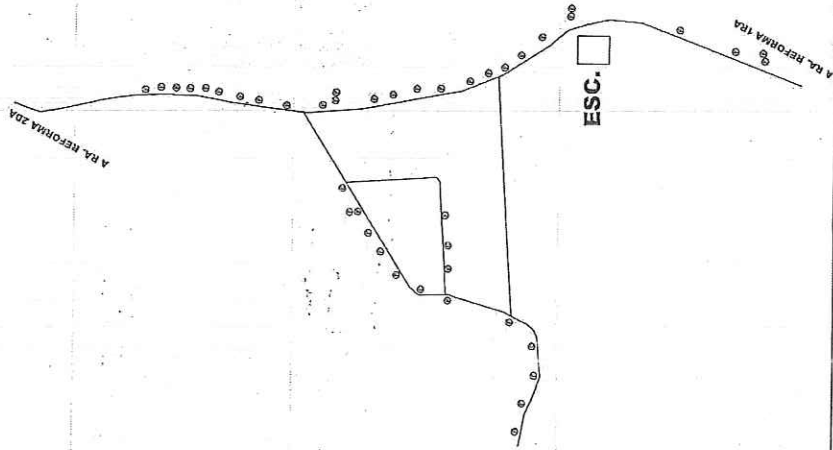

○ INSTALACION DE FOCO  
◐ INSTALACION DE GABINETE

CROQUIS

**RA. REFORMA 3RA. SECC.  
(EL GUANO)**

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
