



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 03 | 2022 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | | 10057 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 15 EXTRAORDINARIA 18/02/2022 | | | | |
| Mes de Registro | Marzo | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 03 | 2022 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|--------|-------------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | 10057 | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | | | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0001 | Jalpa de Mendez, Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 16,679 | Hombres | 8,061 | Mujeres | 8,618 | Proyectos Complementarios | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | | Inversión programada 2022 | | Inversión pendiente | | |
| 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | |
| Meta total | | Unidad de medida | | | Meta programada | | Meta pendiente | | |
| 3,600.00 | | M2 | | | 3,600.00 | | 0.00 | | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | | | |
| Inicio 01/03/2022 | | | | Administración | | | | | |
| Término 30/04/2022 | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | | Fuente de financiamiento | | | | |
| Clave | Descripción | | | | Clave | Descripción | | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | | 33 | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | | | |

| Calendario de metas (avance fisico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | | 3,600.00 |
|--|----------|-----------|----------|-------------------------|------|-----------|------|----------|
| Enero | 0.00 | Abril | 2,160.00 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 1,440.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 1,440.00 | 2do Trim. | 2,160.00 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 720,609.16 |
|------------------------------------|------------|-----------|------------|----------------|------|-----------|------|------------|
| Enero | 0.00 | Abril | 432,365.50 | Julio | 0.00 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 288,243.66 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 288,243.66 | 2do Trim. | 432,365.50 | 3er Trim. | 0.00 | 4to Trim. | 0.00 | |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01/03/2022 | TPN-JM-FIII-PN-005 | TPN-JM-FIII-PN-005 | 01/03/2022 | 0.00 | 720,609.16 | 0.00 | 720,609.16 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 01 | 03 | 2022 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|-------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | 10057 | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL |
|--------------------------------|-------|--|

| PARTIDA | | |
|---------|---|----------------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 12201 | SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL | 81,800.00 |
| | | Total Capitulo |
| | | 81,800.00 |
| 21801 | PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS | 1,065.00 |
| 24901 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION | 615,704.16 |
| | | Total Capitulo |
| | | 616,769.16 |
| 32601 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 22,040.00 |
| | | Total Capitulo |
| | | 22,040.00 |
| | | Global |
| | | 720,609.16 |

| |
|------------------------------------|
| Vo. Bo. |
| ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ |
| DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M. |

| |
|--|
| FORMULO |
|  LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ |
| DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL. |

| |
|--------------------------|
| AUTORIZO |
| LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ |
| PRESIDENTA MUNICIPAL |



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Ricardo
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

I0057 MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

La presente obra tiene la finalidad de dar mantenimiento a las guarniciones de avenidas y calles principales de la ciudad de Jalpa de Méndez, consistente en el suministro de pintura vía color o similar, así como las herramientas necesarias para su aplicación.

0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 01 de Enero de 2022

Folio No.: **DPADS/**

/2021

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0057 MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, a ejecutarse en: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|--|--------------------------------|----------|--|----------------------|
| 10057 | MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL | 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ | 3,600 M2 | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 720,609.16 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 09 DE JULIO DE 2022

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10057 DESCRIPCIÓN: MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K005 - URBANIZACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 720,609.16

META: 3,600.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 61 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-mar-2022
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 30-abr-2022

UNIDAD: M2

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

| Clave | Conceptos | Unidad | Cantidad | P.U | IMPORTE |
|-----------------|--|--------|----------|----------|---------------|
| A | ADQUISICION DE: | | | | |
| 1 | Suministro y aplicación de pintura de tránsito pesado en color, base solvente, de acuerdo a proyecto o similar en guarniciones de concreto, incluye: limpieza, preparacion de la superficie y mano de obra. | M2 | 7,246.63 | \$ 77.51 | \$ 561,673.81 |
| 1.2 | Suministro y aplicación de pintura de tránsito pesado en color, base solvente, de acuerdo a proyecto o similar en area de pasos peatonales y rayas longitudinales, incluye: Renta de equipo (maquina pinta rayas) limpieza, preparacion de la superficie y mano de obra. | M2 | 522.93 | \$ 78.00 | \$ 40,788.54 |
| SUBTOTAL | | | | | \$ 602,462.35 |
| 16% IVA | | | | | \$ 83,154.78 |
| TOTAL | | | | | \$ 685,617.13 |

META ALCANZADA: CANTIDAD: 7,769.57 INICIO REAL: 9-may-2022

UNIDAD: M2 TERMINO REAL: 9-jul-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 685,617.13 SALDO POR CANCELAR: \$ 34,992.03

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
15 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha
18-feb-2022

Inversión (\$)720, 609.16

MODIFICACIONES (DE METAS)

| No. de oficio | Fecha | Metas |
|---------------|-------|-------|
| | | |
| | | |



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



AUTORIDAD

C. CONCEPCION LOPEZ HERNANDEZ DELEGADO MUNICIPAL

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

Presidente C. KARINA DEL CARMEN VAZQUEZ GRCIA

Secretario

C. JOSE MANUEL ALEJANDRO RIVERA

1ER. Vocal

C. JESUS IZQUIERDO ORUETA

2DO. Vocal

C. ANTONIA AGUILAR LOPEZ

3ER. Vocal

C. MARIA ISABEL DE MILLA IZQUIERDO

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:



PROYECTO: I0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ

RESUMEN NUMEROS GENERADORES

| CLAVE | TRAMO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD | ANCHO | ALTO | No. DE ELEMENTOS | CANTIDAD | TOTAL M2 |
|-------|-------|--|---------------|----------|-------|------|------------------|----------|----------|
| A | | MATERIALES DIVERSOS | | | | | | | |
| 1 | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO PESADO EN COLOR, BASE SOLVENTE, DEACUERDO A PROYECTO O SIMILAR EN GUARNICIONES DE CONCRETO. INCLUYE : LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MANO DE OBRA | | | | | | | 7,246.63 |
| 1.2 | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO PESADO EN COLOR, BASE SOLVENTE, DEACUERDO A PROYECTO O SIMILAR EN AREA DE PASOS PEATONALES Y RAYAS LONGITUDINALES, INCLUYE : RENTA DE EQUIPO (MAQUINA PINTA RAYAS) LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MANO DE OBRA. | | | | | | | 522.93 |
| | | | | | | | | TOTAL: | 7,769.57 |



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón
AÑO del PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: 10057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------|--------|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) | |
| CALLE PRIMERA CONSTITUCION | | | | | | | | | |
| PLAZA HIDALGO - CORREGIDORA | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER. | 167,70 | 0,15 | | 25,16 | 111,20 | 111,20 |
| | | | IZQ. | 150,00 | | | 22,50 | | |
| | | | DER. | 167,70 | | | 33,54 | | |
| | | | IZQ. | 150,00 | | | 30,00 | | |
| CORREGIDORA - FRANCISCO JAVIER MINA | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER. | 115,30 | 0,15 | | 16,83 | 69,33 | 69,33 |
| | | | IZQ. | 100,00 | | | 14,60 | | |
| | | | DER. | 115,30 | | | 20,29 | | |
| | | | IZQ. | 100,00 | | | 17,60 | | |
| FRANCISCO JAVIER MINA - FRANCISCO I MADERO | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER. | 210,95 | 0,15 | | 31,64 | 107,24 | 107,24 |
| | | | IZQ. | 204,70 | | | 30,71 | | |
| | | | DER. | 210,95 | | | 22,78 | | |
| | | | IZQ. | 204,70 | | | 22,11 | | |
| FRANCISCO JAVIER MINA - FRANCISCO I MADERO | GUARNICIONES CENTRALES | | | 71,70 | 0,14 | | 10,04 | 94,57 | 201,80 |
| | | | | 252,60 | | | 35,36 | | |
| | | | | 71,70 | | | 10,87 | | |
| | | | | 252,60 | | | 38,29 | | |

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



PROYECTO: 10057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

NUMEROS GENERADORES

| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) | |
|-------------------------------------|--------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------|--------|
| FRANCISCO I. MADERO - NICOLAS BRAVO | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER. | 152,50 | 0,155 | | 23,64 | | |
| | | | IZQ. | 152,50 | | | 23,64 | | |
| | | | DER. | 152,50 | | | 19,44 | | |
| | | | IZQ. | 152,50 | | | 19,44 | | |
| | | | | | | 0,128 | 86,16 | | |
| NICOLAS BRAVO - LIBRAMIENTO | GUARNICIONES CENTRALES | | | 292,80 | 0,14 | | 39,53 | | |
| | | | | 292,80 | | | 42,46 | | |
| | | | | | | | 81,98 | | |
| | | | | | | | 168,15 | | |
| NICOLAS BRAVO - LIBRAMIENTO | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER. | 270,00 | 0,14 | | 37,53 | | |
| | | | IZQ. | 527,30 | | | 73,29 | | |
| | | | DER. | 716,00 | | | 99,52 | | |
| | | | IZQ. | 136,90 | | | 19,03 | | |
| | | | DER. | 270,00 | | | 26,19 | | |
| | | | IZQ. | 527,30 | | | 51,15 | | |
| | | | DER. | 716,00 | | | 89,45 | | |
| | | | IZQ. | 136,90 | | | 13,28 | | |
| | | | | | | | 0,097 | | 389,45 |
| | | | | | | | | | |
| NICOLAS BRAVO - LIBRAMIENTO | GUARNICIONES CENTRALES | | | 506,60 | 0,14 | | 71,43 | | |
| | | | | 892,00 | | | 125,77 | | |
| | | | | 185,00 | | | 26,09 | | |
| | | | | 104,00 | | | 14,66 | | |
| | | | | 506,60 | | | 96,25 | | |
| | | | | 892,00 | | | 169,48 | | |
| | 185,00 | 35,15 | | | | | | | |
| | 104,00 | 19,76 | 558,60 | 948,04 | | | | | |



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: 10057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

NUMEROS GENERADORES

| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) | |
|--------------------|------------------------|----------|---------------|------------------------|-----------|----------|---------------|------------|-----------------|
| LIBRAMIENTO - UJAT | GUARNICIONES CENTRALES | M2 | | 156.2 | | | 20.31 | | |
| | | | | 167.6 | 0.13 | | 21.79 | | |
| | | | | 762.00 | | | 99.06 | | |
| | | | | 490.00 | | | 63.70 | | |
| | | | | 156.2 | | | 48.89 | | |
| | | | | 167.6 | 0.31 | | 52.46 | | |
| | | | | 762.00 | | | 238.51 | | |
| | | | | 490.00 | | | 153.37 | | |
| | | | | | | | 698.08 | | 698.08 |
| | | | UJAT - RUCA | GUARNICIONES CENTRALES | | | 418 | | |
| | 690 | 0.15 | | | | | 103.50 | | |
| | 418 | | | | | | 177.65 | | |
| | 690 | 0.425 | | | | | 293.25 | | |
| | | | | | | | 637.10 | | 637.10 |
| | | | | | | | TOTAL | | 2.833.69 |

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de la Revolución Mexicana
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: I0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------|--------|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) | |
| CALLE GREGORIO MENDEZ | | | | | | | | | |
| PLAZA HIDALGO - JOSE MARIA MORELOS | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER | 128,00 | 0,11 | | 13,57 | 57,86 | 57,86 |
| | | | IZQ. | 128,00 | | | 13,57 | | |
| | | | DER | 128,00 | | | 15,36 | | |
| | | | IZQ. | 128,00 | | | 15,36 | | |
| JOSE MARIA MORELOS - SANTOS DEGOLLADOS | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER | 86,10 | 0,14 | | 12,05 | 53,34 | 53,34 |
| | | | IZQ. | 91,70 | | | 12,84 | | |
| | | | DER | 86,10 | | | 13,78 | | |
| | | | IZQ. | 91,70 | | | 14,67 | | |
| SANTOS DEGOLLADOS - VENUSTIANO CARRANZA | GUARNICIONES EN BANQUETA | | DER | 96,20 | 0,14 | | 13,47 | 186,20 | 186,20 |
| | | | IZQ. | 140,00 | | | 19,60 | | |
| | | | DER | 236,20 | | | 33,07 | | |
| | | | IZQ. | 204,70 | | | 28,66 | | |
| | | | DER | 96,20 | | | 12,99 | | |
| | | | IZQ. | 140,00 | | | 18,90 | | |
| | | | | 236,20 | | | 31,89 | | |
| | | | | 204,70 | | | 27,63 | | |

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón
Año de Ricardo Flores Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: I0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------|--------------------|--------------|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) | | | |
| CALLE 27 DE FEBRERO | | | | | | | | | | | |
| PLAZA HIDALGO - BENITO JUAREZ | GUARNUCIONES EN BANQUETA | | DER | 171,00 | 0,15 | | 25,65 | | | | |
| | | | IZQ | 171,00 | | | 25,65 | | | | |
| | | | DER | 171,00 | 0,16 | | 27,36 | | | | |
| | | | IZQ | 171,00 | | | 27,36 | | | | |
| | | | | | | | | 106,02 | 106,02 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ - 5 DE MAYO | | | | | | | | | | | |
| BENITO JUAREZ - 5 DE MAYO | GUARNUCIONES EN BANQUETA | | DER | 255,50 | 0,14 | | 35,77 | | | | |
| | | | IZQ | 62,20 | | | 8,71 | | | | |
| | | | | 199,30 | 0,120 | | 0,00 | | | | |
| | | | DER | 255,50 | | | 0,00 | | | | |
| | | | IZQ | 62,20 | | | 7,46 | | | | |
| | | | | 199,30 | | | 23,92 | | | | |
| | | | | | | | | 75,86 | 75,86 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 5 DE MATO - BOULEBART | | | | | | | | | | | |
| 5 DE MATO - BOULEBART | GUARNUCIONES EN BANQUETA | | DER | 144,30 | 0,14 | | 20,20 | | | | |
| | | 62,00 | | | | 8,68 | | | | | |
| | | 113,50 | | | | 15,89 | | | | | |
| | | 47,80 | | IZQ. | | | 6,69 | | | | |
| | | 32,60 | | | | | 4,56 | | | | |
| | | 101,50 | | | | 14,21 | | | | | |
| | | 144,30 | DER | | | 17,32 | | | | | |
| | | 62,00 | | | | 7,44 | | | | | |
| | | 113,50 | | | | 13,62 | | | | | |
| | | 47,80 | | IZQ. | | | 5,74 | | | | |
| | | 32,60 | | | | | 3,91 | | | | |
| | | 101,50 | | | | 12,18 | | | | | |
| | | | | | | | 130,44 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | GUARNICION CENTRAL | | | | 219,40 | 0,14 | | 30,72 | |
| | | | | 219,40 | | 0,20 | 43,88 | | | | |
| | | | | | | | 74,60 | 205,04 | | | |
| | | | | | | | | | | | |

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: I0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---------------|--------------|-----------|----------|---------------|------------|-------|-------|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) | | |
| 1.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO PESADO EN COLOR, BASE SOLVENTE, DEACUERDO A PROYECTO O SIMILAR EN GUARNICIONES DE CONCRETO. INCLUYE : LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MANO DE OBRA | | | | | | | | | | |
| PLAZA HIDALGO | | | | | | | | | | |
| PRIMERA CONSTITUCION - 18 DE MARZO | GUARNUCIONES EN BANQUETA | M2 | | 38,00 | 0,14 | | 5,32 | | | |
| | | | | 48,00 | | | 6,72 | | | |
| | | | | 99,50 | | | 13,93 | | | |
| | | | | | | 38,00 | | 0,15 | 5,70 | |
| | | | | | 48,00 | 7,20 | | | | |
| | | | | | 99,50 | 9,95 | | | | |
| | | | | | | | | | 48,82 | 48,82 |
| JUAN ALDAMA - CORN- GREG. MENDEZ | GUARNUCIONES EN BANQUETA | | | 73,10 | 0,18 | | 12,79 | | | |
| | | | | 55,50 | | | 9,71 | | | |
| | | | | 73,10 | | | 10,97 | | | |
| | | | | 55,50 | 8,33 | 0,15 | | | | |
| | | | | | 41,80 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | GUARNUCIONES ESTACIONAMIENTO | 1,00 | FIG. | 13,30 | 0,14 | | 1,86 | | | |
| | | 11,00 | FIG. | 7,10 | | | 10,93 | | | |
| | | 2,00 | FIG. | 9,13 | | | 2,56 | | | |
| | | | | | 1,00 | 0,14 | | 1,86 | | |
| | | | | 8,00 | 7,10 | | | 7,95 | | |
| | | | | 2,00 | 9,13 | | | 2,56 | | |
| | | | | | | | | 27,72 | 69,52 | |
| CORN- GREG. MENDEZ - JOSE MARIA MORELOS | GUARNUCIONES EN BANQUETA | | | 62,30 | 0,11 | | 6,85 | | | |
| | | | | 62,30 | | | 6,85 | | | |
| | | | | 62,30 | | | 6,23 | 0,10 | | |
| | | | | 62,30 | 6,23 | | | | | |
| | | | | | | | | 26,17 | | |
| | GUARNUCIONES ESTACIONAMIENTO | 11,00 | FIG. | 7,10 | 0,14 | | 10,93 | | | |
| | | 1,00 | FIG. | 8,20 | | | 1,15 | | | |
| | | 1,00 | FIG. | 13,30 | | | 1,86 | | | |
| | | | | 1,00 | 8,20 | 0,20 | | 1,64 | | |
| | | | | 11,00 | 7,10 | | | 15,62 | | |
| | | | | 1,00 | 13,30 | | | 2,66 | | |
| | | | | | | 33,86 | 60,03 | | | |

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
 ARG del MAGÓN
 PREFECLOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: 0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL.- EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
 LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | TIPO ELEMENTO | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) |
| PLAZA HIDALGO - JOSE MARIA MORELOS | | | DER | 117,00 | 0,07 | | 8,19 | |
| | | | IZQ | 105,10 | 0,10 | | 10,51 | |
| | | | DER | 117,00 | 0,12 | | 14,04 | |
| | | | IZQ | 105,10 | 0,15 | | 15,77 | |
| | | | | | | 48,51 | 48,51 | |
| | | | | | | | TOTAL | 48,51 |

SUPERVISOR
 ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón
Año de Magón
PRECIOSOS DE LA REVOLUCION MEXICANA

PROYECTO: I0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | |
|--|---------------|----------|-------------|--------------|-----------|---------------|---------------|------------|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | NO DE CRUCE | LONGITUD (M) | ANCHO (M) | NO. DE LINEAS | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) |
| 1.2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRANSITO PESADO EN COLOR, BASE SOLVENTE , DEACUERDO A PROYECTO O SIMILAREN AREA DE PASOS PEATONALES Y RAYAS LONGITUDINALES , INCLUYE : RENTA DE EQUIPO (MAQUINA PINTA RAYAS) LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y MNO DE OBRA. | | | | | | | | |
| CRUCES PEATONALES | | | 1,00 | 3,00 | 0,40 | 18,00 | 21,60 | |
| | | | 2,00 | 3,00 | 0,40 | 16,00 | 19,20 | |
| | | | 3,00 | 3,00 | 0,40 | 9,00 | 10,80 | |
| | | | 4,00 | 3,00 | 0,40 | 18,00 | 21,60 | |
| | | | 5,00 | 3,00 | 0,40 | 14,00 | 16,80 | |
| | | | 6,00 | 3,00 | 0,40 | 17,50 | 21,00 | |
| | | | 7,00 | 3,00 | 0,40 | 18,00 | 21,60 | |
| | | | 8,00 | 2,50 | 0,40 | 18,00 | 18,00 | |
| | | | 9,00 | 2,50 | 0,40 | 18,00 | 18,00 | |
| | | | 10,00 | 2,50 | 0,40 | 10,00 | 10,00 | |
| | | | 11,00 | 2,50 | 0,40 | 13,000 | 13,00 | |
| | | | 12,00 | 2,50 | 0,40 | 16,000 | 16,00 | |
| | | | 13,00 | 3,00 | 0,40 | 20,000 | 24,00 | |
| | | | 14,00 | 2,50 | 0,40 | 14,500 | 14,50 | |
| | | | 15,00 | 2,50 | 0,40 | 19,500 | 19,50 | |
| | | | 16,00 | 3,00 | 0,40 | 13,50 | 16,20 | |
| | | | 17,00 | 2,50 | 0,40 | 17,00 | 17,00 | |
| | | | 18,00 | 3,00 | 0,40 | 12,00 | 14,40 | |
| | | | 19,00 | 3,00 | 0,40 | 16,00 | 19,20 | |
| | | | | | | | 332,40 | 332,40 |
| RAYAS DE ALTO EN CRUCES PEATONALES | | | 1,00 | 11,60 | 0,40 | | 4,64 | |
| | | | 2,00 | 11,20 | 0,40 | | 4,48 | |
| | | | 3,00 | 7,75 | 0,40 | | 3,10 | |
| | | | 4,00 | 12,90 | 0,40 | | 5,16 | |
| | | | 5,00 | 10,45 | 0,40 | | 4,18 | |
| | | | 6,00 | 13,50 | 0,40 | | 5,40 | |
| | | | 7,00 | 15,00 | 0,40 | | 6,00 | |
| | | | 8,00 | 14,20 | 0,40 | | 5,68 | |
| | | | 9,00 | 14,20 | 0,40 | | 5,68 | |
| | | | 10,00 | 8,20 | 0,40 | | 3,28 | |
| | | | 11,00 | 10,50 | 0,40 | | 4,20 | |
| | | | 12,00 | 12,70 | 0,40 | | 5,08 | |
| | | | 13,00 | 13,80 | 0,40 | | 5,52 | |
| | | | 14,00 | 7,00 | 0,40 | | 2,80 | |
| | | | 15,00 | 13,70 | 0,40 | | 5,48 | |
| | | | 16,00 | 11,80 | 0,40 | | 4,72 | |
| | | | 17,00 | 11,00 | 0,40 | | 4,40 | |
| | | 18,00 | 10,00 | 0,40 | | 4,00 | | |
| | | 19,00 | 12,30 | 0,40 | | 4,92 | | |
| | | | | | | 88,72 | 88,72 | |



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Magón
DIECIBROS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

PROYECTO: I0057.- MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.
LOCALIDAD: 0001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

| NUMEROS GENERADORES | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|---------------|------------|
| TRAMO | TIPO ELEMENTO | CONCEPTO | NO. LINEAS | LONGITUD (M) | NO. DE RAYAS | ALTO (M) | CANTIDAD (M2) | TOTAL (M2) |
| RAYAS LONGITUDIALES | CRUCE 1 - 2 | | 3,00 | 2,20 | 11,000 | 0,11 | 7,99 | |
| | | | 3,00 | 9,70 | 1,000 | 0,11 | 3,20 | |
| | CRUCE 4 - 5 | | 3,00 | 2,20 | 11,00 | 0,11 | 7,99 | |
| | | | | | | | | |
| | CRUCE 5 - 6 | | 2,00 | 1,30 | 6,00 | 0,11 | 1,72 | |
| | | | 2,00 | 1,30 | 6,00 | 0,11 | 1,72 | |
| | CRUCE 7 - 8 | | 3,00 | 1,20 | 20,00 | 0,11 | 7,92 | |
| | | | | | | | | |
| | CRUCE 8 - 9 | | 3 | 1,20 | 7,00 | 0,12 | 3,02 | |
| | | | | | | | | |
| | CRUCE 9 - 11 | | 3 | 2,10 | 5,00 | 0,12 | 3,78 | |
| | | | 2 | 3,00 | 11,00 | 0,12 | 7,92 | |
| | | | 3 | 3,00 | 10,00 | 0,12 | 10,80 | |
| | CRUCE 11 - 12 | | 2 | 2,10 | 25,00 | 0,12 | 12,60 | |
| | | | | | | | | |
| | CRUCE 12 - 14 | | 1 | 2,10 | 4,00 | 0,11 | 0,92 | |
| | | | | | | | | |
| | CRUCE 14 - 15 | | 2,00 | 2,10 | 21,00 | 0,11 | 9,70 | |
| | | | | | | | | |
| | CRUCE 15 - RAMPA PEATONAL | | 1,00 | 2,10 | 5,00 | 0,11 | 1,16 | |
| | | | | | | | | |
| CRUCE 16 - 17 | | 3,00 | 1,10 | 24,00 | 0,11 | 8,71 | | |
| | | | | | | | | |
| CRUCE 19 - 1 | | 3,00 | 1,20 | 32,00 | 0,11 | 12,67 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 101,81 | 101,81 | |
| | | | | | | TOTAL | 522,93 | |

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

BITACORA DE OBRA

09 DE MAYO DE 2022

CON ESTA FECHA SE APERTURA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0057 MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORES DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: K005.- URBANIZACIÓN

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001. – CIUDAD JALPA DE MENDEZ

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO GENERAL 33 FONDO III

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$720, 609.16

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Supervisor: 
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 1

09 de mayo de 2022

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de pintura en guarnición en la calle plaza hidalgo. Se realiza limpieza en el área a pintar.

Nota no. 2

10 de mayo de 2022

Se inicia con el pintado en guarnición en la calle plaza hidalgo.

Nota no. 3

11 de mayo de 2022

Se continua con el pintado en guarnición en la calle plaza hidalgo y limpieza de la superficie.

Nota no. 4

12 de mayo de 2022

Con esta fecha se termina con el pintado en guarnición en la calle plaza hidalgo.

Nota no. 4

13 de mayo de 2022

Con esta fecha se inicia con la limpieza de la superficie y el pintado de las guarniciones de la calle primera constitución.

Supervisor:
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 5

14 de mayo de 2022

Se continua con el pintado de las guarniciones de la calle primera constitución.

Nota no. 6

17 de mayo de 2022

Se continua con el pintado y limpieza de la superficie de las guarniciones de la calle primera constitución.

Nota no. 7

18 de mayo de 2022

Se continua con el pintado de las guarniciones de la calle primera constitución.

Nota no. 8

19 de mayo de 2022

Se continua con el pintado de las guarniciones de la calle primera constitución.

Nota no. 9

20 de mayo de 2022

Se continua con el pintado y limpieza de las guarniciones de la calle primera constitución.

Supervisor: 
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 10

21 de mayo de 2022

Con esta fecha se termina con el pintado de las guarniciones de la calle primera constitución.

Nota no. 11

23 de mayo de 2022

Con esta fecha se inicia con la limpieza de la superficie y el pintado de guarniciones en la calle Gregorio Méndez.

Nota no. 12

24 de mayo de 2022

Se continua con la limpieza de la superficie y el pintado de guarniciones en la calle Gregorio Méndez.

Nota no. 13

25 de mayo de 2022

Se continua con la limpieza de la superficie y el pintado de guarniciones en la calle Gregorio Méndez.

Nota no. 14

26 de mayo de 2022

Con esta fecha se termina con el pintado de guarniciones en la calle Gregorio Méndez.

Supervisor: 
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 15

27 de mayo de 2022

Con esta fecha se inicia con la limpieza y pintado de las guarniciones en la calle 27 de febrero.

Nota no. 16

28 de mayo de 2022

Se continua con la limpieza y pintado de las guarniciones en la calle 27 de febrero.

se suspenden los trabajos por causa de las malas condiciones del clima.
(temporada de lluvias).

Supervisor:
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 17

06 de junio de 2022

Con esta fecha se reinician los trabajos referentes al presente proyecto.

Se continua con la limpieza y pintado de las guarniciones en la calle 27 de febrero.

Nota no. 18

07 de junio de 2022

Se continua con la limpieza y pintado de las guarniciones de la calle 27 de febrero.

Nota no. 19

08 de junio de 2022

Con esta fecha se termina con el pintado de las guarniciones en la calle 27 de febrero.

Nota no. 20

09 de junio de 2022

Se inicia con la limpieza de la superficie y pintado de guarniciones en la calle corregidora.

Nota no. 21

10 de junio de 2022

Se continua con el pintado de guarniciones en la calle corregidora.

Nota no. 22

11 de junio de 2022

Se continua con el pintado de guarniciones en la calle corregidora.

Supervisor
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 23

13 de junio de 2022

Se continua con el pintado de guarniciones en la calle corregidora.

Nota no. 24

14 de junio de 2022

Con esta fecha se termina con el pintado de guarniciones en la calle corregidora

Nota no. 25

15 de junio de 2022

Con esta fecha se inicia con el pintado de guarniciones en la calle dueñas.

Nota no. 26

16 de junio de 2022

Con esta fecha se termina con el pintado de las guarniciones de la calle dueñas

Nota no. 27

17 de junio de 2022

Con esta fecha se inicia y se termina con el pintado de guarniciones en la calle Ignacio allende.

Nota no. 28

18 de junio de 2022

Con esta fecha se inicia y se termina con el pintado de guarniciones en la calle negrete.

Supervisor: 
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez

Nota no. 29

04 de julio de 2022

Con esta fecha se reinician los trabajos referentes al proyecto mantenimiento de guarniciones.

Se inicia y se termina con el pintado de las rayas canalizadores de carril. En la plaza hidalgo.

Nota no. 30

05 de julio de 2022

Con esta fecha se reinician los trabajos del pintado de cruces peatonales

Nota no. 31

06 de julio de 2022

Se continua con el pintado de cruces peatonales

Nota no. 32

07 de julio de 2022

Se termina con el pintado de cruces peatonales

Nota no. 33

09 de julio de 2022

Con esta fecha se inicia y se termina con el pintado de rayas de alto en los cruces peatonales.

Se da por terminado los trabajos referentes al proyecto I0057.- Mantenimiento de guarniciones de concreto, rayas peatonales y canalizadores de carril, en diferentes calles.

Cabe mencionar que el rendimiento de la pintura fue mayor al de la meta ya que no se requirió aplicar 2 manos de pintura ya que la superficie no lo requirió.

Supervisor 
Ing. Anyelo Vázquez Jiménez



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo Flores Magón
AÑO del PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

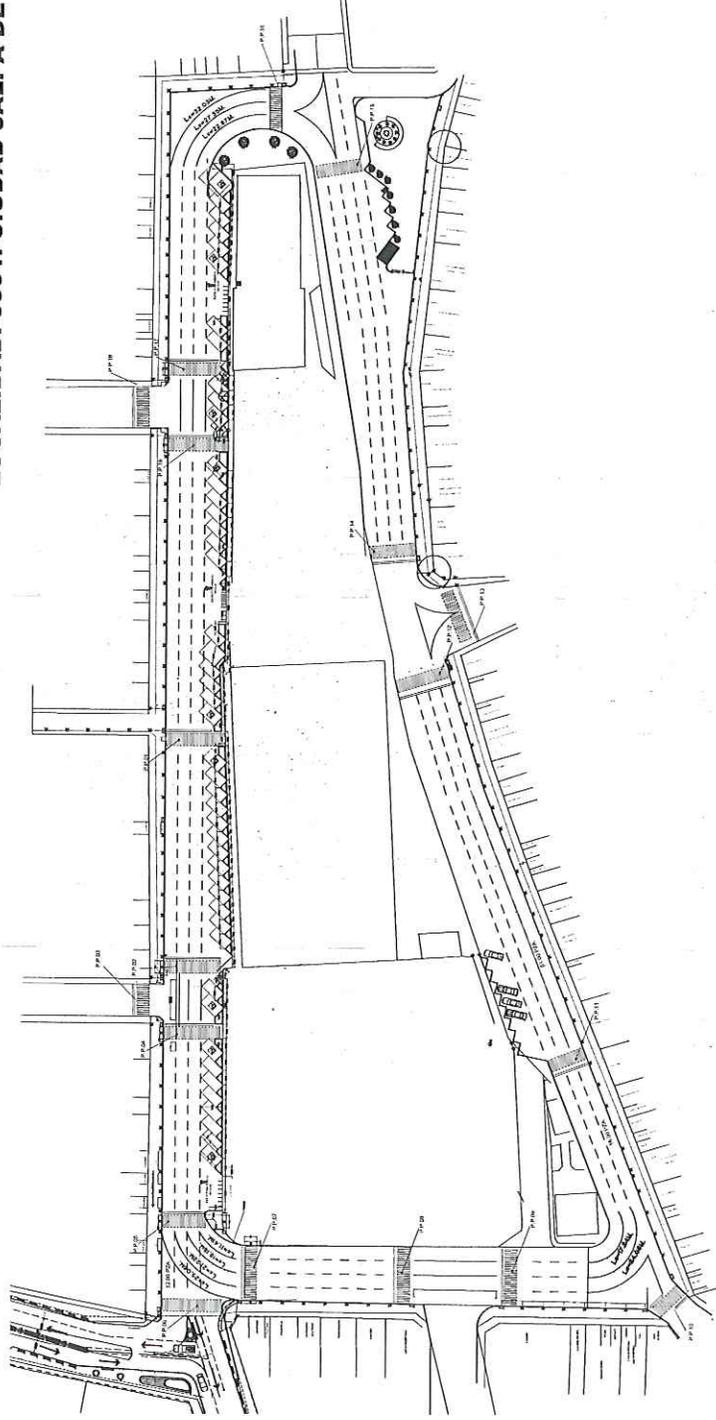

PLAZA HIDALGO

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo Fiores
AÑO DE MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

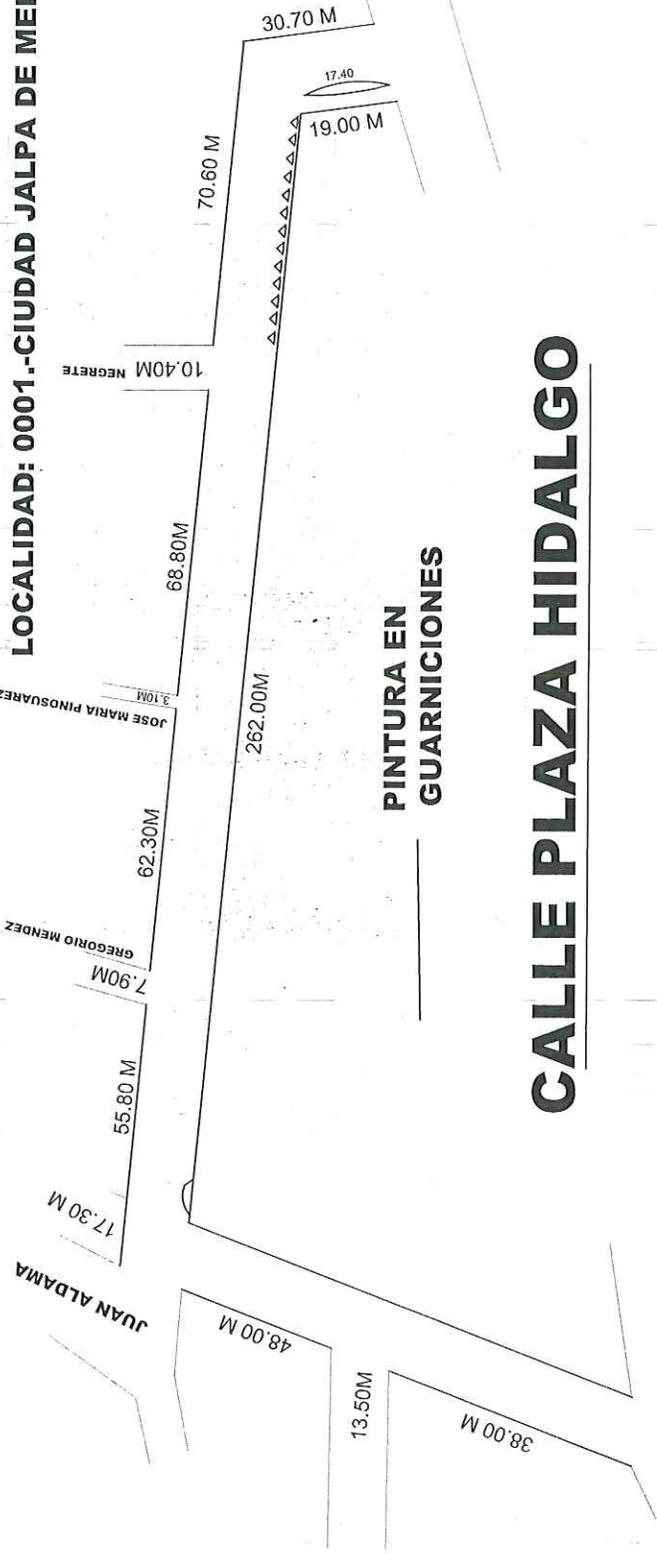

CALLE PLAZA HIDALGO

CROQUIS 02

~~SUPERVISOR~~

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Mayor
PRECURSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

PINTURA EN GUARNICIONES



CROQUIS 03

CALLE GREGORIO MENDEZ

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo Flores
Año de Maestros
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.


LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CROQUIS 04

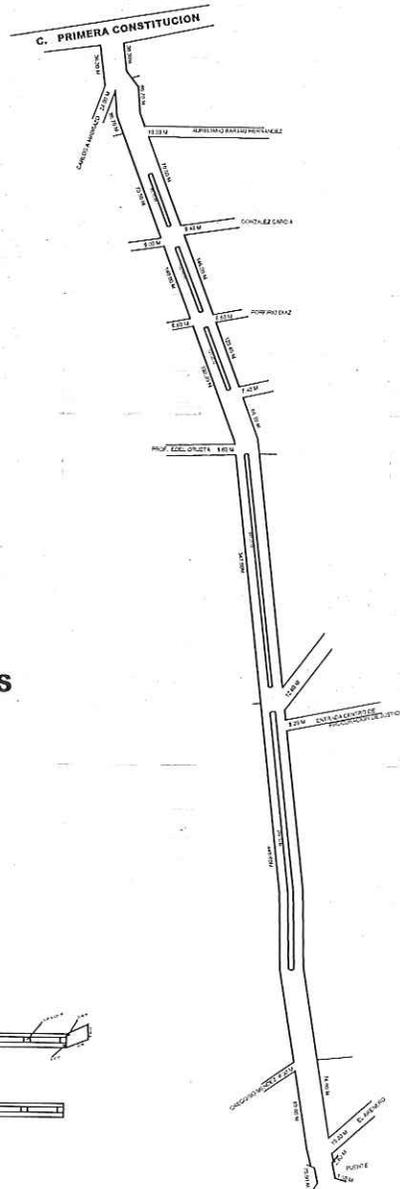

PINTURA EN GUARNICIONES

PUENTE



CALLE CORREGIDORA

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo Flores Magón
Año de PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

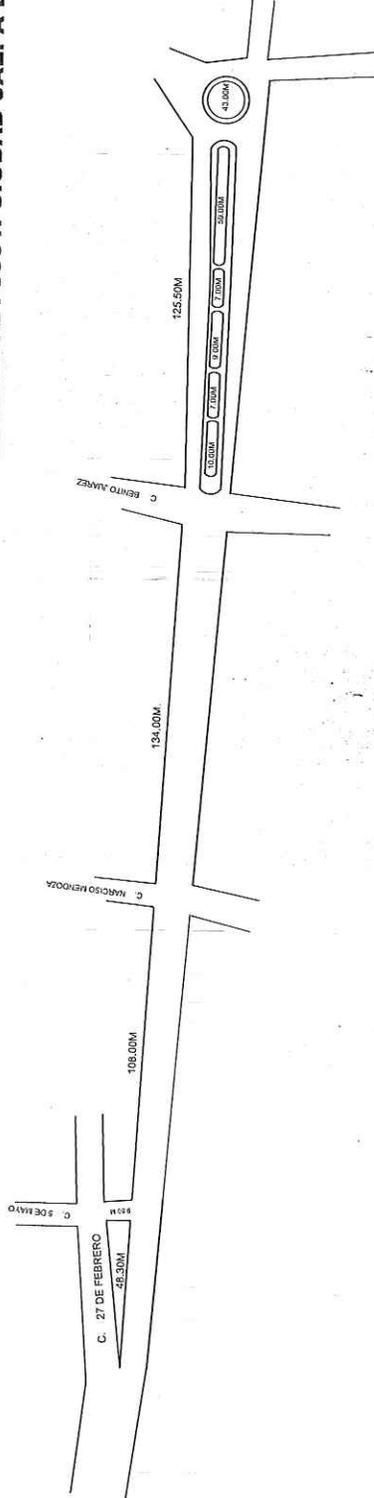

PINTURA EN GUARNICIONES

CROQUIS 06

CALLE DUEÑAS

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ-JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y
CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CROQUIS 07

IGNACIO AYENDE

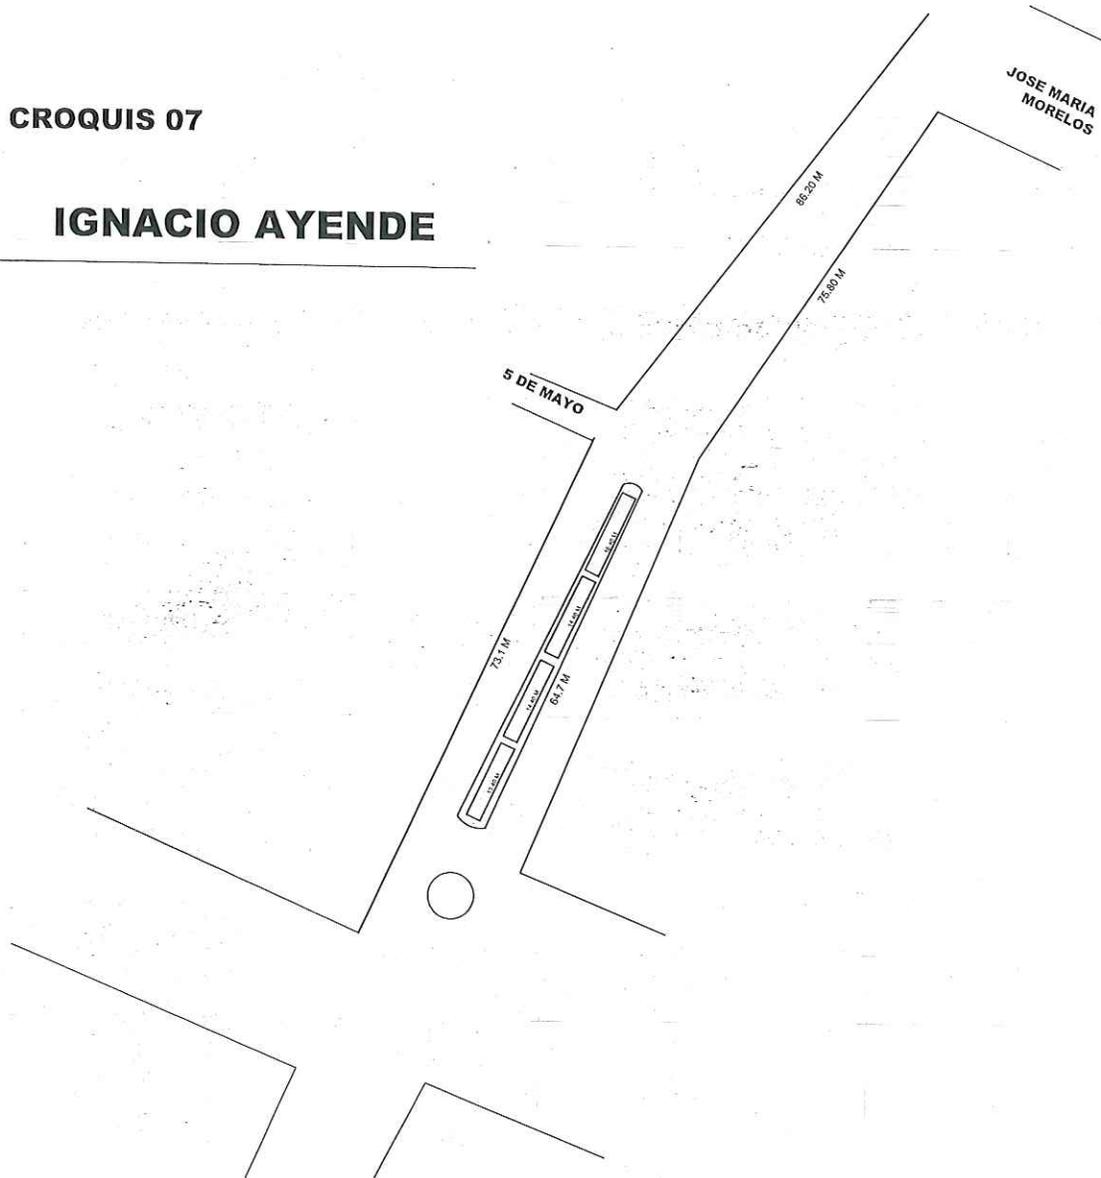

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo Flores
Año de **1925**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10057. MANTENIMIENTO DE GUARNICIONES DE CONCRETO, RAYAS PEATONALES Y CANALIZADORAS DE CARRIL, EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.

LOCALIDAD: 0001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

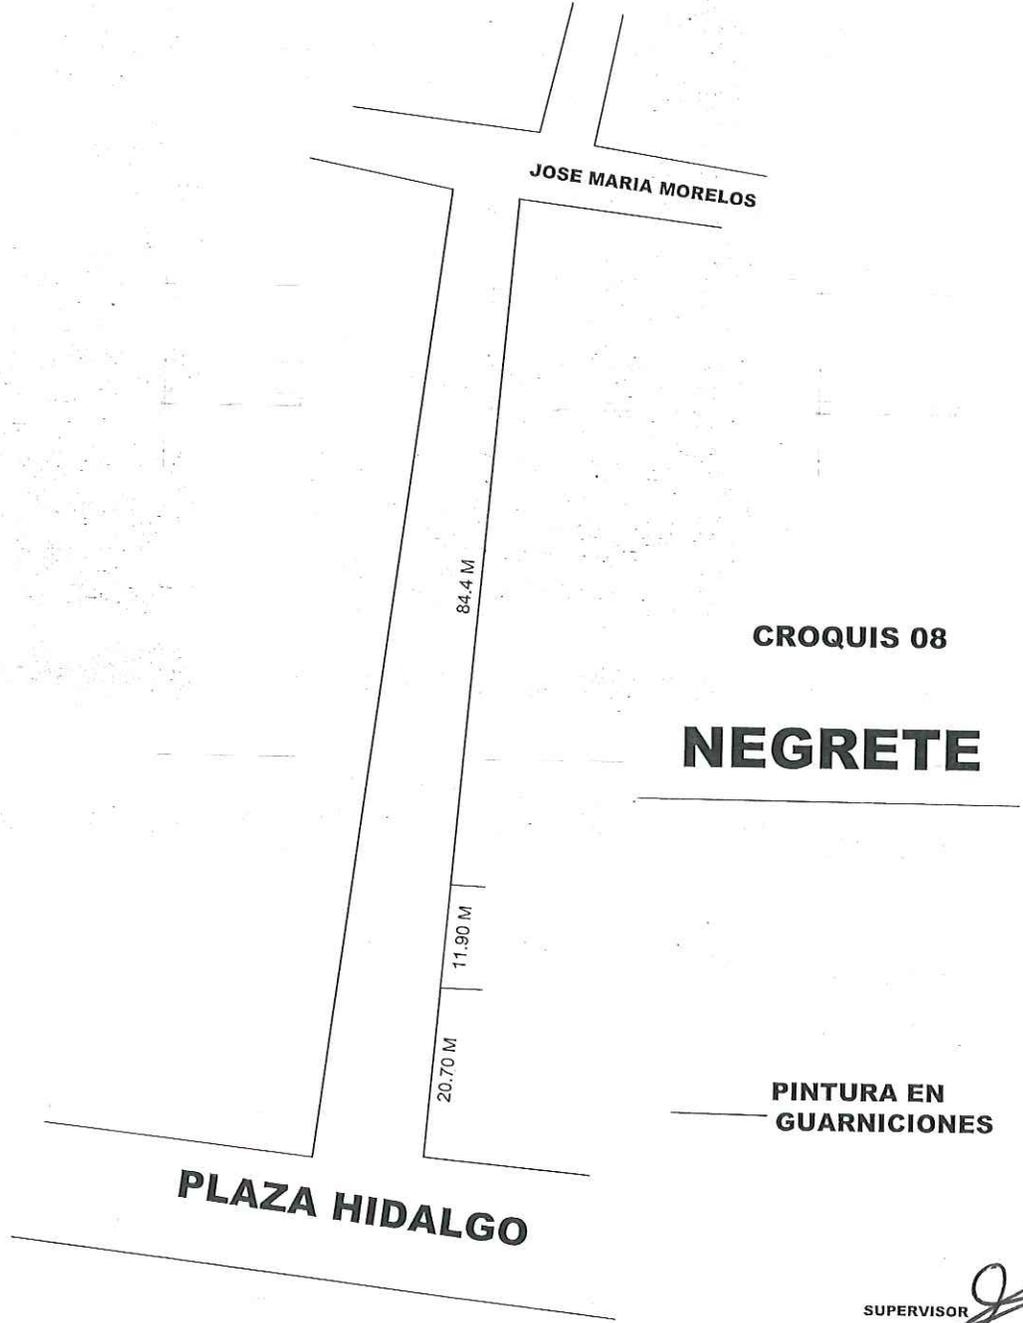

CROQUIS 08

NEGRETE

PINTURA EN GUARNICIONES

PLAZA HIDALGO

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
