



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN				K004
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ				10071
Ofic. Validación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022				
Mes de Registro	Abril				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0071		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ				
Localidad (clave y descripción)	0013		Gregorio Méndez, Jalpa de Méndez, Tabasco				
Proyecto Antecedente	Nuevo						
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,112	Hombres	538	Mujeres	574
						Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2022		Inversión pendiente		
0.00	0.00		0.00		0.00		
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente		
96.00	PIEZAS		96.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio	14/06/2022			Administración			
Término	13/07/2022						
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave	Descripción			Clave	Descripción		
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS		

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim	49.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				230,110.46
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	112,754.12	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	117,356.33	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	117,356.33	3er Trim	112,754.12	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	230,110.46	0.00	230,110.46

RA. GREGORIO MENDEZ JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE ENERO DE 2022

**LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ**

**PRESIDENTA MUNICIPAL.**

**JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.**


**PRESENTE:**

**ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

**ATENTAMENTE:**



**C. JOSÉ INÉS SEGOVIA GARCÍA**

**REPRESENTANTE DEL RAMO 33**

FECHA DE ELABORACIÓN: 25 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: I0071

## ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: RA. GREGORIO MENDEZ  
del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

**I0071.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD RA GREGORIO MENDEZ**

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcassas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO  
Y/O DELEGADO MUNICIPAL



NOMBRE C. JOSE INES SEGOVIA GARCIA  
CARGO REPRESENTANTE DEL RAMO 33

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. NURIS LÓPEZ BANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

**I0071 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ**

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION


K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELIDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

013.- RA. GREGORIO MENDEZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**

Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0071 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ, a ejecutarse en: 013.- RA. GREGORIO MENDEZ, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0071	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ	013.- RA. GREGORIO MENDEZ	96 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 230,110.45

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable






# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

## RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1887	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
687	20-may-	10071	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ACUMBRADO PUBLICO EN LA RA.GREGORIO MENDEZ	



Envía  
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.



Recibe  
MTRO. RAFAEL RAMON MORALES  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

## SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO


No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0687	20 mayo 2022	01	01


Ref. Económica	Descripción
10071	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA RA.GREGORIO MENDEZ

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	96.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKPH08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	50.00	8697	FOTOCENTRALIZADOR DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	80.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	30.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 10	ML.
5	30.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
6	50.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
7	35.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
8	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PIEZA
12	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
13	35.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
14	5.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
15	2.00	9307	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
16	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23 18M LONG	PIEZA

SOLICITO	AUTORIZO
 <b>ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	 <b>MTR. RAFAEL RAMON MORALES</b> DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE JULIO DE 2022  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10071 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE RA. GREGORIO MENDEZ

LOCALIDAD: 013.- RA. GREGORIO MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 230,110.45

META: 96.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022  
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,112 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ALUMBRADO PUBLICO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	96.00	\$ 350.00	\$ 33,600.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	50.00	\$ 227.59	\$ 11,379.50
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	80.00	\$ 12.98	\$ 1,038.40
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00	\$ 19.50	\$ 585.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	30.00	\$ 25.00	\$ 750.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	50.00	\$ 28.79	\$ 1,439.50
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	35.00	\$ 62.93	\$ 2,202.55
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	35.00	\$ 60.34	\$ 2,111.90
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	5.00	\$ 27.59	\$ 137.95
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	2.00	\$ 108.34	\$ 216.68
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00	\$ 520.00	\$ 520.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 57,214.48</b>
				16% IVA	\$ 9,154.32
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 66,368.80</b>

META ALCANZADA: 96.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 14-jun-2022

TERMINO REAL: 13-jul-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

66,368.80

SALDO POR CANCELAR: \$

163,741.6

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
18 SESIÓN ORDINARIA

Fecha  
15-mar-2022

Inversión (\$)  
\$ 230,110.45

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Año de Mayor Ricardo Flores PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUÓ LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIDAD: C. DARVIN DE LA CRUZ SANCHEZ DELEGADO MUNICIPAL

COMITÉ ( x )

Presidente

C. JOSE INES SEGOVIA GARCIA

Secretario

C. NATIVEL DE LA CRUZ RUIZ

1ER. Vocal

C. ANA MARTA DE LA CRUZ BADAL

2DO. Vocal

C. MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ IZQ.

3ER. Vocal

C. YURIDIA JIMENEZ HERNANDEZ

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33



QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS OBRAS... SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR

Form with fields for Dependencia, Cargo, Razones, and Nombre y firma.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10071

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ

LOCALIDAD: 013.- RA. GREGORIO MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**GENERADOR DE OBRA**

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	96.00
2	FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	50.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	80.00
4	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 10.	ML	30.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	30.00
7	CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	50.00
8	BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	35.00
9	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00
10	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	35.00
15	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	5.00
17	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	2.00
18	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00

SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

## BITACORA DE OBRA

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10071.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Gregorio Méndez.

Localidad: 013.- R/a. Gregorio Méndez.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 66,368.80

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **R/a. Gregorio Méndez. de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10071: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Gregorio Méndez.**

En la R/a. Gregorio Méndez. se instaló el siguiente material eléctrico.

96 pzas de Focos LED de 50 W.

35 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

50 pza de Foto celdas de 220 V.

80 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para reemplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos y lámparas Led)

30 mts de Cable forrado THW cal. 10. (Se utiliza para cablear los conectores bimetálicos 6-8, y reemplazar el cable dañado en luminario suburbanos y lámparas Led)

30 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6 (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

50 pza Conector bimetálico 6-8

35 pza de Soquet mogul reductor

5 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

Continua la nota 001


1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

2 pza Cinta Aislante súper 33

1 pza Cinta Aislante súper 23

SUPERVISOR

  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.




PROYECTO: 10071

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ

LOCALIDAD: 013.- RA. GREGORIO MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**

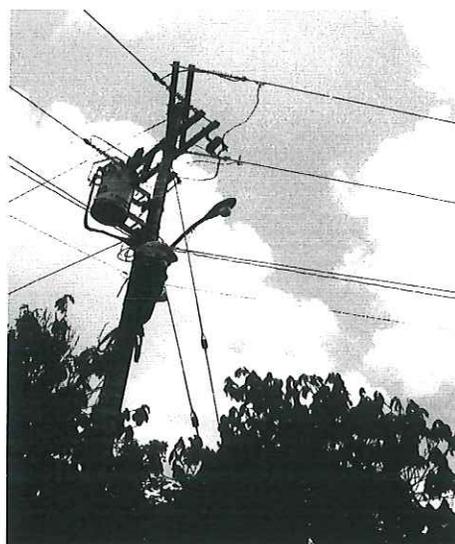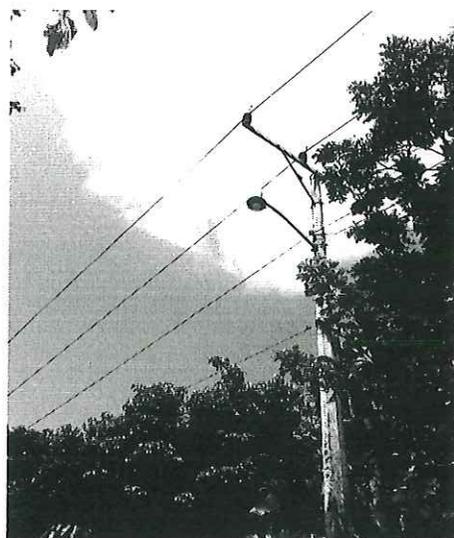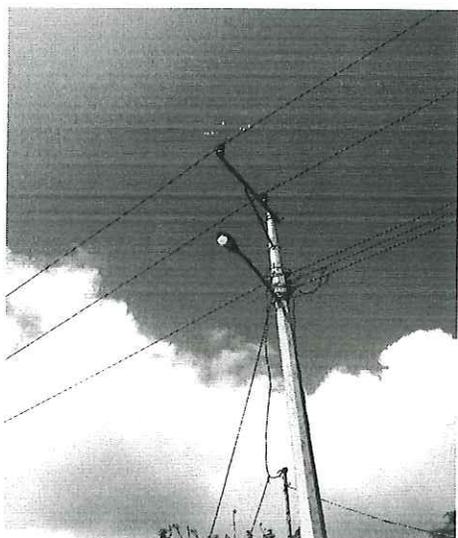

SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.


PROYECTO: 10071

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ

LOCALIDAD: 013.- RA. GREGORIO MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**

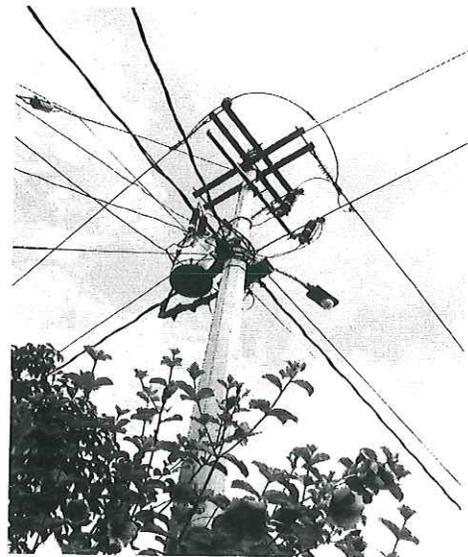

SUPERVISOR:  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.





PROYECTO: 10071

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: RA. GREGORIO MENDEZ

LOCALIDAD: 013.- RA. GREGORIO MENDEZ

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**ALBUM FOTOGRAFICO**

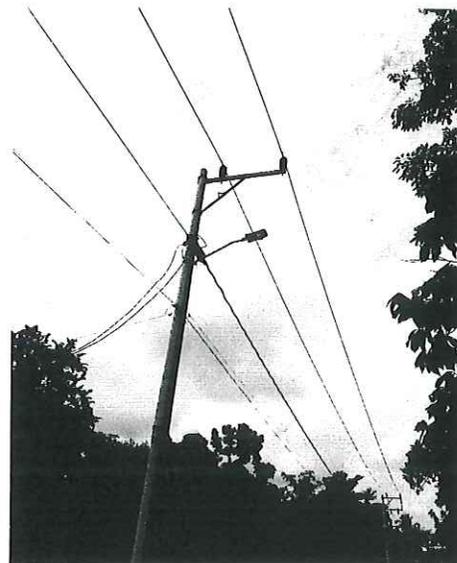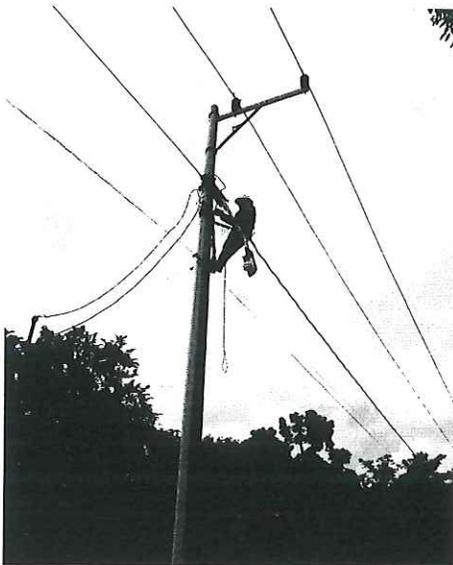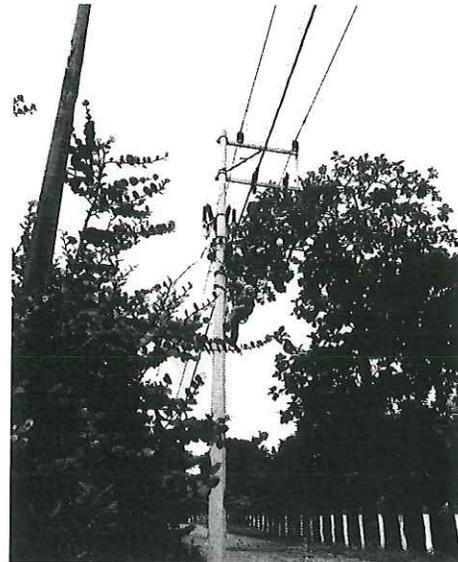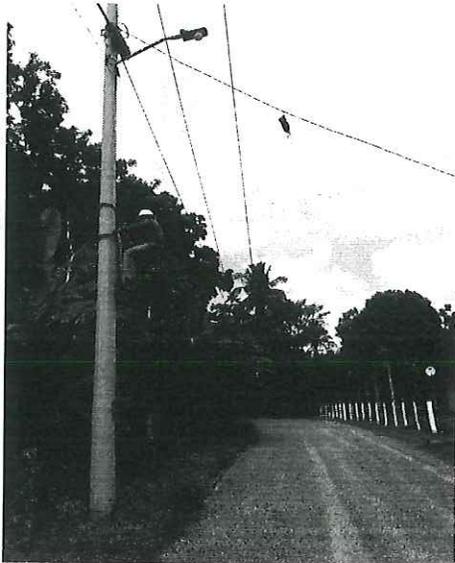




**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**Ricardo  
Flores  
Magón**  
Año de  
Precursor de la Revolución Mexicana

# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10071. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD  
RA. GREGORIO MENDEZ.

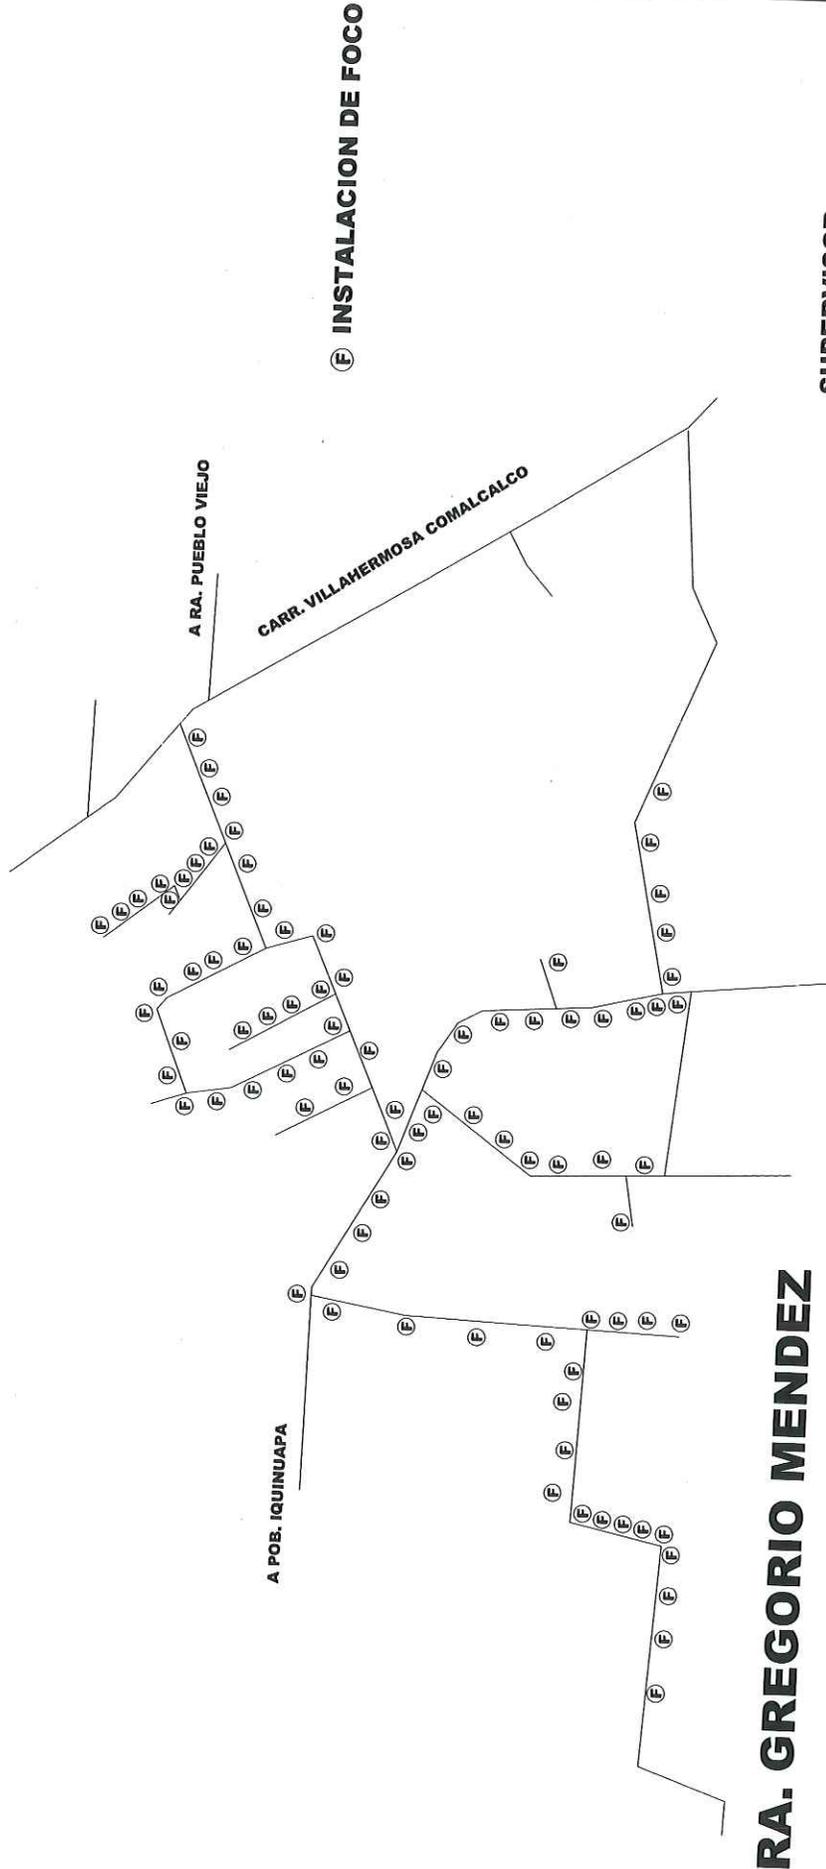

**RA. GREGORIO MENDEZ**

**SUPERVISOR**  
  
**ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ**
