



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

ok

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas		
Categoría	Descripción	Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN	08
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION	K004
Finalidad	GOBIERNO	006
Función	OTROS SERVICIOS	1
Subfunción	OTROS	8
Subsubfunción	NINGUNO	05
		0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)	I0058
Ofic. Validación	ACTA No. 18 ORDINARIA 15/03/2022	
Mes de Reglstro	Abril	

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO	
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.	1
Estrategía	Alumbrado Público	1.6
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.	1.6.2
		1.6.2.3

Programa de Acción

Objetivo	Combate a la Corrupción	
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso	1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.	1.1
		1.1.3

Matriz de Indicadores de Resultados

Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10058		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)						
Localidad (clave y descripción)	0033		Santa Ana (El Rio), Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	350	Hombres	170	Mujeres	180	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2022		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
23.00		PIEZAS			23.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio		14/06/2022		Administración					
Término		13/07/2022							
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	49.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	51.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51.00	3er Trim	49.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				167,215.93
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	81,935.81	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	85,280.12	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	85,280.12	3er Trim	81,935.81	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/2022	TPN-JM-FIII-PN-007	TPN-JM-FIII-PN-007	01/04/2022	0.00	167,215.93	0.00	167,215.93



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

Cedula Reprogramada,
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10058	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	167,215.93
Total Capitulo		167,215.93
Global		167,215.93

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

EJIDO SANTA ANA (EL RÍO) JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

J. A. J.

Janeth Alvarez Jimenez

C. JANETH ALVAREZ JIMÉNEZ



FECHA DE ELABORACIÓN: 24 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: 10058

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 24 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: EJIDO SANTA ANA (EL RÍO)

del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

**OBRA 10058.- REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EJ
SANTA ANA**

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: Se rehabilitará el sistema de alumbrado en diversos puntos como es el mantenimiento de las luminarias sustituyendo las fotoceldas luminarias carcasas cables conectores soquet listones fusibles para el correcto funcionamiento de cada de los elementos que componen al alumbrado

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMA:
NOMBRE
CARGO

J. A. J.
C. JANETH ALVAREZ JIMÉNEZ
DELEGADO MUNICIPAL



[Signature]
LIC. NURIS LÓPEZ SANCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

10058 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELÉCTRICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

033.-EJ. SANTA ANA (EL RIO)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 21 de febrero de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**

Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 21-feb-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra 10058 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO), a ejecutarse en: 033.-EJ. SANTA ANA (EL RIO), ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10058	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)	033.-EJ. SANTA ANA (EL RIO)	23 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 167,215.93

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable






H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1864	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
655	20-may-	10058	SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SANTA ANA EL RIO	



H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.



SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
0655	20 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10058	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJIDO SANTA ANA EL RIO

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	23.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	4.00	8697	FOTOCENTRAL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	100.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	15.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
5	12.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
6	5.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
7	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PIEZA
8	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PIEZA
9	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PIEZA
10	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PIEZA
11	1.00	8237	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PIEZA
12	5.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
13	7.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
14	1.00	9307	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
15	1.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 23 18M LONG	PIEZA



SOLICITO

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

AUTORIZO

MTRO. RAFAEL RAMON MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 14 DE JULIO DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10058 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: E.J. SANTA ANA (EL RIO)

LOCALIDAD: 033.- E.J. SANTA ANA (EL RIO)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 167,215.93

META: 23.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 350 HABITANTES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ALUMBRADO PUBLICO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	23.00	\$ 350.00	\$ 8,050.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	4.00	\$ 227.59	\$ 910.36
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	100.00	\$ 12.98	\$ 1,298.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	15.00	\$ 25.00	\$ 375.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	12.00	\$ 28.79	\$ 345.48
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	5.00	\$ 62.93	\$ 314.65
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00	\$ 646.60	\$ 646.60
14	SUMINISTRO Y COLOCACION SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	5.00	\$ 60.34	\$ 301.70
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	7.00	\$ 27.59	\$ 193.13
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00	\$ 108.34	\$ 108.34
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00	\$ 520.00	\$ 520.00
SUBTOTAL					\$ 15,649.66
16% IVA					\$ 2,503.95
TOTAL					\$ 18,153.61

META ALCANZADA: 23.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 14-jun-2022

TERMINO REAL: 13-jul-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

18,153.61

SALDO POR CANCELAR: \$ 149,062.32

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
18 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
15-mar-2022

Inversión (\$)
\$ 167,215.93

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

TÉRMINOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISIÓN:

ING. ANYEYO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD:

C. LAURA DIAZ HERNANDEZ
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (X)

Presidente

C. MERLY YURADIA HERNANDEZ DOMINGUEZ

1ER. Vocal

C. GERONIMO LOPEZ PINTADO

3ER. Vocal

C. FABIOLA RIVERA ALMEIDA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

Secretario

C. GRISELDA LOPEZ LEYVA

2DO. Vocal

C. MARIA ANTONIA LOPEZ CORONEL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10058

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)

LOCALIDAD: 033.- EJ. SANTA ANA (EL RIO)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION VOLTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K, VIDA UTIL DE 25000 HRS.	PZ	23.00
2	FOTOCONTROL ELECTRONICO MARCA TORK SERIE ZTL124-510 MODELO ZTL 124-510J-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	4.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OPC Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CAL. 12.	ML	100.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	M	15.00
7	CONECTOR BI-METALICO 6-8	PZ	12.00
8	BASE PARA FOTOCELDA MARCA TORK MODELO 2224 16 O EQUIVALENTE	PZ	5.00
9	ESLABON FUSIBLE DE 4 A	PZ	1.00
10	ESLABON FUSIBLE DE 2.5 A	PZ	1.00
11	ESLABON FUSIBLE DE 2 A	PZ	1.00
12	ESLABON FUSIBLE DE 1.5 A	PZ	1.00
13	ESLABON FUSIBLE DE 1 A	PZ	1.00
14	SOQUET MOGUL (REDUCTOR) 220/110.	PZ	5.00
15	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	7.00
17	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 33	PZ	1.00
18	CINTA AISLANTE DE VINIL MARCA SCOTCH 23	PZ	1.00

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

BITACORA DE OBRA

Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10058.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: Ej. Santa Ana

Localidad: 0033.- Ej. Santa Ana

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 18,153.61

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **Ej. El Santa Ana de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **proyecto 10032: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: Ej. Santa Ana**

En el Ej. El Santa Ana se instaló el siguiente material eléctrico.

23 pzas de Focos LED de 50 W.

5 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

4 pza de Foto celdas de 220 V.

100 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para remplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos, lámparas Led, cablear los conectores bimetálicos 6-8)

15 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6 (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8)

12 pza Conector bimetálico 6-8

5 pza de Soquet mogul reductor

7 pza soquet para interperie

1 pza Eslabón fusible (60 kva) 4 amps.

1 pza Eslabón fusible (50 kva) 2.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (30 kva) 2 amps.

1 pza Eslabón fusible (15 kva) 1.5 amps.

1 pza Eslabón fusible (3 kva) 1 amps.

1 pza Cinta Aislante super 33

1 pza Cinta Aislante super 23

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.




PROYECTO: 10058

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)

LOCALIDAD: 033.- EJ. SANTA ANA (EL RIO)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

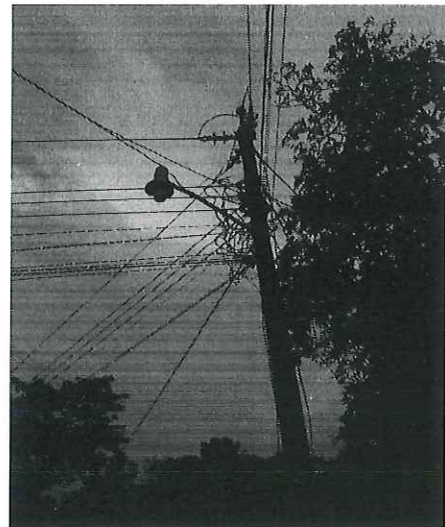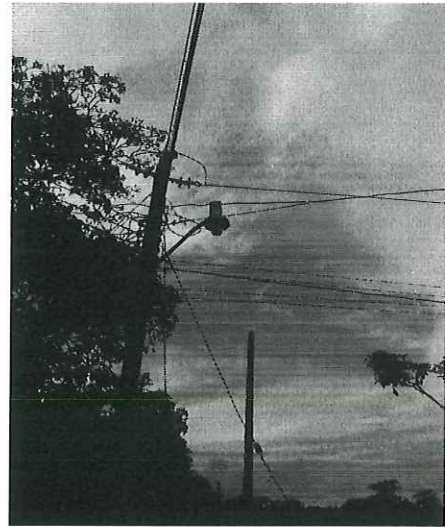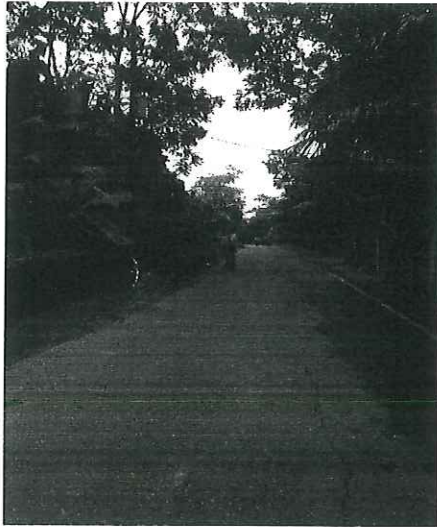



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.



PROYECTO: 10058

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)

LOCALIDAD: 033.- EJ. SANTA ANA (EL RIO)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

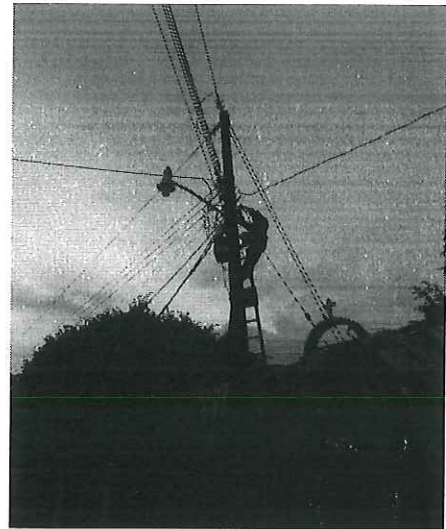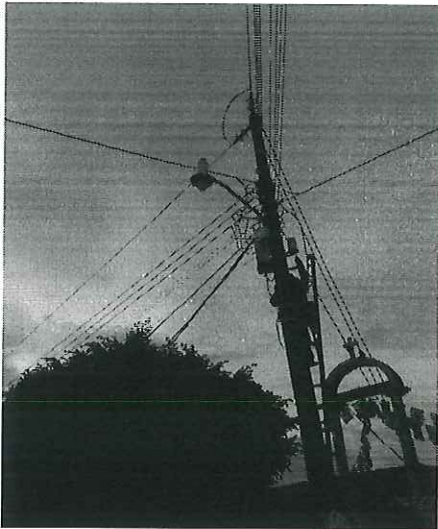

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.





PROYECTO: 10058

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD: EJ. SANTA ANA (EL RIO)

LOCALIDAD: 033.- EJ. SANTA ANA (EL RIO)

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

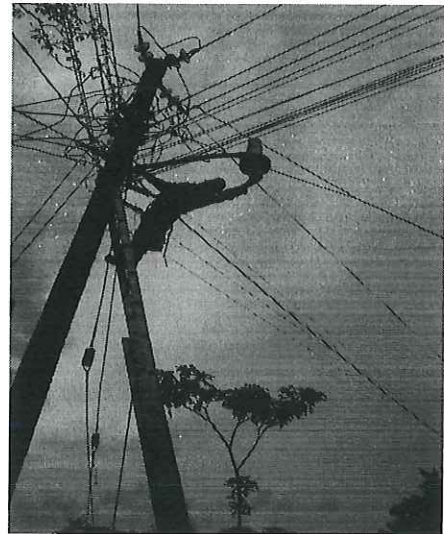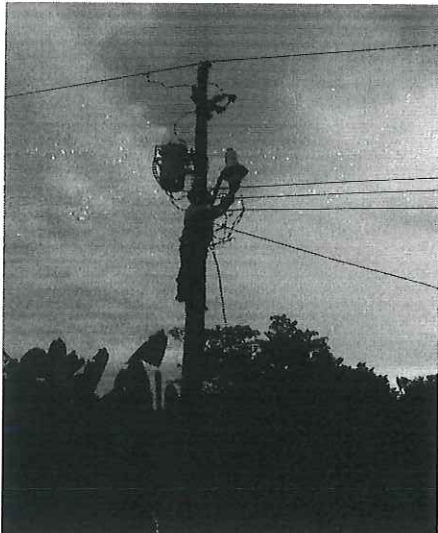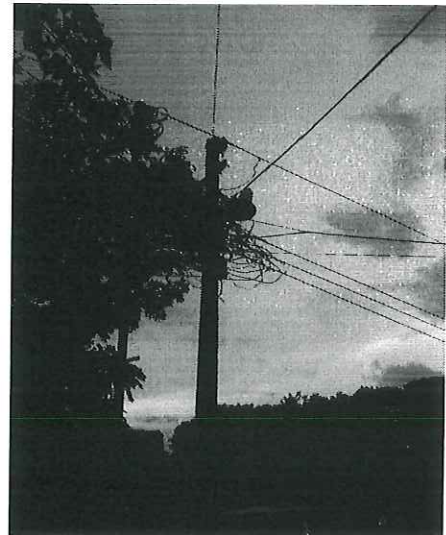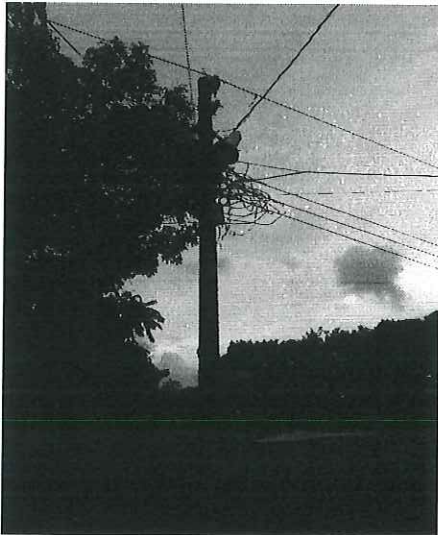

SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




Ricardo
POZZ FLORES
Año de
MAJÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDÉZ

10058.-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD EJ. SANTA ANA.

A RA. EL RIO

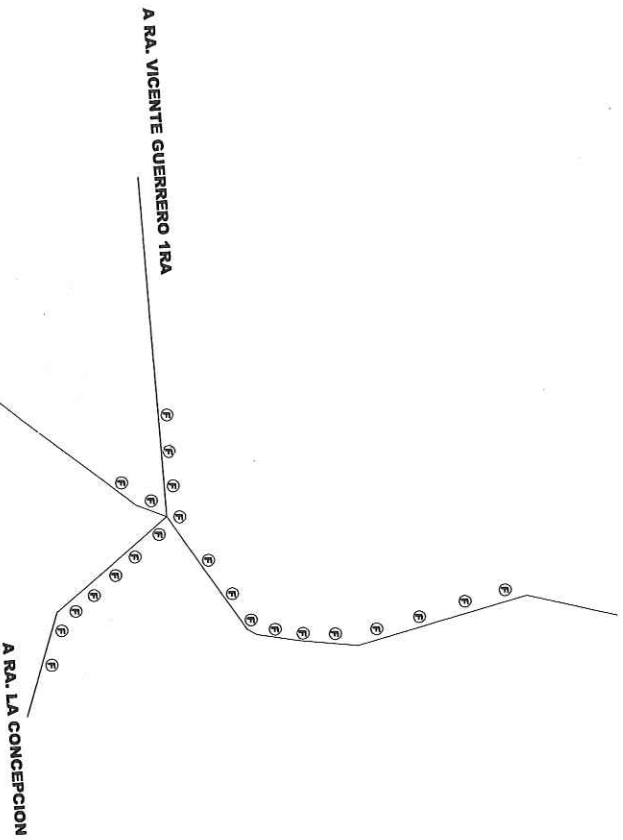

ⓕ INSTALACION DE FOCO

EJ. SANTA ANA

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
