



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61301.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0109
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: CONVENIO FISE (FAIS)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. DE LICITACION	: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023
FECHA	: 22 DE JUNIO DE 2023
OBRA	: I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
LOCALIDAD	: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 400.00 ML.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 25 DE JULIO 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 147,341.48 **(CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 145,072.41 **(CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 0.00 **(CERO PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/239/2023.
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2023.

CONTRATISTA	: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
DOMICILIO	: CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MECHOR OCAMPO, CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490
REG. FED. DE CAUSANTES	: DOAA6201315E8
REG. I. M. S. S.	: E7422540103
REG. INFONAVIT	: E7422540103
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-04168



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO, REPRESENTADA POR EL C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- 1.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE., PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

- I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO **CONVENIO FISE (FAIS)**; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL **C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO**. ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. **DOAA6201315E8** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. **DMANAM62013127H201**. MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: **CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MECHOR OCAMPO, CARDENAS, TABASCO. C.P.: 86490. CORREO: adanconstrucciones@hotmail.com** MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: **10109.-05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. UBICADO EN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.** Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **145,072.41** **** (CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS PESOS 41/100 M.N.) ** INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE **30 DÍAS NATURALES**, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA **26 DE JUNIO DE 2023** Y LA TERMINACIÓN EL DÍA **25 DE JULIO 2023**.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO **MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23**; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO **30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023.**



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ “EL AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 00.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 0.00 **** (CERO PESOS 00/100 M.N.)****, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO “EL AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BBVA MEXICO, S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 012792004715751470

TIPO DE CUENTA: MAESTRA PYME BBVA

SUCURSAL: 4429 **NOMBRE DE LA SUCURSAL:** CARDENAS CENTRO

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS,

9/17

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO”, PARA QUE ÉSTA RESUELVÁ LO CONDUCTENTE; “EL CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y “EL AYUNTAMIENTO” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “EL AYUNTAMIENTO”, JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

10/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA”, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

“EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL AYUNTAMIENTO”.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VIII. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR “EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI “EL AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISIÓN, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL “CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL AYUNTAMIENTO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFATORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE “EL AYUNTAMIENTO” DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL AYUNTAMIENTO”.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 22 DE JUNIO DE 2023.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

FIRMAS

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”
AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
PERSONA FISICA

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023, DE LA OBRA: I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ. TABASCO. CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/355/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA S/N. COL. SANTA
MARÍA DE GUADALUPE C.P.: 86490 CARDENAS, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	08:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	70 y 30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	250 y 240 Red de drenaje y alcantarillado Y Líneas y redes de agua potable 240 Líneas y redes de		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

Recibi

30 - Mayo - 2023

Página 1 de 2

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/356/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

AYUNTAMIENTO No. 505 COL. GIL Y SÁENZ C.P.: 86080
VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:


AT'N. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	08:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	70 y 30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	250 y 240 Red de drenaje y alcantarillado Y Líneas y redes de agua potable 240 Líneas y redes de		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Recibida
30-05-2023 
Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Página 1 de 2



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL APALUCAMIENTO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



ADAN CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES ELECTROMECAICAS, CIVILES,
HIDRAULICAS Y ELECTRICAS
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
CONTRATISTA

RFC: DOAA6201315E8

IMSS: 7422540103

INFONAVIT: 7422540103

TEL: 9371552675

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 04 DE JUNIO DE 2023.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN

C. MTRO RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

P R E S E N T E.



EN RESPUESTA A SU NUMERO DE OFICIO: **COPM/DLyPU/354/2023** DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, MANIFIESTO QUE MI EMPRESA ACEPTA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No°MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23 RELATIVO A LA OBRA: I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez. EL CUAL TIENE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 70 Y 30 DÍAS NATURALES

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO, NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

Atentamente

ING. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

REPRESENTANTE LEGAL

Tel. Cel. 9371552675

Correo Electrónico:

adanconstrucciones@hotmail.com

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DEL 2023

**C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:**



EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA: ~~30 DE MAYO DEL 2023~~, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23, OBRA: 10108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. 10109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 70 Y 30 DÍAS NATURALES.


POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUE EL C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARACTER ESTATAL, ASI MISMO ME COMPROMETO A PRESENTAR EL PAQUETE DE LICITACIÓN EL DIA SEÑALADO EN LA INVITACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2023.

SIN MÁS QUE AGREGAR, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
ADMINISTRADOR UNICO**



**CONSTRUCCION EN GENERAL
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
R.F.C. RIVH-970609-8L9**



JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DE 2023.

ASUNTO: OFICIO DE ACEPTACIÓN.

**C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:**

EN RELACIÓN A SU OFICIO NO: COPM/DLYPU/356/2023. DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, EN EL CUAL SE ME HACE LA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA:

NO. LICITACIÓN	DE	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
DESCRIPCIÓN DE OBRA		10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
LOCALIDAD		0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

MANIFIESTO LA ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO ANTES MENCIONADO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED, NO SIN ANTES ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
ADMINISTRADOR UNICO**

AYUNTAMIENTO No. 505, COL. GIL Y SAENZ C.P. 86080
CENTRO, VILLAHERMOSA, TABASCO
TEL. (993) 3-15-13-09 CEL. 9371555504
CORREO ELECTRONICO:heberribera16@hotmail.com

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DEL 2023

CARTA DE ACEPTACIÓN

**C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:**



EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN DE **FECHA 30 DE MAYO DEL 2023**, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23, OBRA: I0108.- 05000509.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO. I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 70 Y 30 DÍAS NATURALES.

POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUE EL C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES, ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL, ASÍ MISMO ME COMPROMETO A PRESENTAR EL PAQUETE DE LICITACIÓN EL DÍA SEÑALADO EN LA INVITACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE MAYO DEL 2023.

SIN MÁS QUE AGREGAR, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**C. ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES
ADMINISTRADOR UNICO**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/360/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
01:21 PM
08 JUN. 2023

C.c.p.- Archivo.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/361/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

[Handwritten Signature]
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
Página 1 de 1
08 JUN. 2023



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

13:20

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

08 JUN. 2023

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/363/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/362/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ
SÍNDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
Rafael Ramon Morales
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS



C.c.p.- Archivo.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VIQUEZ

08 JUN. 2023
Petición 13-16
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/364/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/358/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA

PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO
CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO
2000. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable; en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/359/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (TABASCO)
AV. PASEO TABASCO No. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.
86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Rafael Ramón Morales
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Oficialía de Partes

RECIBIDO
08 JUN 2023

HORA: 10:16
ANEXO: 010
NOMBRE: _____
Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

DES-PACHO DEL C. SECRETARIO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/365/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO
SECRETARIO DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO (TABASCO). PASEO DE LA SIERRA No. 425
COL. REFORMA, C.P. 86080 VHSA., TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Rafael Ramón Morales
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/354/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MELCHO OCAMPO C.P.:
86545 CARDENAS, TABASCO.

PRESENTE:

Recabi
30-05-2023
a: 30
[Handwritten signature]

AT'N. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	08:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	08:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	70 y 30 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	250 y 240 Red de drenaje y alcantarillado Y Líneas y redes de agua potable 240 Líneas y redes de		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

Página 1 de 2

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a lunes, 5 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 09:00 hrs. a.m. del día lunes, 5 de junio de 2023 los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales serviran para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN	





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

Descripción de la obra: I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO		
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	Miguel Ángel Rivera Angles	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	Heber Samuel Rivera Valencia.	





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 6 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.	
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23	
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 08:00 hrs. del día **martes, 6 de junio de 2023** hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

- 1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
- 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.

- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

No habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las 08:50 hrs. del día **Martes 06 de Junio de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	






Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

- 01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.
- 02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
- 03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.
- 04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.
- Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.
- 05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadrada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.
- 06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.






08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLASIFICACIÓN	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ANIMAD DOMÍNGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER YALNCIA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES			
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
LET-OBRA	Pza.	1.0000	\$ 7,239.67	\$ 7,239.67	0.310%	\$ 7,566.92	5%	0.387%	\$ 7,789.68	8%	0.389%	\$ 7,772.16	7%	#####			
	Prelijuntes.																
	Construcción de ferreo alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de pír de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendiente, excavación hasta un metro de profundidad y 2' dados de concreto (ce 150 kg/cm ² , de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo sellado y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramientas y mano de obra																
CCC-093	Drenaje sanitario	269.9030	\$ 7.64	\$ 2,062.06	0.068%	\$ 6.93	-9%	0.069%	\$ 7.14	-7%	0.068%	\$ 7.13	-7%	#####			
	Trazo y nivelación en alambos o vialidades existentes con aparatos topográficos																
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortados de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	500.0000	\$ 27.07	\$ 24,383.00	1.042%	\$ 21.76	-20%	1.007%	\$ 22.41	-17%	1.005%	\$ 22.37	-17%	#####			
	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.																
CCC-103	Sonido para localización de instalaciones existentes (faja potable, teléfonos, etc); incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.	115.3800	\$ 22.99	\$ 2,653.21	1.095%	\$ 189.35	-15%	1.110%	\$ 194.83	-12%	1.121%	\$ 157.72	-28%	#####			
	Sonido para localización de instalaciones existentes (faja potable, teléfonos, etc); incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.																
CCC-136	Excavación en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	3.0000	\$ 949.87	\$ 4,748.35	0.203%	\$ 866.25	-9%	0.222%	\$ 893.89	-9%	0.223%	\$ 862.30	-6%	#####			
	Excavación en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad																
CCC-395	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en capas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	356.7000	\$ 152.97	\$ 54,564.40	2.333%	\$ 138.39	-10%	2.522%	\$ 139.34	-9%	2.477%	\$ 142.23	-7%	#####			
	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en capas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad																
CCC-032	Demolición de pozo de visita de hasta 2.00 m de profundidad, con maquinaria	470.2500	\$ 39.08	\$ 18,377.37	0.768%	\$ 35.87	-8%	0.862%	\$ 36.04	-5%	0.866%	\$ 36.87	-6%	#####			
	Demolición de pozo de visita de hasta 2.00 m de profundidad, con maquinaria																
CCC-210	Demolición de pozo de visita de hasta 2.00 m de profundidad, con maquinaria	8.0000	\$ 1,099.20	\$ 8,793.60	0.376%	\$ 578.41	-47%	0.239%	\$ 595.50	-46%	0.237%	\$ 594.42	-46%	#####			

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINADO DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL		
POZO 2	Pozo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con diámetros de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro; en el brocal, muros contruados a base de bloco; cola de fajo tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta máxima de 2.00 cm, acabado común, alabado; interior y exterior de 1.5 cm de espesor; terminado con mortero cemento arena; proporción 1:4 con impermeabilizante integral; plantilla de concreto simple de 5 cm de espesor; Fc= 100 kg/cm ² , fcsa de 10 cm de espesor del concreto Fc=200 kg/cm ² . Con Impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/4" de 40 cm de pedaleo, 60 cms., de desarrollo y 20 cm de anclaje por lado, media de chata de concreto Fc= 100 kg/cm ² , hasta la mitad de la tubería; sillente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo; fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8.0000	\$ 11,314.93	\$ 90,510.44	3.870%	\$ 9,345.76	-17%	\$ 74,700.08	3.820%	\$ 9,621.72	-15%	\$ 76,073.70	3.837%	\$ 9,604.52	-15%	\$ 76,836.16	#####
BROCA Y TAPA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior); construcción de anillo perimetral de concreto Fc = 200 kg/cm ² , de 20 cm. Hecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm (3/8") y 4 varillas de 6 mm (1/4") a cada 15 cm., incluye: materiales, mano de obra, hallado de acero, cimbras y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	8.0000	\$ 3,500.51	\$ 28,004.08	1.197%	\$ 2,898.08	-14%	\$ 23,991.84	1.228%	\$ 3,087.55	-12%	\$ 24,700.40	1.231%	\$ 3,079.10	-12%	\$ 24,632.80	#####
CCC-762	Suministro e instalación de tapón en pozo de visita existente para retención de aguas negras, hecho a base de 10 costales de polipropileno tejido, llenos con arena (0.025 m ³ por costal) para poder colocar tubería de PVC	Pieza	15.0000	\$ 243.44	\$ 3,651.60	0.158%	\$ 229.66	-6%	\$ 3,445.35	0.176%	\$ 238.48	-3%	\$ 3,547.20	0.177%	\$ 239.04	-3%	\$ 3,540.60	#####
ADQME MET	Requisito de tapas metálicas para evitar derrumbes, incluye carga, acarreo y descarga de todos los materiales necesarios así como suministro, fabricación, bocado de placas, instalación, pintura, extracción material y mano de obra para su correcta instalación.	m ²	1,600.0000	\$ 84.63	\$ 135,408.00	5.789%	\$ 61.66	-27%	\$ 98,656.00	5.040%	\$ 83.48	-25%	\$ 101,668.00	5.053%	\$ 66.21	-22%	\$ 105,936.00	#####
CCC-651	Suministro y faldido manual de arena para cama en excavaciones para alisar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (ballarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	35.0000	\$ 382.56	\$ 12,834.62	0.546%	\$ 286.51	-21%	\$ 10,107.05	0.518%	\$ 283.94	-19%	\$ 10,405.48	0.519%	\$ 289.43	-19%	\$ 10,387.42	#####



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"

LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: I0108.-050000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINAD DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER VALANCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL
46	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011, Y NMX-E215/1-ONCP-2012 Incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	315.0000	\$ 284.60	\$ 89,649.00	3.833%	-23%	\$ 66,922.00	3.521%	\$ 219.68	\$ 69,166.20	3.449%	\$ 225.46	\$ 71,019.80	-21%
CCC-162	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011, Y NMX-E215/1-ONCP-2012 Incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	395.0000	\$ 739.53	\$ 292,114.35	12.468%	-9%	\$ 274,975.10	14.039%	\$ 712.21	\$ 281,322.95	14.023%	\$ 714.23	\$ 282,120.65	-3%
CCC-434	Suministro e instalación de descargador sanitario a base de 4.00 x 5.00 m de tubo de PVC para alcantarillado serie 20 de 150 mm (6") de diámetro, 1 sifón de descarga de 305 x 150 mm (12" x 6") con codo de 45 x 150 mm (6")	Pieza	80.0000	\$ 2,264.86	\$ 181,188.80	7.746%	-33%	\$ 121,853.60	8.225%	\$ 1,543.85	\$ 123,508.00	6.156%	\$ 1,512.48	\$ 120,988.40	-33%
REGANONDOXO	Construcción de registro con sección interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de block macizo de 10 x 20 x 40 cm asentado con mezcla cemento-arena en prop. 1:5, aplastado interior con mortero cemento-arena en prop. 1:5, tapa de concreto hecho en obra de 200 kg/cm2 con l.m.a. de 19 mm, de 5 cm de espesor armado con malla electrosoldada 6x6/4-4, incluye: suministro de los materiales, acarreo al lugar de la obra, excavación, planilla de concreto simple hecho en obra (C=100 kg/cm2 con l.m.a. de 5.00 cm, marco del lingote de acero de 1 1/2" x 1/8" (38 mm x 3.2 mm) y contenedor de lingote de acero de 2" x 1/8" (51 mm x 3.2 mm) con 4 aristas a base de pintura de acero 1" x 3/16" (25 mm x 3.2 mm), juego de agraderas a base de acero redondo de 1/4" (6.4 mm) de ø de 35 cm de desarrollo cada una, primario anticorrosivo, acabado con pintura esmalte como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	Pieza	80.0000	\$ 1,822.15	\$ 145,772.00	0.232%	-10%	\$ 130,465.60	8.666%	\$ 1,695.97	\$ 133,277.60	6.643%	\$ 1,876.24	\$ 134,009.20	-8%
CCC-177	Bombazo de achique con bomba autocabante de 76 mm (3") de diámetro en succión y descarga	hora	100.0000	\$ 117.87	\$ 11,787.00	0.504%	-6%	\$ 10,748.00	0.540%	\$ 110.67	\$ 11,067.00	0.552%	\$ 110.47	\$ 11,047.00	-6%
CCC-176	Bombazo de achique con bomba autocabante de 100 mm (4") de diámetro en succión y descarga	hora	40.0000	\$ 154.09	\$ 6,163.60	0.264%	-4%	\$ 5,940.80	0.304%	\$ 152.01	\$ 6,116.40	0.305%	\$ 152.65	\$ 6,100.00	-1%
CCC-052	Rebaje y compactado con equipo (ballarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al oebeta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³ .	1,150.3400	\$ 317.92	\$ 365,710.00	15.835%	-22%	\$ 283,786.88	14.409%	\$ 253.99	\$ 292,174.86	14.584%	\$ 246.45	\$ 285,801.87	-22%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ANINAD DOMÍNGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
CCC-005	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ³	115.3800	\$ 44.67	\$ 5,154.02	0.220%	\$ 24.61	\$ 2,839.50	-45%	0.145%	\$ 25.32	\$ 2,921.42	-43%	0.146%	\$ 25.28	\$ 2,918.81	-43%	#####
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	115.3800	\$ 17.93	\$ 2,068.78	0.088%	\$ 18.75	\$ 1,932.82	-7%	0.080%	\$ 17.24	\$ 1,988.15	-4%	0.090%	\$ 17.22	\$ 1,988.84	-4%	#####
CCC-015	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	115.3800	\$ 6.90	\$ 798.12	0.034%	\$ 6.45	\$ 744.20	-7%	0.038%	\$ 6.84	\$ 788.12	-4%	0.038%	\$ 6.83	\$ 784.07	-4%	#####
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	826.9500	\$ 33.50	\$ 27,702.83	1.184%	\$ 20.49	\$ 16,944.21	-39%	0.866%	\$ 21.10	\$ 17,448.65	-37%	0.870%	\$ 21.06	\$ 17,415.57	-37%	#####
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	826.9500	\$ 16.17	\$ 13,371.78	0.572%	\$ 15.11	\$ 12,495.21	-7%	0.838%	\$ 15.55	\$ 12,859.07	-4%	0.841%	\$ 15.53	\$ 12,842.53	-4%	#####
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	826.9500	\$ 6.90	\$ 5,705.06	0.244%	\$ 6.45	\$ 5,333.83	-7%	0.273%	\$ 6.84	\$ 5,400.95	-4%	0.274%	\$ 6.83	\$ 5,482.68	-4%	#####
CCC-093	Drenaje pluvial	m ³	450.0000	\$ 7.64	\$ 3,438.00	0.147%	\$ 6.93	\$ 3,118.50	-9%	0.159%	\$ 7.14	\$ 3,213.00	-7%	0.160%	\$ 7.13	\$ 3,206.50	-7%	#####
CCC-022	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	ml	900.0000	\$ 27.07	\$ 24,303.00	1.042%	\$ 21.78	\$ 19,584.00	-20%	1.001%	\$ 22.41	\$ 20,160.00	-17%	1.005%	\$ 22.37	\$ 20,135.00	-17%	#####
CCC-103	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	m ³	60.2800	\$ 221.99	\$ 13,381.56	0.572%	\$ 188.35	\$ 11,414.02	-15%	0.583%	\$ 194.83	\$ 11,750.38	-12%	0.586%	\$ 157.72	\$ 9,507.36	-20%	#####
CCC-395	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico por medios mecánicos, incluye: a)le del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ³	2.3000	\$ 157.97	\$ 351.83	0.015%	\$ 138.39	\$ 318.30	-10%	0.016%	\$ 139.34	\$ 320.48	-0%	0.016%	\$ 142.23	\$ 327.13	-7%	#####
CCC-032	Excavación con herramienta manual en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	315.0000	\$ 39.08	\$ 12,310.20	0.526%	\$ 35.87	\$ 11,290.05	-8%	0.577%	\$ 36.84	\$ 11,638.10	-5%	0.580%	\$ 38.87	\$ 11,814.05	-6%	#####
CCC-031	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	31.5000	\$ 362.56	\$ 11,420.64	0.488%	\$ 285.51	\$ 8,995.57	-21%	0.450%	\$ 293.04	\$ 9,259.11	-18%	0.462%	\$ 283.43	\$ 9,243.05	-19%	#####
	Suministro y tendido manual de arena para curas en excavaciones para aljar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (ballerina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³																



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"

MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10108.-05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %		
CCC-162	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para alcantarillado de 12" de diámetro serie 20, con campana y empaque, que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E215/1-CNCP-2012 incluye: adquisición, acarreo al lugar de la obra, acarros: internos, trazo, corte, apoyo, limpieza, desmontaje, colocación, Pazo de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruidos a base de bloco, sola de patio tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta, máxima de 2.00 cm, acabado común, aplastado, interior y exterior de 1.5 cm de espesor; promedido con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, planilla de concreto simple de 5 cm de espesor, Fc= 100 kg/cm ² , lisa de 10 cm de espesor de concreto Fc=200 kg/cm ² Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/8" de 60 cm de pulido, 60 cms., de desastrolo y 20 cm de ancho por lado, media de cana de concreto Fc= 100 kg/cm ² , hasta la mitad de la tubería efuente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	450.0000	\$ 739.53	\$ 332,788.50	14.227%	15.987%	-6%	\$ 895.38	\$ 312,921.00	14.227%	15.987%	-6%	\$ 714.23	\$ 321,403.50	15.876%	15.987%	-3%
POZO 1	Piso de visita común, de hasta 2.00 mt. de profundidad interior, con dimensiones de 1.20 m de diámetro en la base y 60 cm de diámetro en el brocal, muros contruidos a base de bloco, sola de patio tipo 1 y tipo 2, asentado con mezcla cemento arena proporción 1:3 con junta, máxima de 2.00 cm, acabado común, aplastado, interior y exterior de 1.5 cm de espesor; promedido con mortero cemento arena proporción 1:4 con impermeabilizante integral, planilla de concreto simple de 5 cm de espesor, Fc= 100 kg/cm ² , lisa de 10 cm de espesor de concreto Fc=200 kg/cm ² Con impermeabilizante integral, Armado con varillas de 3/8" @ 15 cms., en ambos sentidos, escalones de varillas corrugada de 3/8" de 60 cm de pulido, 60 cms., de desastrolo y 20 cm de ancho por lado, media de cana de concreto Fc= 100 kg/cm ² , hasta la mitad de la tubería efuente, sin brocal, incluye: excavación por medios mecánicos, carga mecánica y acarreo fuera de la obra, afine de fondo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Piso	8.0000	\$ 11,344.93	\$ 90,519.44	3.970%	3.820%	-17%	\$ 9,345.76	\$ 74,706.08	3.970%	3.820%	-17%	\$ 9,604.52	\$ 76,898.16	3.837%	3.837%	-15%
BLOCA Y TAPA	Suministro y colocación de brocal y tapa de polietileno de alta resistencia H-25 en pozo de visita de 60 cm de diámetro (medida interior), construcción de anillo perimetral de concreto Fc = 200 kg/cm ² , de 20 cm. hiecho en obra de ancho armado con 2 varillas de 10 mm [3/8"] y grupos de 6 mm [1/4"] a cada 15 cm., incluye: materiales, mano de obra, habilidad de acero, cimbra y descimbra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Piso	8.0000	\$ 3,500.51	\$ 28,004.08	1.197%	1.226%	-14%	\$ 2,896.88	\$ 23,981.84	1.197%	1.226%	-14%	\$ 3,087.55	\$ 24,700.40	1.231%	1.231%	-12%
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ³	317.3000	\$ 44.67	\$ 14,173.79	0.606%	0.396%	-45%	\$ 24.81	\$ 7,808.75	0.606%	0.396%	-45%	\$ 25.32	\$ 8,034.04	0.400%	0.400%	-43%
CCC-017	Acarreo de material producto de demoliciones al primer kilómetro sobre caminos de terracería, Tarifas de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	317.3000	\$ 17.93	\$ 5,686.19	0.243%	0.272%	-7%	\$ 10.75	\$ 5,314.78	0.243%	0.272%	-7%	\$ 17.24	\$ 5,470.25	0.273%	0.273%	-4%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"

MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

10108.-05000509.- Construcción de rad de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

LICITACION No:

OBRA:

UBICACIÓN:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AMINAADO DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERE N CIA EN %	INC. ORAL
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	317.3000	\$ 6.90	\$ 2,189.37	0.064%	\$ 6.45	\$ 2,046.59	-7%	0.105%	\$ 6.64	\$ 2,108.87	-4%	0.105%	\$ 6.63	\$ 2,103.70	-4%	####
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	47.2500	\$ 31.50	\$ 1,502.88	0.086%	\$ 20.40	\$ 968.15	-39%	0.049%	\$ 21.10	\$ 998.98	-37%	0.050%	\$ 21.00	\$ 995.09	-37%	####
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	47.2500	\$ 16.17	\$ 764.03	0.033%	\$ 15.11	\$ 713.05	-7%	0.036%	\$ 15.55	\$ 734.74	-4%	0.037%	\$ 15.53	\$ 735.79	-4%	####
CCC-002	Acarreo de material producto de cortes y excavaciones de terreno desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	47.2500	\$ 6.90	\$ 326.03	0.014%	\$ 6.45	\$ 304.76	-7%	0.016%	\$ 6.64	\$ 313.74	-4%	0.016%	\$ 6.63	\$ 313.27	-4%	####
39	Construcción de trinchera pluvial de 1.40 x 0.57 x 0.60 m (medidas interiores), a base de concreto Fc = 250 kg/cm ² , muros y losa de fondo de 15 cm de espesor armados con varilla de 10 mm (3/8") a cada 15 cm en ambos sentidos, rejilla de 1.52 x 0.61 m de placa de acero A36 de 3/4" de espesor perforada según diseño, contramazo de ángulo de 32 x 5 mm (1 1/4" x 3/16") con 4 anclas de ángulo de acero de 25 x 3 mm (1" x 3/8") de 7.5 cm de desarrollo, 5 mm empotrados a cada 50 cm en el muro en ambos lados colocados a cada 50 cm, con la adición de una solera de 3/16" x 2" (1.5 x 50 mm) soldada en la parte superior del travestajo para asentar rejilla, plantilla de concreto simple Fc=300 kg/cm ²	Pieza	8.0000	\$ 29,300.25	\$ 234,402.00	10.021%	\$ 25,007.43	\$ 200,059.44	-15%	10.221%	\$ 25,746.88	\$ 205,966.88	-12%	10.287%	\$ 25,723.51	\$ 180,786.08	-19%	####
			SUB-TOTAL: \$ 2,339,075.25			0.000%			\$ 1,957,382.38			\$ 2,005,180.32			\$ 1,883,576.14			
			IVA: \$ 274,252.04						\$ 313,177.89			\$ 320,886.65			\$ 317,374.19			
			TOTAL: \$ 2,713,327.28						\$ 2,270,560.34			\$ 2,327,145.97			\$ 2,300,946.32			

JALPA DE MÉNDEZ
 ING. ANGEL MARIOT RIVERA BOLON
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10109-05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINADO DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGOLES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %
LET-OBRA	REFINANCIA: Construcción de hierro aluavo a la obra, medidas de 2.84 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de pir de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de penencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2" dados de concreto f'c=150 kg/cm ² , de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primer rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pa.	1.0000	\$ 7,236.67	\$ 7,236.67	5.700%	\$ 7,566.92	5%	\$ 7,566.92	\$ 7,786.88	6.192%	\$ 7,772.16	7%	\$ 7,772.16	6.134%
CCC-093	Trabajos previos Trazo y nivelación en caminos o valadizos existentes con aparatos topográficos	m ²	240.0000	\$ 7.64	\$ 1,853.60	1.444%	\$ 6.93	-9%	\$ 1,663.20	\$ 1,713.60	-7%	\$ 1,711.20	-7%	\$ 1,711.20	1.351%
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con corbata de hierro de diamante hasta 5 cm de profundidad	m ³	760.1123	\$ 27.07	\$ 20,578.05	10.202%	\$ 21.76	-20%	\$ 16,542.22	\$ 17,036.36	-17%	\$ 17,005.95	-17%	\$ 17,005.95	13.422%
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico por medios mecánicos, incluye: aplicación del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ²	3.6000	\$ 221.99	\$ 799.16	0.625%	\$ 199.35	-15%	\$ 681.86	\$ 701.75	-12%	\$ 567.76	-20%	\$ 567.76	0.448%
CCC-136	Sondeo para localización de instalaciones existentes (agua potable, teléfonos, etc.), incluye: detector de metales, equipo mecánico, herramientas y mano de obra.	sondeo	3.0000	\$ 949.27	\$ 2,848.81	2.243%	\$ 868.26	-9%	\$ 2,604.78	\$ 2,681.67	-6%	\$ 2,676.80	-6%	\$ 2,676.80	2.113%
CCC-395	Excavación con herramienta manual en cepas, en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad.	m ³	30.0000	\$ 152.07	\$ 4,562.10	3.813%	\$ 138.39	-10%	\$ 4,151.70	\$ 4,180.20	-9%	\$ 4,266.90	-7%	\$ 4,266.90	3.969%
CCC-651	Suministro y fricción manual de arena para cana en excavaciones, para alisar tuberías hidráulicas o sanitarias, compactado con equipo (ballarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	24.0000	\$ 362.56	\$ 8,701.44	6.851%	\$ 285.51	-21%	\$ 6,852.24	\$ 7,054.56	-19%	\$ 7,042.32	-10%	\$ 7,042.32	5.556%
RELLE/IM-EXC	relleno y compactado con equipo (ballarina) con material producto de excavación, en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	74.0000	\$ 80.22	\$ 5,936.28	4.674%	\$ 84.71	6%	\$ 6,268.54	\$ 6,453.54	8%	\$ 6,441.70	9%	\$ 6,441.70	5.084%
ATRAQUE/2-3	Construcción de atraque de concreto simple f'c= 150 kg/cm ² con agregado max. 3/4", para tuberías de 2" a 3" con dimensiones de 20 x 20 x 35 cm incluye: colado, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa.	10.0000	\$ 69.91	\$ 699.10	0.550%	\$ 60.54	-1%	\$ 685.40	\$ 715.90	2%	\$ 714.80	2%	\$ 714.80	0.504%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"

LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10109.-05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINADO DOMINGUEZ ANGULO			HEBER SAMUEL RIVERA VALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES							
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %			
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ³ .	3.6000	\$ 44.67	\$ 160.81	0.127%	\$ 88.60	-45%	\$ 24.01	\$ 25.32	\$ 91.15	-43%	\$ 25.28	\$ 91.01	-43%	\$ 25.28	\$ 91.01	-43%	0.072%
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	3.6000	\$ 17.93	\$ 64.55	0.051%	\$ 60.30	-7%	\$ 16.75	\$ 17.24	\$ 62.06	-4%	\$ 17.22	\$ 61.98	-4%	\$ 17.22	\$ 61.98	-4%	0.049%
CCC-175	Acarreo de material producto de demolición desde el kilómetro 2 hasta el kilómetro 20 sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	3.6000	\$ 6.90	\$ 24.84	0.020%	\$ 23.22	-7%	\$ 6.45	\$ 6.64	\$ 23.00	-4%	\$ 6.63	\$ 23.87	-4%	\$ 6.63	\$ 23.87	-4%	0.019%
8005 04	Línea de conducción Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. RD-26, según precios de lista... De 75 mm. (3") de Ø. Incl. Materiales puestos en obra, fijado, grava vegetal, manobras, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	400.0000	\$ 103.01	\$ 41,204.00	32.439%	\$ 43,184.00	5%	\$ 107.86	\$ 103.87	\$ 41,588.00	1%	\$ 108.30	\$ 43,720.00	6%	\$ 108.30	\$ 43,720.00	6%	34.530%
INTERC 3X3	conexiones Interconexión a la red existente y suministro y colocación de tee de pvc hidráulico de 76 mm y 76 mm (3"x3") de diámetro clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 y NMX-E145/J-CNCP-2014, incluye: cortes, grava vegetal y herramientas necesarias, mano de obra, materiales, mano de obra, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pta.	4.0000	\$ 414.31	\$ 1,657.24	1.305%	\$ 3,098.88	87%	\$ 774.72	\$ 787.59	\$ 3,100.38	93%	\$ 796.17	\$ 3,184.68	92%	\$ 796.17	\$ 3,184.68	92%	2.478%
JUNTA G 3	COMPLETAS DE: 76 mm (3") de Ø incl.: materiales, mano de obra, equipo herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pta.	3.0000	\$ 542.26	\$ 1,626.78	1.291%	\$ 1,702.59	5%	\$ 587.53	\$ 584.29	\$ 1,752.87	8%	\$ 583.24	\$ 1,740.72	8%	\$ 583.24	\$ 1,740.72	8%	1.381%
COD RD26 45-3	Suministro e instalación de codo de 45° de pvc hidráulico de 76 mm (3") de diámetro clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 y NMX-E145/J-CNCP-2014, incluye: cortes, grava vegetal y herramientas necesarias, mano de obra.	pta.	8.0000	\$ 219.04	\$ 1,752.32	1.380%	\$ 2,766.48	58%	\$ 345.81	\$ 356.03	\$ 2,848.24	63%	\$ 355.98	\$ 2,843.04	62%	\$ 355.98	\$ 2,843.04	62%	2.212%
RD-3 CODLE REP	Suministro e instalación de cople de reparación de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COMAGUA-2011 y NMX-E145/J-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grava vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	pta.	3.0000	\$ 204.92	\$ 614.76	0.484%	\$ 659.43	7%	\$ 219.81	\$ 228.20	\$ 678.87	10%	\$ 225.89	\$ 677.87	10%	\$ 225.89	\$ 677.87	10%	0.527%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: 10109.-05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			AMINADAD DOMINGUEZ ANJULO			HEBER SAMUEL RIVER VALNCIA			MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLS								
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %		
TOBA 3X1/2	Suministro e instalación de toma domiciliar de agua potable a base de 1 hidrónimo de 76 x 13 mm (3" x 1/2") de diámetro, 5 m de poliducto hidráulico Cvd 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga roca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 nigle espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 horquillas sifón de 13 mm (1/2")	pta.	1.0000	\$ 516.44	\$ 516.44	0.407%	-16%	\$ 435.78	0.348%	\$ 448.65	-13%	\$ 447.83	-13%	\$ 447.83	\$ 20,385.13	0.357%	\$ 447.83	-13%	\$ 20,385.13	0.353%
CAJA 2	Caja de operación de válvula	pta.	1.0000	\$ 19,717.01	\$ 10,717.01	15.523%	1%	\$ 19,845.68	15.889%	\$ 20,431.68	4%	\$ 20,431.68	4%	\$ 20,431.68	\$ 20,385.13	16.242%	\$ 20,385.13	3%	\$ 20,385.13	16.097%
P-8055 A 04	suministro e instalación de cremallera campana de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E14571-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	Pieca	1.0000	\$ 365.69	\$ 365.69	0.289%	95%	\$ 713.95	0.571%	\$ 735.04	101%	\$ 735.04	101%	\$ 735.04	\$ 733.72	0.864%	\$ 733.72	101%	\$ 733.72	0.579%
P-8055 A 04	suministro e instalación de espiga de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E14571-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	Pieca	1.0000	\$ 352.69	\$ 352.69	0.278%	66%	\$ 586.23	0.469%	\$ 603.53	71%	\$ 603.53	71%	\$ 603.53	\$ 602.46	0.480%	\$ 602.46	71%	\$ 602.46	0.475%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-001-23

OBRA: I0109.-050000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO				HEBER SAMUEL RIVER VALINCA				MIGUEL ANGEL RIVERA ANGELES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2160.00.05	Suministro e instalación de válvula de compuerta de vástago filo de 75 mm (3") de diámetro modelo W118F marca walworth o similar en características y calidad con las siguientes características: diseño de acuerdo a MSS SP-70, clase 125. Vástago filo construcción de hierro fundido. Diseño iterallado de operación por volante. Dimensiones de cara a cara de acuerdo con ANSI B16.10 barrado de bridas de acuerdo a ANSI B16.1. 125 PSI (8.6 BAR) vapor saturado @ 357° (178 CI, 280 PSI (13.8 BAR) vapor saturado de agua en filo @ 207° (-29°) a 1307° (69°), incluye: materiales mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.0000	\$ 5,028.10	\$ 5,028.10	3.959%	\$ 4,318.44	-14%	3.453%	\$ 4,448.01	-12%	3.537%	\$ 3,402.85	-32%	2.880%			
EMP-NEO-3	Suministro e instalación de empaque de neopreno de 3" incl: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	2.0000	\$ 40.39	\$ 80.78	0.064%	\$ 45.81	13%	0.073%	\$ 40.85	16%	0.075%	\$ 48.86	16%	0.074%			
8018.00.01	Suministro e instalación de tornillos de cabeza hexagonal / fuerza de: 5/8" x 2 1/2" φ. Incl: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	16.0000	\$ 39.10	\$ 625.60	0.482%	\$ 28.81	-26%	0.369%	\$ 20.87	-24%	0.377%	\$ 20.81	-24%	0.374%			
			SUB-TOTAL:	\$ 137,018.52			\$ 125,082.42			\$ 125,708.14			\$ 126,700.98					
			INVENTARIO:	\$ 20,322.88			\$ 20,127.86			\$ 20,127.86			\$ 20,272.15					
			TOTAL:	\$ 147,341.40			\$ 145,072.40			\$ 145,836.00			\$ 146,973.13					

EL JEFE DE OBRA

ING. ANGELO MARCO RIVERA ANGELES

JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 13 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)


I0108.- 05000509:	Presupuesto Base con I.V.A.	\$	2,339,075.25
-------------------	--------------------------------	----	--------------

I0109.- 05000510:	Presupuesto Base con I.V.A.	\$	147,341.48
-------------------	--------------------------------	----	------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 08:30 hrs. del día Martes, 13 de Junio de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:



Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

- 1.- AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
- 2.- HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
- 3.- MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS

I0108.- 05000509

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$1,957,362.36	70 Días Naturales
2.-	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$2,006,160.32	70 Días Naturales
3.-	MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$1,983,576.14	70 Días Naturales

I0109.- 05000510

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
0	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$125,062.42	30 Días Naturales
0	HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$125,799.14	30 Días Naturales
0	MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$126,700.96	30 Días Naturales

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Lunes, 19 de Junio de 2023. a las 08:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Por los Invitados

C. Adelfo Morales Palma
Representante de la secretaría de la función Pública del Estado

Firma

Por los Licitantes / Representante

C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

Firmas



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23

Descripción de la obra: I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
POR LOS LICITANTES**

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	<i>Aminadad Domínguez Angulo</i>	<i>[Signature]</i>
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	<i>Miguel Ángel Rivera Angles</i>	<i>[Signature]</i>
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	<i>Heber Samuel Rivera Valencia</i>	<i>[Signature]</i>





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ



2023
AÑO DE FRANCISCO
EL REINALCA EN LA SIERRA DEL TABASCO

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a lunes, 19 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	2,339,075.25

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas


I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$	2,339,075.25
Rango de Evaluación		
A).- Monto Máximo		\$2,006,160.32
B).- Monto Mínimo		\$1,957,362.36





Diferencia (A - B): \$ 48,797.96
 De donde: 1 X \$ 2,006,160.32 ÷ 10 : \$ 200,616.03
 De donde: \$ 48,797.96 Menor que < \$ 200,616.03

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 1,957,362.36	Se considera solvente
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 2,006,160.32	Se considera solvente
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 1,983,576.14	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	martes, 30 de mayo de 2023
Visita de Obra	lunes, 5 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 6 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	martes, 13 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

V.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 1,957,362.36
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 2,006,160.32
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 1,983,576.14

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y al antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Representada Legalmente por: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.


V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

lunes, 19 de junio de 2023

Elaboro
C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma



Página 3 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	127,018.52

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$	127,018.52
Rango de Evaluación		
A).- Monto Máximo		\$126,700.96
B).- Monto Mínimo		\$125,062.42

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Diferencia (A - B): \$ 1,638.54

De donde: 1 X \$ 126,700.96 ÷ 10 : \$ 12,670.10

De donde: \$ 1,638.54 Menor que < \$ 12,670.10

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 125,062.42	Se considera solvente
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 125,799.14	Se considera solvente
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 126,700.96	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	martes, 30 de mayo de 2023
Visita de Obra	lunes, 5 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 6 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	martes, 13 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 125,062.42
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA	\$ 125,799.14
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	\$ 126,700.96

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y al antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Representada Legalmente por: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

7.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

lunes, 19 de junio de 2023

Elaboro
C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Página 3 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. 10109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 08:00 hrs. del día Lunes, 19 de Junio de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 08:00 hrs. DEL Lunes, 19 de Junio de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-001-23 RELATIVO AL PROYECTO: 10108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Página 1 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
10108.- 05000509		
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	70 Días Naturales	\$ 1'957,362.36 (Un Millón Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Sesenta y Dos Pesos 36/100 M.N.)

10109.- 05000510		
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	30 Días Naturales	\$ 125,062.42 (Ciento Veinticinco Mil Sesenta y Dos Pesos 42/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023
Descripción de la obra:	I0108.- 05000509.- Construcción de red de drenaje sanitario, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023
Descripción de la obra:	I0109.- 05000510: Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 0.00 %. (CERO POR CIENTO).

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO PARA EL Jueves, 22 de Junio de 2023. A LAS 09:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

6. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Jueves, 22 de Junio de 2023.

LAS 14:40 HRS. EN EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOOTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 08:39 hrs. DEL DÍA Lunes, 19 de Junio de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

C. Mtro. Cristian David Coronel Santos
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Por los Licitantes / Representante

C. ING. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

C. HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA
HEBER SAMUEL RIVERA VALENCIA

C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

Firmas





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0109.- 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K002.- Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable.

LA PRESENTE OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON EL TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, SONDEO DE LINEAS, EXCAVACION EN ZANJAS CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON EQUIPO MECANICO DONDE SE REQUIERA, PLANTILLA DE ARENA, TUBERIAS DE PVC DE 3" DE DIAM, CAJA DE OPERACION DE VALVULAS E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE A LA RED PUBLICA,

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 7 de abril de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a 07-abr-23

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental


Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra 05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10109	05000510.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, calle Santos Degollado.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	400 ML.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 147,341.48

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO

ADAN CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C.: DOAA6201315E8
 R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD: CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO: CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-093

Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos

m².

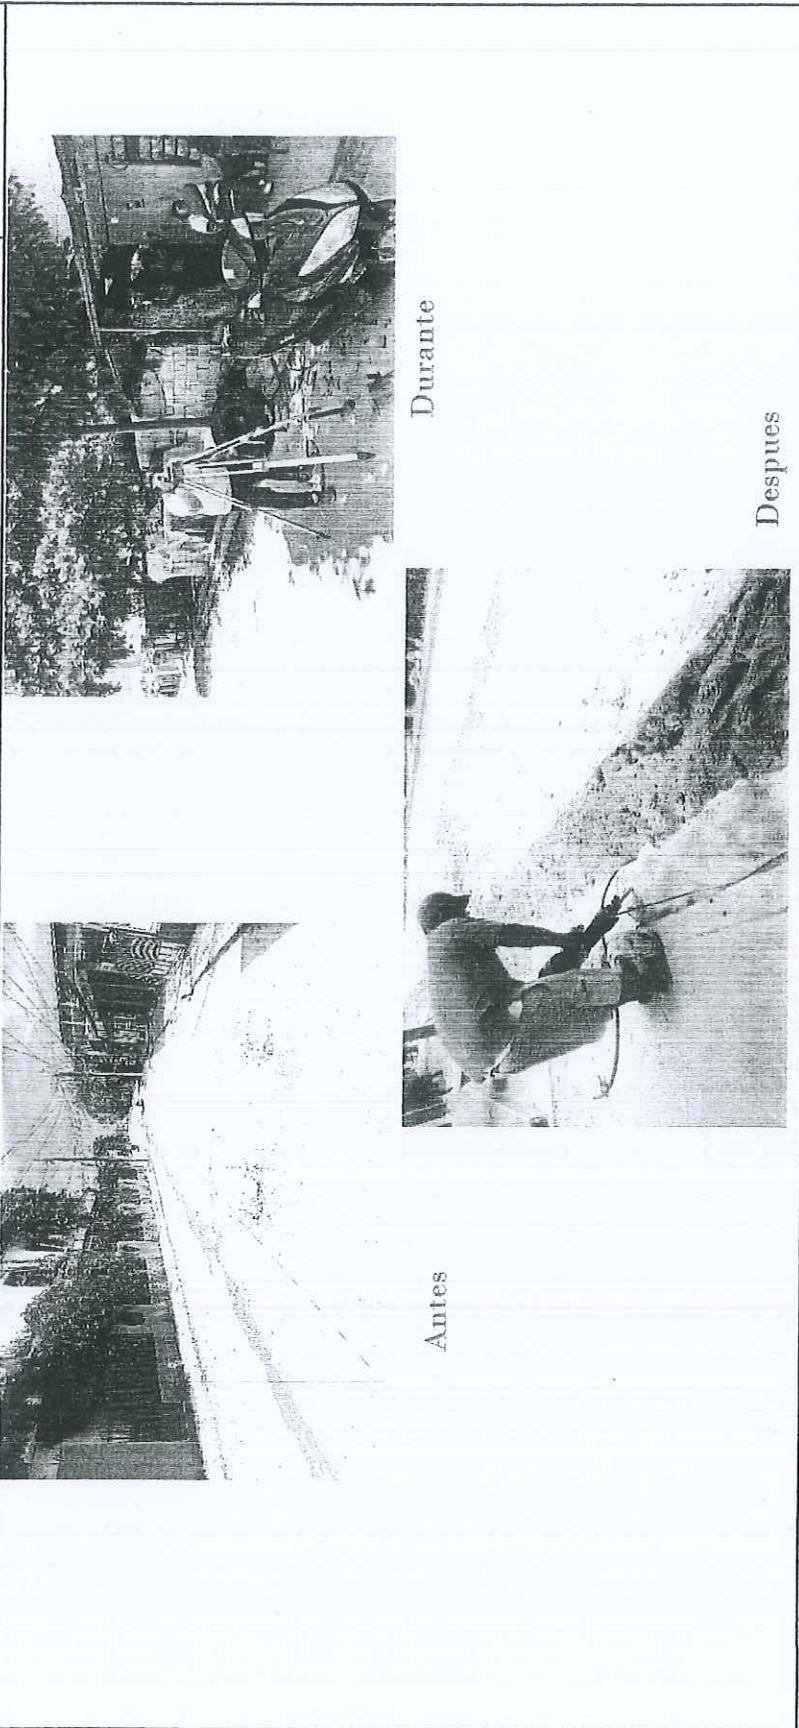

FORMULADO:
 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

1 DE 14

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10'109.- 050000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C.: DOAA6201315E8
R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

RED DE AGUA POTABLE


CCC-022 Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad m².

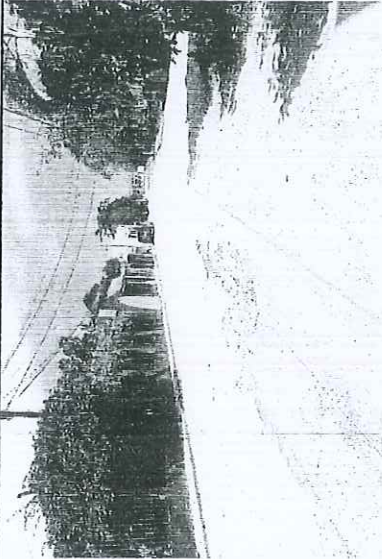

Antes

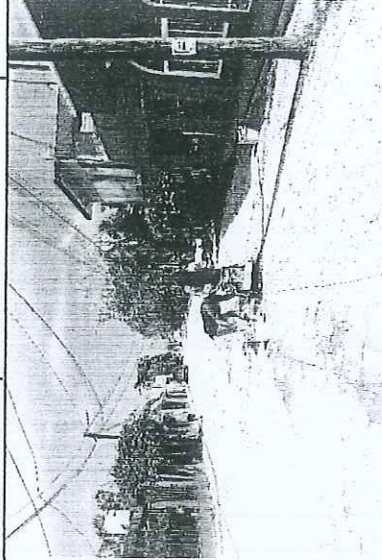

Durante

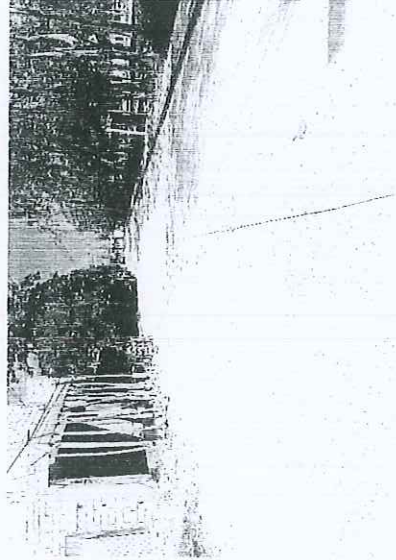

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

2 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEBIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023



ALBUM FOTOGRAFICO

ADAN CONSTRUCCIONES

CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490

RED DE AGUA POTABLE

CCC-651 Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bailarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M. **m2**

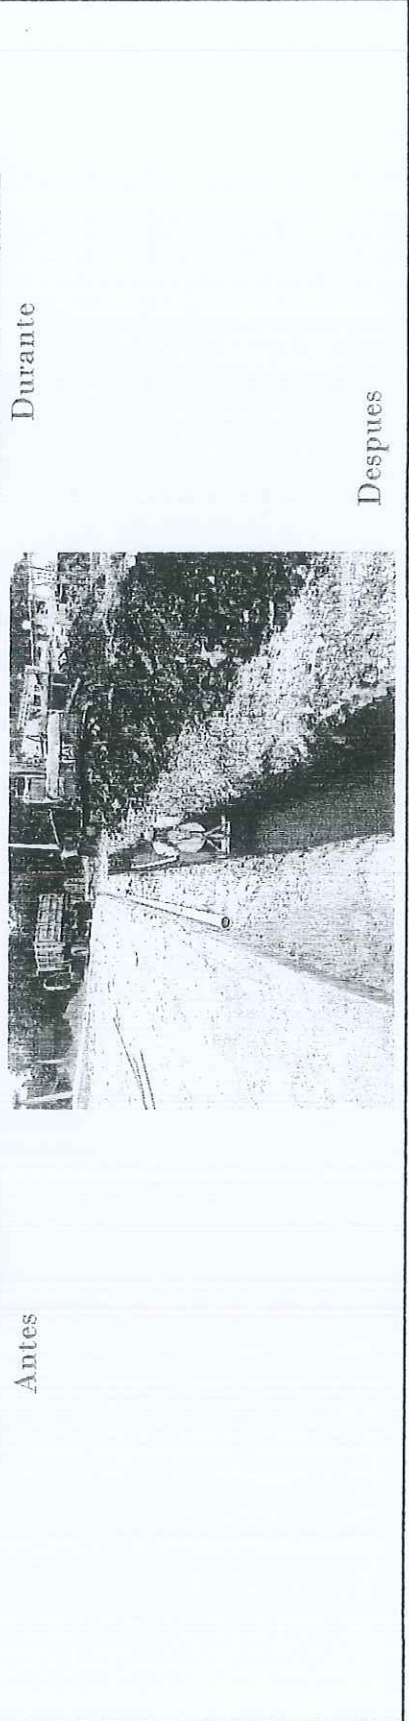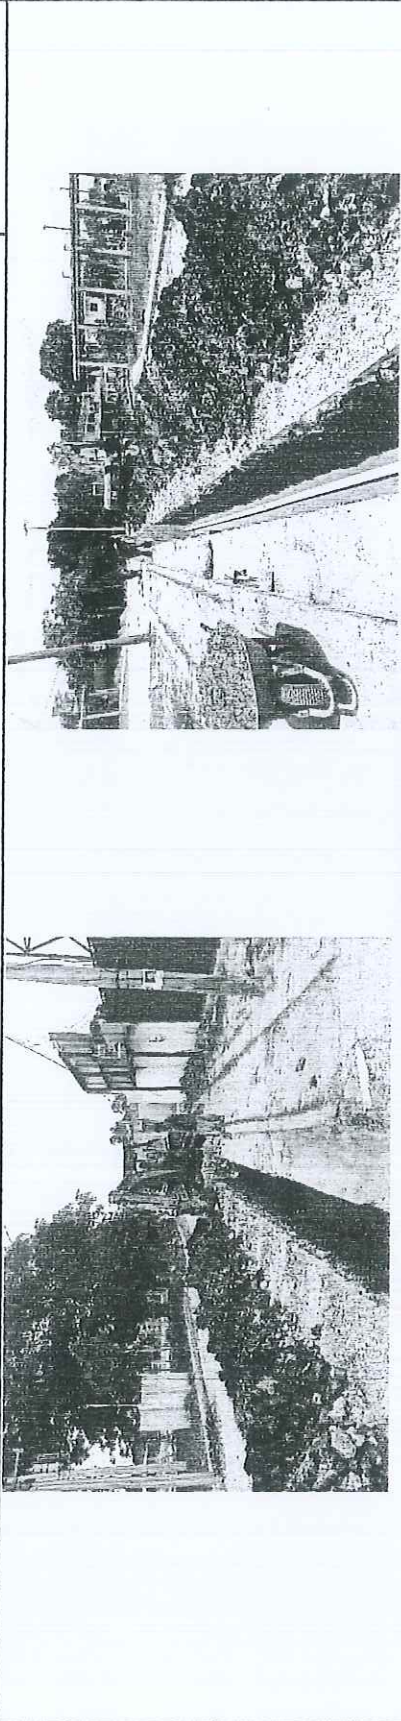

FORMULO:

ING. DENIS DE JESÚS GARCÍA GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

3 DE 14

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10109.- 050000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490


RED DE AGUA POTABLE

LINEA DE CONDUCCION


8005 04 Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. RD-26, según precios de lista... De 75 mm. (3") de Ø. Incl. Materiales puestos en obra, lijado, grasa vegetal, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución. ml.

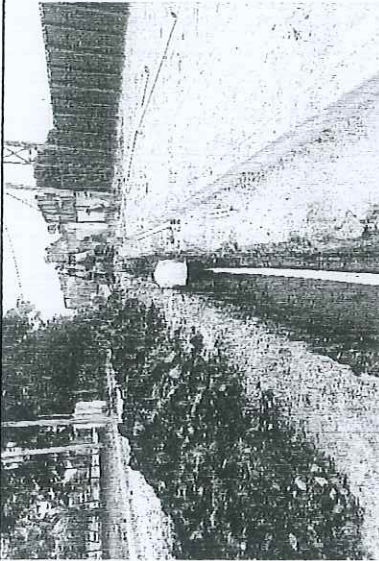

Antes

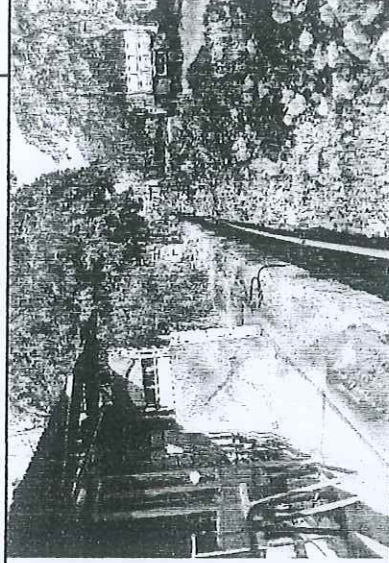

Durante

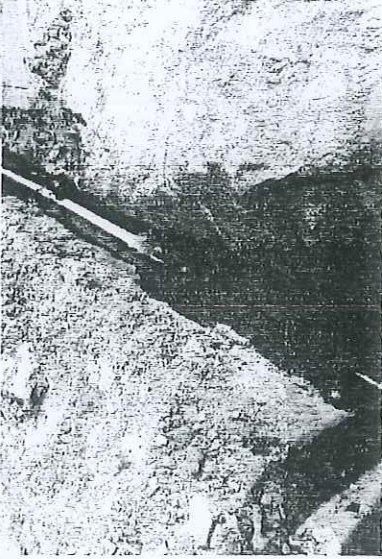

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

4 DE 14

REVISO:
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ-JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 050000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C.: DOAA6201315E8
R.U.C.T.: SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490

RED DE AGUA POTABLE


CONEXIONES

INTERC 3X3 clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014, incluye: cortes, grasa vegetal y herramientas necesarias, mano de obra.

pza.



Durante

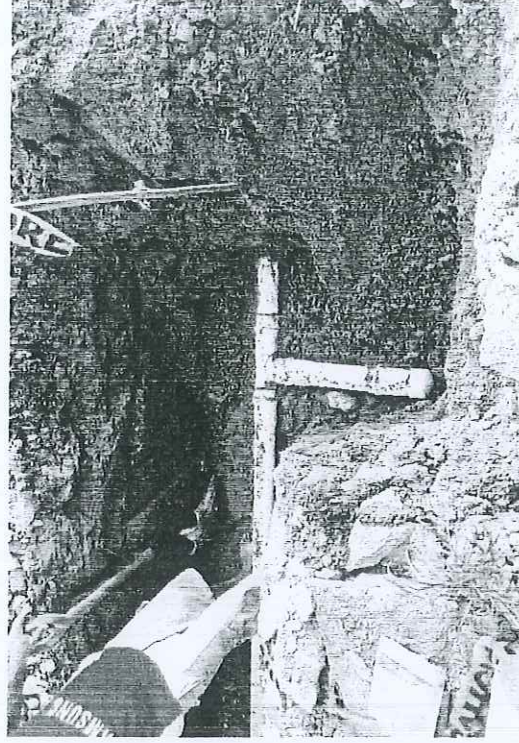

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

5 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0109.-05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATISTA: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

R.F.C.: DOAA6201315E8

R.U.C.T.: SFP-RUC-04168


LOCALIDAD: CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO

MUNICIPIO: CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


ALBUM FOTOGRAFICO




OD RD26 45: Suministro e instalación de codo de 45" de pvc hidráulico de 76 mm (3") de diámetro clase RD-26 que cumpla con la NOM- pza.

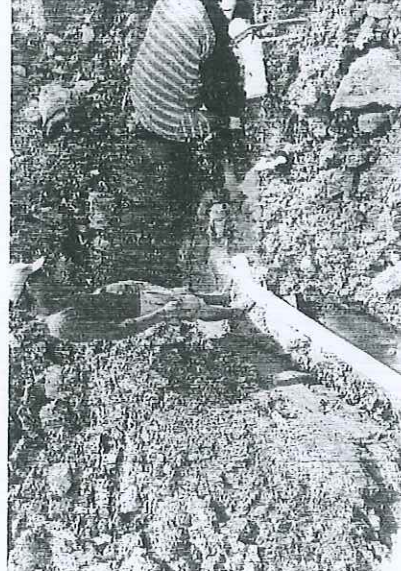

Antes

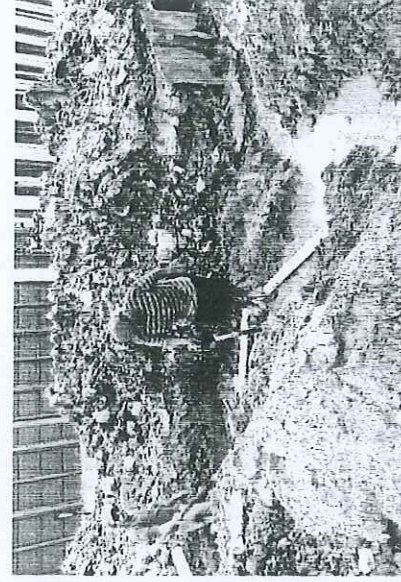

Durante

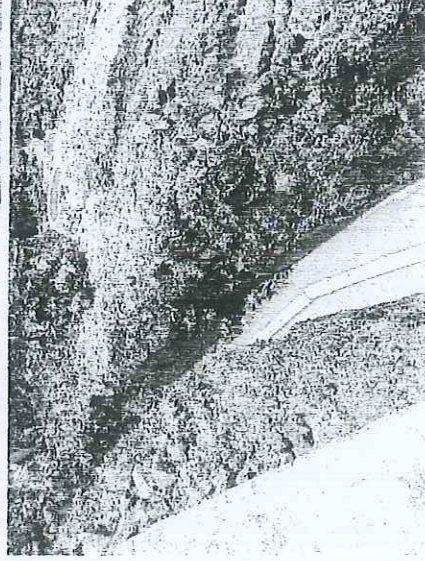

Despues

FORMULO:

[Signature]

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

[Signature]

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P.: 86490


RED DE AGUA POTABLE

CANTIDADES ADICIONALES


CCC-103 Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, M3

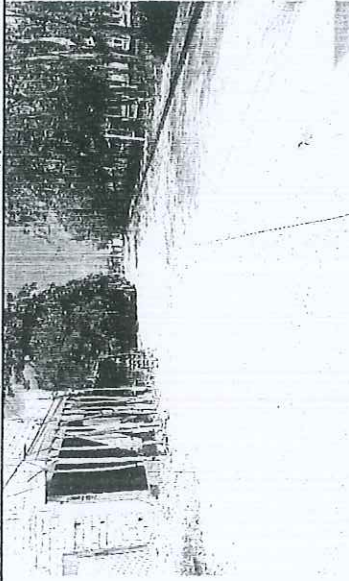

Antes

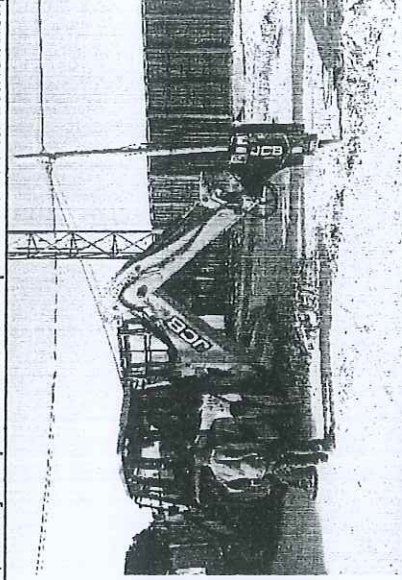

Durante

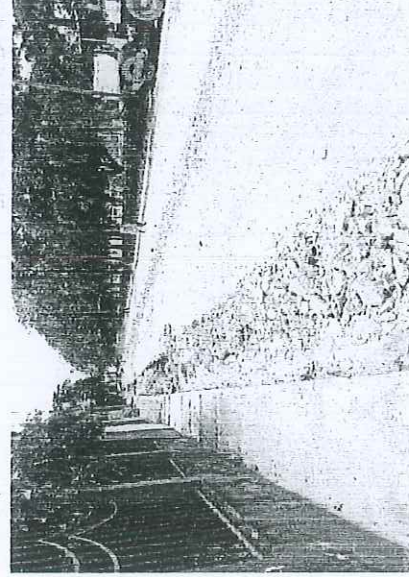

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

7 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490


RED DE AGUA POTABLE

CCC-105 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones


ml.

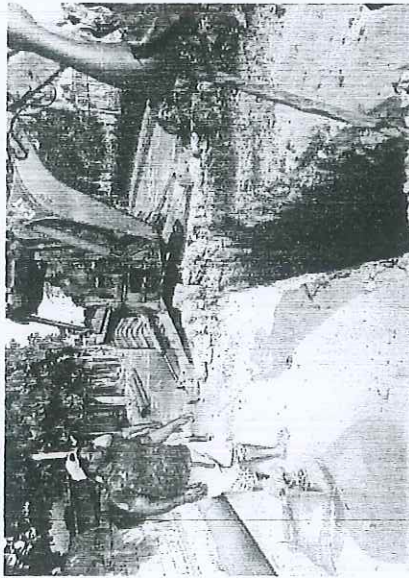

Antes

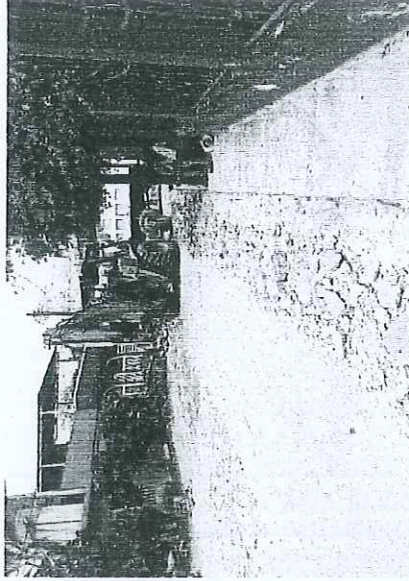

Durante

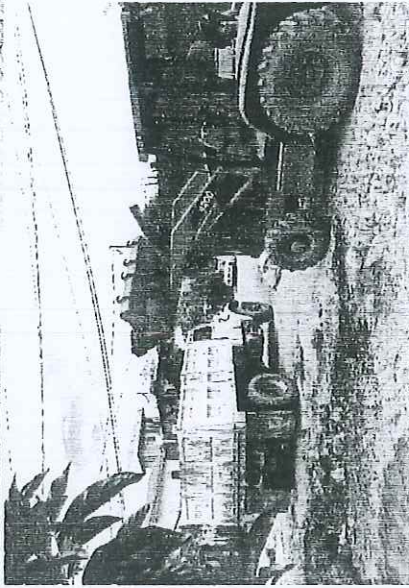

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

8 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEBIO JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 050000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

RED DE AGUA POTABLE


CCC-017 Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de ml.

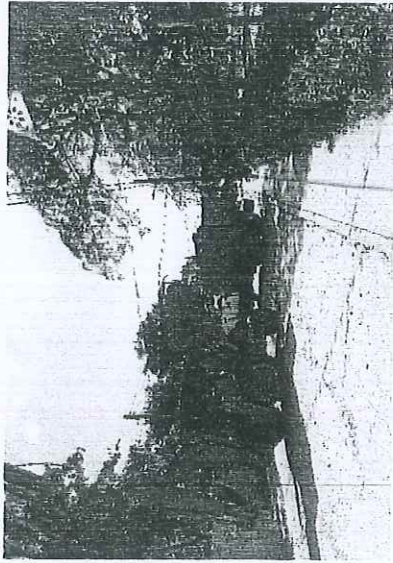

Antes

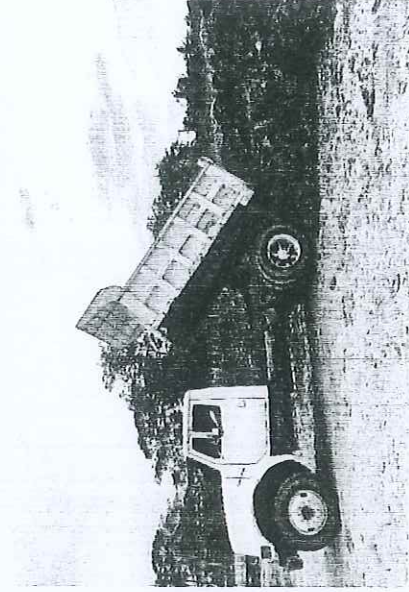

Durante

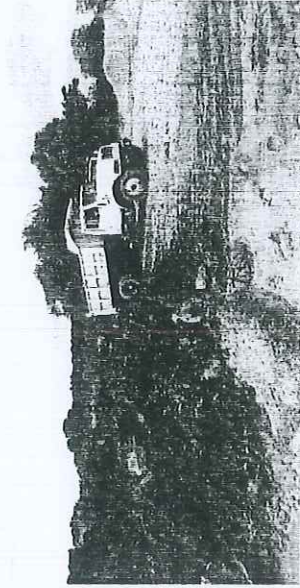

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
 R.F.C. : DOAAG201315E8
 R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
 LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
 MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO, C.P.: 86490


DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
 LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023
 MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

RED DE AGUA POTABLE


TOMA 3X1/2 Suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable a base de 1 hidrótoma de 76 x 13 mm (3" x 1/2") de diámetro, pza.

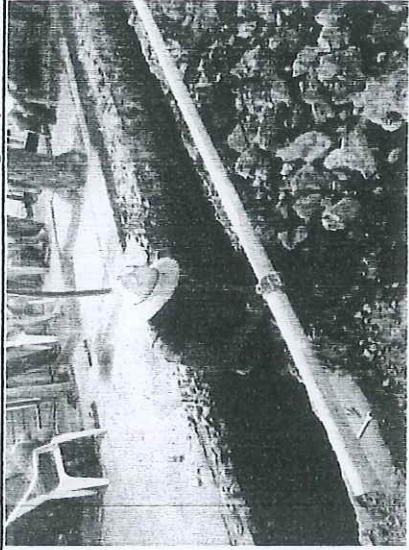

Antes

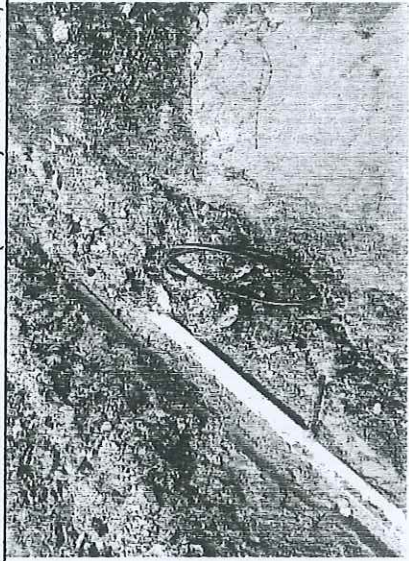

Durante

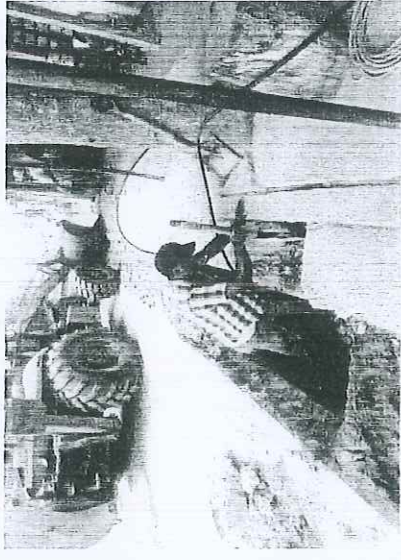

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

10 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 050000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGUILO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490


RED DE AGUA POTABLE

CONCEPTOS NO PREVISTOS


C.N.P.-01 Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad. m².

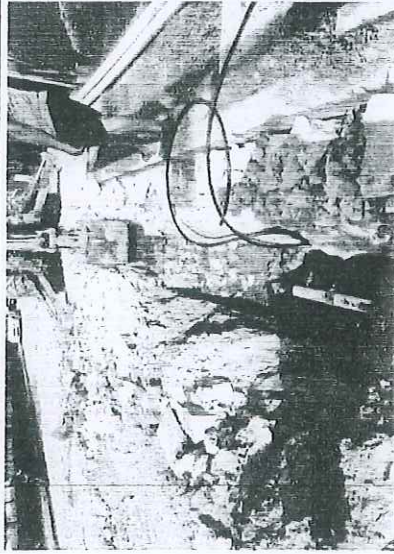

Antes

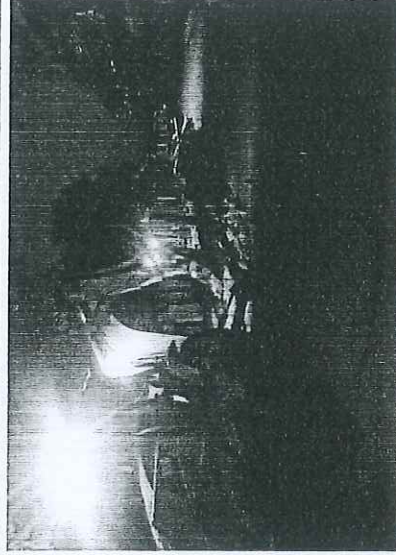

Durante

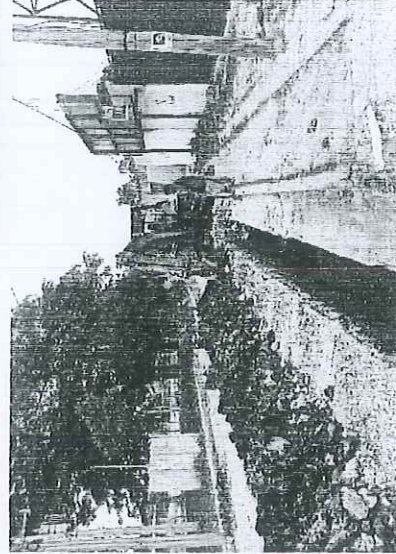

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

11 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ-JIMENEZ
SUPERVISOR-DE-OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAIMPO
MUNICIPIO : Cárdenas, TABASCO, C.P.: 86490


RED DE AGUA POTABLE

C.N.P.-03 Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno


ml.

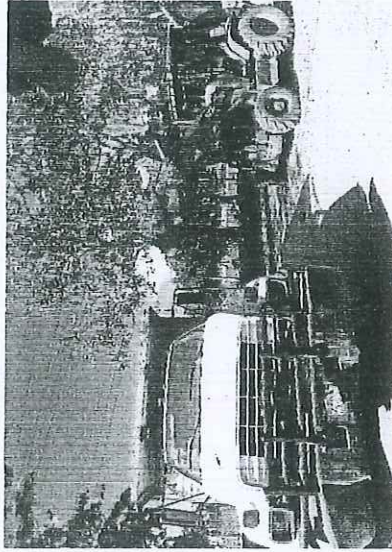

Antes

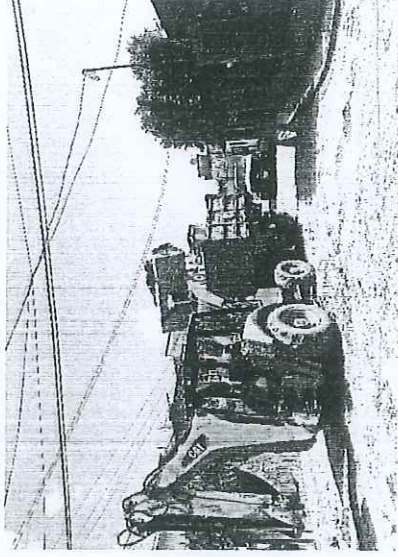

Durante

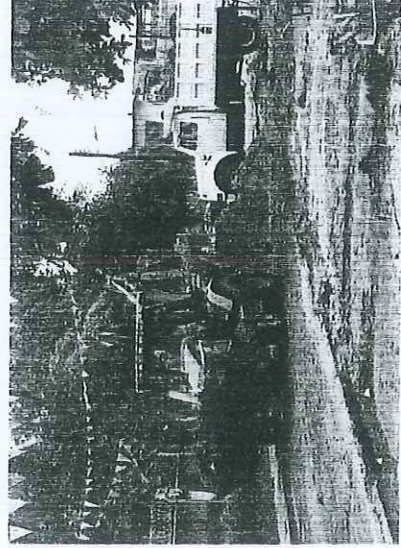

Despues

FORMULO:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

13 DE 14

REVISO:

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


ALBUM FOTOGRAFICO




CONTRATISTA : AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
R.F.C. : DOAA6201315E8
R.U.C.T. : SFP-RUC-04168
LOCALIDAD : CERRADA SAN PEDRO NO. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
MUNICIPIO : CÁRDENAS, TABASCO. C.P. : 86490

RED DE AGUA POTABLE


C.N.P-04 Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la pza.

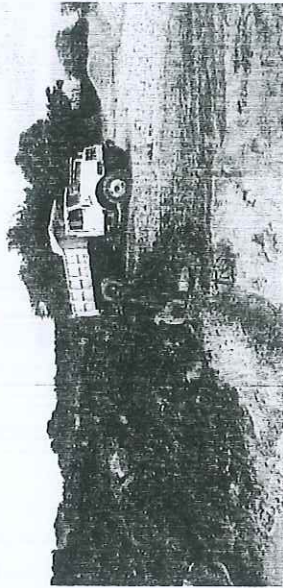

Antes

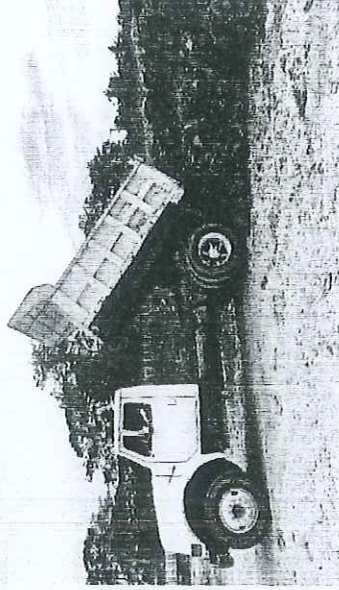

Durante



Despues

FORMULO

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

14 DE 14

REVISO:
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ-JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

Fecha:

No.

Con esta fecha y en cumplimiento al Art. 95 del Reglamento de obras públicas y Servicios relacionados con la misma del Estado de Tabasco, se abre la presente bitácora de obra referente a los trabajos.

10109.-05000510. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

LOCALIDAD 0001. CD. JALPA DE MENDEZ

OBRA TRABAJOS.- 10109.-05000510. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

PROYECTO NUMERO: 10109.-05000510

Nº DE CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

PROGRAMA: 4002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

FECHA DE INICIO: 26 JULIO 2023

FECHA DE TERMINO: 25 JULIO 2023

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA

MONTO CONTRATADO: \$ 145 072.41 ** (CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 48/100 M.N.) ** INCLUYE I.V.A

IMPORTE DEL ANTICIPO: 0.00 ** (CERO PESOS 00/100 M.N.) INCLUYE I.V.A

META: 400.00 ML

Fecha:

No.

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: AMINADAD DOMINQUEZ ANGULO

DOMICILIO: CALLEADA SAN PEDRO N. 2 COL. MELCHOR OCAMPO
CADENAS TABASCO C.P. 86490

REG. FED DE CASANTES: DOAAG201315E8

REG. I.M.S.S E74422540103

REG. INFONAVIT E74422540103

REG. PADRON DE CONTRATISTA: SEP-RUC-04168

NOMBRE DE LA AFIAZADORA:

No DE POLIZA DE LA FIANZA DE ANTICIPO:

No DE TELEFONO:

DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

NOMBRE: Denis de Jesus Garcia Garcia

PROFESION: ING CIVIL

DIRECCION: CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE #13 COLONIA CENTRO,
VILLA BENITO JUÁREZ MAGSPANIA

CEDULA: 8713477

No DE CELULAR: 936 128 29 95

CORRE ELECTRONICO: ing.denisgarcia@gmail.com

Fecha:

No.

DATOS DEL RESIDENTE DE LA DDO-TSM

NOMBRE: Carlos Remedio Jiménez Jiménez

PROFESION: ING. Civil

DIRECCION: R/a. Pueblo Viejo, Jalpa de Méndez

CEDULA PROFESIONAL: 12558273

N. DE CELULAR: 914-279-39-54

CORREO ELECTRONICO: Carlos-R-J @ Live.com.mx

NOTA DE VALIDACION

ESTA BITÁCORA DE OBRA SERA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE FORMAN EL CONTRATO NO. CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

1. SE REGISTRAN POR AMBAS PARTES TODOS LOS ASUNTOS Y CUENTAS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

2. LA SIGUIENTE BITÁCORA QUEDA SOBRE EL RESGUARDO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA CONTRATANTE Y EL HORARIO PARA CONSULTA Y ASENTAR LAS NOTAS DE BITÁCORA SERA DE LAS 8:00 HRAS A LAS 16:00 HRAS

3. LA FIRMA Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MISMAS DEBERAN SER CON UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS, ACORDANDO QUE EN CASO DE VENCER EL PLAZO PARA LA FIRMA DE LA NOTA, SE DARA POR ACEPTADA LA O LAS NOTAS REFERIDAS, LAS NOTAS PODRAN SER RETIRADAS HASTA QUE ESTEN COMPLETAS Y FIRMADAS O EN SU CASO VENCIDO EL PLAZO DE LA FIRMA, SE ENTALIZA LA PROHIBICION DE MODIFICAR LAS NOTAS FIRMADAS.

4. LOS PLAZOS PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACION Y NUMEROS GENERADORES, SE HARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO A LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO "FORMA DE PAGO" DEBIENDO EL CONTRATISTA PRESENTAR LA ESTIMACION DENTRO DE LOS SEIS (6) DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE CORTE ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 54 DE LA

Fecha:

No.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.

5. LA CONTRATISTA SÓLO PODRÁ EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

6. EL CONTRATISTA DEBE ACEPTAR LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

Fecha:

26/06/2023

No.

01

NOTA No. 1

CONTRATO No CTO-MIAL DOOTSM-031-2023

CON FECHA 26 JUNIO DE 2023 SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO,

ESTANDO PRESENTE EL INQ. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA SUPERINTENDENTE POR PARTE DE LA CONTRATISTA EL INQ. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ, POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO SE REALIZA UN RECORRIDO POR LA OBRA, PARA VALORAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA DE PROYECTO Y VERIFICAR EL INICIO A LOS TRABAJOS QUE SE HAN EN PROYECTO.


SE REALIZA EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TOPOGRAFICO, SE INICIA CON EL CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, SE INICIA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL CONCRETO HIDRAULICO

SE INICIA CON LA CARGA Y EL ACARRIO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION AL LUGAR INDICADO.

CON ESTA FECHA SE SOLICITA LA APROBACION C.F.P. 001, RELLENO EN ZANJA DE EXCAVACION CON MATERIA DE BANCO (ARENA).

INQ. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA INQ. CARLOS REMEDIO JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION JIMENEZ

RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM





Fecha: 27/06/2023

No. 02

NOTA No 2

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023
 SE INICIA ACTIVIDADES, CON LA CARGA Y ACARreo DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, AL LUGAR INDICADO, SE INICIA LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA RD-20 3", SE CONTINUA CON EL TENDIDO DE LA CAMA DE ARENA, PARA POS-TERIORMENTE SEGUIR CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3", SE INICIA CON LA COLOCACION DE LAS HIDRANTOMAS, A BASE (ABRAZADERAS 3" DIAMETRO, INSER-SENTOR DE BROCE DE 1/2, POLIDUCTO HIDRAULICO CEBULA 80 DE 1/2" NIPLES DE 1/2" Y ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2"), SE CONTINUA CON EL RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA.


 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



 ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
 RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA No 3

Fecha 28/06/2023

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, QUE CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3", CONTINUAMOS CON LA CARGA Y ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA A LO ANCHO DE EXCAVACION, INSTALACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 3"φ, INSTALACION DE LAS HIDRANTOMAS, ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA.


 ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


 ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
 RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.

Fecha: 29/06/2023

No. 03

Nota N. 4

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL CORTE DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y EL ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, A LO ANCHO DE LA EXCAVACION, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO, CONTINUAMOS CON LA COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 120 CM DE ES-PESOR.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

RESIDENTE DE LA DOOTSM.

Nota No 5

Fecha 30/06/2023

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

EL DIA DE HOY INICIAMOS LABORES CON LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA, CONTINUAMOS CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA A LO ANCHO DE LA EXCAVACION, SEGUIMOS CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE ASUA RD-26 3" DE DIAMETRO, SE COLOCAN LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA Y RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

Fecha: 01/07/2023

No. 04

Nota: N. 6


CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON LA CARGA Y ACARreo DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION. AL LUGAR INDICADO POR EL RESIDENTE DE OBRA.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3"φ, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, A LO ANCHO DE LA EXCAVACION, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3" RD-ZE INSTALACION DE LAS HIDROTOMAS Y ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA, RELLENO CON ARENA EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.


NOTA: No 7

FECHA 03/07/2023


CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

SE INFORMA QUE SE COLOCA UNA PIEZA TEE DE 3"φ Y UN TAPON CAMDANA DE 3" DE φ EN CALLE SON PARA FUTURA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN CALLE SON SIN NOMBRE

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3"φ, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3"φ, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), EN ZALIA DE EXCAVACION.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.

Fecha: 05/07/2023

No. 05

NOTA No 8

CONTRATO No: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CORTE DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICION

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3" DE DIAMETRO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ
JIMENEZ

RESIDENTE DE OBRA DELA DOOTSM.

NOTA No 9

FECHA 07/07/2023

CONTRATO No: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA RD-26 DE 3", SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA A LO ANCHO DE EXCAVACION, INSTALACION DE TUBERIA DE 3", INSTALACION DE HIDROTOMAS SE CONTINUA CON EL ACOSTILLAMIENTO Y RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION CON ARENA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ
JIMENEZ

RESIDENTE DE OBRA DE DOOTSM.

Fecha: 10/07/2023

No. 06

NOTA: 10

CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRAS, LA APROBACION PARA LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES, EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

CCC-103 RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: APILG DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CCC-395 EXCAVACION CON HERRAMIENTA MANUAL EN CEPAS, EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD.

CCC-013 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINOS DE TERRACERIA, TANIFA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.

CCC-105 CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES.

TOMA 3X 1/2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE A BASE DE 1 HIDROTOMA DE 26 X 13 mm (3" X 1/2") DE DIAMETRO, SIN DE CONDUCTO CED 80 DE 13 mm (1/2"), 1 ADAPTADOR ESPIGA ROSCA INTERIOR DE BRONCE DE 13 mm (1/2"), 1 NIPLE ESPIGA DE BRONCE DE 13 mm (1/2") 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE 13 mm (1/2")

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3" Ø R-DEE, CARGA Y ACARREO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 3" Ø, COLOCACION DE HIDROTOMAS Y RELLENO EN ZANJA CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS ALBERTO SIMONEZ
SIMONEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

Fecha: 11/07/2023

No. 07

NOTA No 11

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRAS DE LA DOOTSM, LA APROBACION DEL LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL

1. EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO (RETROSCAVADORA) EN CEPAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD.

2. RELLENO Y COMPACTADO CON EQUIPO (BALARINA) CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), EN CEPAS DE 20 CM, COMPACTADO AL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) DE SU P.V.S.M.

3. CARGA MECANICA A CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTOS DE CORTE Y EXCAVACIONES DE TERRENO.

4. ACARreo DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y COLCES AL PRIMERA KILOMETRO SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS, TALLEA DE LA SECCION DE MOJILLAS DE ESTADO DE TABASCO.

UNA VEZ REVISADO Y ANALISADO LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE LA DOOTS AUTORIZA PARA SU EJECUCION DE IGUAL MANERA SE SOLICITA QUE INGRESE DICHS CONCEPTOS PARA SU SANCION Y APROBACION EN EL AREA DE PRECIOS UNITARIOS PARA SU PAGO.

De igual manera se autorizan las cantidades adicionales solicitadas con fecha 10/07/2023 en la nota no 06. con numeros de concepto: CCC-103, CCC-395, CCC-017, CCC-105, Toma 3 x 1/2".

ING. DENIS DE JESUS GARCIA

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ

RESIDENTE DE LA DOOTSM

Fecha: 12/07/2023

No. 08

NOTA No 12


CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL CORTE DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y EL ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 3"φ, SE CONTINUA CON COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PD-26, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. CARLOS REMEDIO SIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.

NOTA No 13


FECHA 13/07/2023

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA INSTALACION DE TUBERIA DE 3"φ, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 3" PD-26, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM, DE ESPESOR.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. CARLOS REMEDIO SIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.

Fecha:

15/07/2023

No.

09

NOTA No 14

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

SE CONTINUA CON LA RPTURA Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIA PRODUCIDO DE LA DEMOLICION.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3"φ, SE COLOCA LA CAMA DE ARENA, SE INSTALA LA TUBERIA DE 3" RD-26, SE INSTALAN LAS HIDROTOMAS, SE ACOSTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA Y SE RELENA LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.



ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ

SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION

JIMENEZ

PRESIDENTE DE OBRA DE LA
DOOTSM.

Fecha: 17/07/2023

No. 10

NOTA No 15

CONTRATO N. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE JALDA DE MENDEZ, QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO, INICIAMOS CON LA INSTALACION DE UNA TEE DE (3x3"), PARA LA POSIBLE AMPLIACION DE LA RED, EN CALLEJON SIN NOMBRE DE IGUAL FORMA SE LE COLOCO UN TAPON CAMPANA DE PVC PD-26.

CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3" DE Ø, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3" Ø TELLERO CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), SE CONTINUA CON EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, Y LA EXCAVACION EN ZANJA.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

Fecha:

19/07/2023

No.

11

Nota No 16

CONTRATO N. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CON LA PRESENTE FECHA INFORMO, QUE CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION, CONTINUAMOS CON EL TENDIDO DE ARENA PARA FORMAR LA CAMA DONDE SERA COLADA LA TUBERIA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA, SE RELLENA Y ACOSTILLA LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO ARENA, COMO PACTADO CON EQUIPO MECANICO (BALLARINA). EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE REALIZA LA INTERCONEXION ENTRE LA TUBERIA DE 4" PROVENIENTE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA DE 3" PROVENIENTE DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO. EN EL CRUCERO DE ZAPATA Y SANTOS DEGOLLADO.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS BENEDICTO SIMENZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.

Fecha: 21/07/2023

No. 12

NOTA No 12

CONTRATO No CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARREO PRODUCTO DE LA DEGRADACION.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE TUBERIA DE 311Ø, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 311Ø DE Ø RD-26 SE CONTINUA CON EL RELLENO EN ZAJA CON MATERIAL DE BANCO (ARENA) COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS REMONDO JIMENEZ JIMENEZ
PRESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

Fecha: 24/07/2023

No. 13

NOTA No. 13

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION, PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 3", CONTINUAMOS CON LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA A LO ANCHO DE LA EXCAVACION; INSTALACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE DE 3", INSTALACION DE LAS HIDROTOMAS, ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA Y RELLENO CON MATERIAL DE BANDO ARENA.

ING. DENIS DA JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS REMEDIO SIMON LINDER
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM.


Fecha: 26 / 07 / 2023


No. 14

Nota No

CONTRATO No CTO-OP-MIAL-DOOTSM-031-2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA, QUE SE REALIZA AL 100% LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, DAUDO POR CONCLUIDO LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS PARA ESTE CONTRATO.


ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. CARLOS REMEDIOS JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ TABASCO Y SIENDO LAS 09:40 HRS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2023 SE ENCUENTRAN EL ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; LA C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ÁNGULO (PERSONA FISICA): PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0109.- 05000510. CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad
	TRABAJOS PREVIOS		
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m ² .	234.02
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	668.62
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ² .	3.60
CCC-851	Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bailarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ²	23.40
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ² .	3.60
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ² /km	3.60
	Línea de conducción		
8005 04	Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. RD-26, según precios de lista... De 75 mm. (3") de Ø. Incl. Materiales puestos en obra, lijado, grasa vegetal, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	334.31
	conexiones		
INTERC 3X3	Interconexión a la red existente y suministro y colocación de tee de pvc hidráulico de 76 mm x 76 mm (3"x3") de diámetro clase RD-26 que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014, incluye: cortes, grasa vegetal y herramientas necesarias, mano de obra.	pza.	1.00
COD RD26 45/3	Suministro e instalación de codo de 45° de pvc hidráulico de 76 mm (3") de diámetro clase RD-26 que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014, incluye: cortes, grasa vegetal y herramientas necesarias, mano de obra.	pza.	4.00
TOMA 3X1/2	Suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable a base de 1 hidrótoma de 76 x 13 mm (3" x 1/2") de diámetro, 5 m de poliducto hidráulico Ced 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga rosca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 niple espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 abrazaderas sinfin de 13 mm (1/2")	pza.	1.00
	CANTIDADES ADICIONALES		
	Trabajos previos		
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ² .	31.50
CCC-105	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de demoliciones	m ² .	38.52
CCC-017	Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos de terracería, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ² /km	38.52
	conexiones		
TOMA 3X1/2	Suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable a base de 1 hidrótoma de 76 x 13 mm (3" x 1/2") de diámetro, 5 m de poliducto hidráulico Ced 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga rosca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 niple espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 abrazaderas sinfin de 13 mm (1/2")	pza.	40.00
	Conceptos No Previstos		
CNP-002	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ² .	134.23964



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	25 DE JULIO 2023
PLAZO DE EJECUCION :	30 DÍAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 147,341.48
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 145,072.41
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$ 145,072.40
FIANZAS	
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	/77
EMPRESA AFIANZADORA:	ASERTA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	22 DE JULIO DE 2023
No. DE FIANZA DE ANTICIPO:	N/A
EMPRESA AFIANZADORA:	
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	
No. DE FIANZA DE DE ENDOSO POR AMPLIACION:	
EMPRESA AFIANZADORA:	
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	
No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:	3328039851
EMPRESA AFIANZADORA:	ASERTA
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	02 DE AGOSTO DE 2023
PERIODO DE EJECUCION	
FECHA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	25 DE JULIO 2023

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADO	\$ 43,723.65	\$ -
2 (DOS) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTO.	\$ 101,348.75	\$ -
#1REF!	\$ -	\$ -
#1REF!	\$ -	\$ -
#1REF!	\$ -	\$ -
	\$ 145,072.40	\$ -

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA CUATRO DE AGOSTO DE 2023

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ
JIMENEZ

RESIDENTE DE OBRA

C. AMENABAD DOMINGUEZ ANGULO
CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C. AMINADOMINGUEZ ANGULO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I. - DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023
FECHA DE FORMALIZACION:	22 DE JUNIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.
MONTO AUTORIZADO:	\$ 147,341.48
MONTO CONTRATADO:	\$ 145,072.41
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 145,072.40
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	30 DÍAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	25 DE JULIO 2023

II. - RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	
1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADO	20/07/2023	DEL	26 DE JUNIO DE 2023	AL	15 DE JULIO DE 2023	\$ 43,723.65	\$ 43,723.65
2 (DOS) FINIQUITO TRABAJOS EJECUTADOS, CANTIDADES ADICIONALES Y	29/08/2023	DEL	16 DE JULIO DE 2023	AL	25 DE JULIO DE 2023	\$ 101,348.75	\$ 145,072.40



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL INVOLUCRAMIENTO DEL PUEBLO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

RECURSOS:

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN FISICA

MODALIDAD "CONTRATO"

Fecha: 04 DE AGOSTO DE 2023.
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

PROYECTO: I0109.- 05000510.- DESCRIPCIÓN: I0109.- 05000510.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ. MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA: K002.-MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE. SUB-PROGRAMA: 61301.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

MODALIDAD: CONTRATO INVERSIÓN PROGRAMADA (\$) : \$145,072.41

META: 400.00 ML. PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DÍAS NATURALES
INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 26 DE JUNIO DE 2023
UNIDAD: ML. TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADA: 25 DE JULIO 2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 662 HABITANTES

DATOS DEL CONTRATO

LICITANTE: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

R.F.C.: DOAA6201315E8

DOMICILIO FISCAL: CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MEJOR OCAMPO, CARDENAS, TABASCO. C.P. 86490

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

ADMINISTRADOR UNICO: AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO

SUPERINTENDENTE:

ING. DENIS DE JESUS GARCIA GARCIA

RESIDENTE DE OBRA
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ

FECHA DE CONTRATO: 22 DE JUNIO DE 2023 IMPORTE DE CONTRATO: \$145,072.41
IMPORTE DE AMPLIACION: -\$ 0.01 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 145,072.40
FECHA DE ADJUDICACIÓN: 19 DE JUNIO DE 2023

ANTICIPO: N/A

INICIO DE OBRA (CONTRATO): 25 DE JUNIO DE 2023

TÉRMINO DE OBRA (CONTRATO): 25 DE JULIO 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD


DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 3329039951 EXPEDIDA POR AFIANZADORA, ASERTA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.


POR SU PARTE EL C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-031-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ


ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.


ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


C. AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO.
ADMINISTRADOR UNICO
