



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

"2021: Año de la Independencia"

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K008
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61501
UNIDAD RESPONSABLE	: RAMO 33
PROYECTO No.	: OPFS-008
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2021
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DE LICITACION	: MJM-INV-FISE-003-21

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021
FECHA OBRA	: 3 de diciembre de 2021
LOCALIDAD	: OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN
MUNICIPIO	: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN
META	: JALPA DE MENDEZ
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 3.82 KM
FECHA DE INICIO	: 60 DIAS NATURALES
FECHA DE TERMINACIÓN	: 15 de diciembre de 2021
IMPORTE AUTORIZADO	: 12 de febrero de 2022
IMPORTE CONTRATADO	: \$2,600,000.00 ---( DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N. )--- INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$2,549,575.03 ---( DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. )--- INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: \$764,872.51---( SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. )---
FECHA	: OFICIO No. DPM/65/2021 DEL 4 de noviembre de 2021
	: 2021

CONTRATISTA	: GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ
DOMICILIO	: CALLE AURELIO SOSA TORRES No. 95, COL. PUEBLO NUEVO, CARDENAS, TABASCO. C.P. 86500
REG. FED. DE CAUSANTES	: LOJG990919RU6
REG. I. M. S. S.	: E7422501105
REG. INFONAVIT	: E7422501105
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	DE : SFP-RUC-04133



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ, REPRESENTADA POR EL C. GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTÁBLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.5.- QUE DESIGNA AL MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K008.- CARRETERAS, PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
- I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

1.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2021; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2021.

## II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL C. GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. LOJG990919RU6 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. LPJMGR99091927H000. MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE AURELIO SOSA TORRES No. 95 COL. PUEBLO NUEVO, CARDENAS, TABASCO. C.P. 86500, MISMO QUE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

## III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021



3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

## CLÁUSULAS:

### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN, UBICADO EN: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

### SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$2,549,575.03 ---( DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. )--- INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

### TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 60 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 15 de diciembre de 2021 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 12 de febrero de 2022.

### CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO MJM-INV-FISE-003-21; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 2 de diciembre de 2021.

### QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ “EL AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

## SEXTO.- ANTICIPO.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 30% DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$764,872.51 ---( SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. )---, INCLUYENDO EL 16% (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

G 9



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

*“2021: Año de la Independencia”*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

## SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

- I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;
- II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;
- IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;
- V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, Y
- VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL

X  
f  
g



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

*“2021: Año de la Independencia”*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO “EL AYUNTAMIENTO”, DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

## OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

## NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

## DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021



FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

**DATOS BANCARIOS**

**NOMBRE DE LA INSTITUCION:** HSBC MÉXICO S.A.

**No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS):** 021790040630894032

**TIPO DE CUENTA:** CHEQUES

**SUCURSAL:** 351      **NOMBRE DE LA SUCURSAL:** TAMULTE

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

**DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.**

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

**DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.**

“EL CONTRATISTA” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

*“2021: Año de la Independencia”*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

9/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

## DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

## DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

## DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO”, PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUCTENTE; “EL CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y “EL AYUNTAMIENTO” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “EL

10/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

G

X

f

f



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

AYUNTAMIENTO”, JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

## DECIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

## DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

## DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA”, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

“EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

G

X  
f  
9



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

*"2021: Año de la Independencia"*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

## DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

## VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

## VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS

13/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

9



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

## VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL AYUNTAMIENTO”.
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VIII. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR “EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN

14/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

G

Handwritten marks and signature on the right margin.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

*"2021: Año de la Independencia"*

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

## VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFATORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

## VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL AYUNTAMIENTO”.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

## VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

## VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

## VIGÉSIMA SÉPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO

X  
f  
a

G



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.



2021 – 2024

“2021: Año de la Independencia”

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021


TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 3 de diciembre de 2021.

### FIRMAS


POR “EL AYUNTAMIENTO”

  
MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”  
GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ

  
C. GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ  
PERSONA FISICA

### TESTIGOS

  
ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

  
L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021, DE LA OBRA: OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN, LOCALIDAD: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024



**COMITÉ DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



OFICIO No.  
RAMO

DLP/032/21  
ADMINISTRATIVO

Jalpa de Méndez, Tabasco



**COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL**

Mtro. Rafael Ramón Morales.- Presidente del Comité de Obra  
Ing. Carlos Mario Juárez Hernández.- Secretario Técnico  
L.C.P. Eder Izquierdo Hernández.- Primer vocal  
Lic. Manuel Pérez Ricárdez.- Segundo vocal y Asesor  
Mtro. Cristian David Coronel Santos.- Asesor

**PRESENTE:**

Por este conducto y conforme a lo establecido en la **fracción II del Art. 30, 46 Y 47** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco **Y 45** de su Reglamento, Por este conducto se les hace una atenta y cordial invitación para que asistan a los actos del procedimiento de contratación estatal, de los trabajos que se refiere en la tabla y que se detallan, los cuales serán cubierto con recursos del **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2021**, en la modalidad de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, dicho eventos se celebrarán en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**CALENDARIO DE LICITACIÓN**


LICITACIÓN No. MJM-INV-FISE-003-21

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN

UBICACIÓN:

022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN.

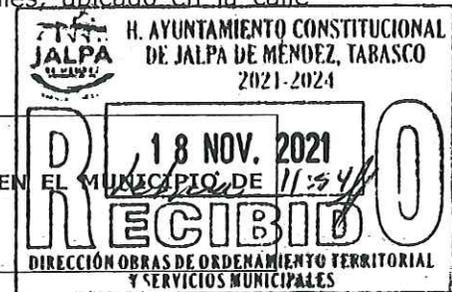

Licitación No.	Límite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Fallo para la adjudicación del contrato	Plazo de Ejecución 60 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
						Inicio	Terminación	
MJM-INV-FISE-003-21	23 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021 08:00 a. m.	22 de noviembre de 2021 12:00 p. m.	29 de noviembre de 2021 01:00 p. m.	2 de diciembre de 2021 01:00 p. m.	15 de diciembre de 2021	12 de febrero de 2022	\$896,551.72



Atentamente  
Presidente del Comité de Obra

Mtro. Rafael Ramón Morales



C.c.p. Archivo.



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

DEPENDENCIA  
OFICIO No.  
RAMO

DOOTSM.  
DLP/030/21  
ADMINISTRATIVO

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de noviembre de 2021.  
Asunto: Invitación.

**GABRIELA TOVILLA LAY  
RUIZ CORTINEZ S/N.  
COL. CENTRO  
CARDENAS TABASCO**



*Recibido  
17/Nov/21*

**AT N: C. GABRIELA TOVILLA LAY  
PERSONA FISICA.**

El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del Comité de Obra Pública Municipal, conforme a lo establecido en la **fracción II del Art. 30, 46 Y 47** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, le invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MJM-INV-FISE-003-21**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
**OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN.**

**UBICACIÓN:**  
**022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN**

Licitación No.	Límite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Fallo para la adjudicación del contrato	Plazo de Ejecución 60 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
						Inicio	Terminación	
4-INV-FISE-003-21	23 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021 08:00 a. m.	22 de noviembre de 2021 12:00 p. m.	29 de noviembre de 2021 01:00 p. m.	2 de diciembre de 2021 01:00 p. m.	15 de diciembre de 2021	12 de febrero de 2022	\$896,551.72

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **221.- Pavimentación Hidráulica y/o Asfáltica y/o 222.- Mantenimiento, conservación y obras complementarias de carreteras.**

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**

**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



**Junta de Aclaraciones:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden a FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2021, autorizados según el OFICIO No. DPM/65/2021 del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, al contratista que habiendo aceptado participar por escrito y no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 09:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$1,000.00 ---( UN MIL PESOS 00/100 M.N. )---**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del **30.00%**.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable, con fundamento en el decreto único No. 3018 de fecha 20 de marzo de 2020 en el que se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco, por lo que las empresas que entreguen sus propuestas lo deberán hacer 15 minutos antes de la hora marcada para dicho acto, debiendo anotarse y firmar la lista de asistencia, elaborándose el acta correspondiente la cual contara con las firmas de los funcionarios públicos presentes en el acto.

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día **2 de diciembre de 2021 a las 01:00 p. m.**

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
Presidente del Comité de Obra

**Mtro. Rafael Ramón Morales**



c.c.p. Archivo.



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

DEPENDENCIA  
OFICIO No.  
RAMO

DOOTSM.  
DLP/031/21  
ADMINISTRATIVO

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de noviembre de 2021.

Asunto: Invitación.

JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ  
CALLE SIETE No. 123 ALTOS  
COL. EL ESPEJO 1  
VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO



AT N: C. JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ  
PERSONA FISICA.

El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del Comité de Obra Pública Municipal, conforme a lo establecido en la **fracción II del Art. 30, 46 Y 47** de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, le invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MJM-INV-FISE-003-21**

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**  
OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN.

**UBICACIÓN:**  
022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

Licitación No.	Límite para aceptar o declinar invitación	Visita al sitio de los trabajos	Junta de aclaraciones	Presentación y apertura de propuesta	Fallo para la adjudicación del contrato	Plazo de Ejecución 60 DIAS		Capital contable mínimo acreditado
						Inicio	Terminación	
MJM-INV-FISE-003-21	23 de noviembre de 2021	22 de noviembre de 2021 08:00 a. m.	22 de noviembre de 2021 12:00 p. m.	29 de noviembre de 2021 01:00 p. m.	2 de diciembre de 2021 01:00 p. m.	15 de diciembre de 2021	12 de febrero de 2022	\$896,551.72

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será: **221.- Pavimentación Hidráulica y/o Asfáltica y/o 222.- Mantenimiento, conservación y obras complementarias de carreteras.**

**Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres:** La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

**Visita de Obra:** Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

**Junta de Aclaraciones:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden a FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2021, autorizados según el OFICIO No. DPM/65/2021 del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitara por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, al contratista que habiendo aceptado participar por escrito y no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo asentado en el artículo 47 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 09:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$1,000.00 ---( UN MIL PESOS 00/100 M.N. )---**

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.


Al licitante ganador se le otorgara anticipo del **30.00%**.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable, con fundamento en el decreto único No. 3018 de fecha 20 de marzo de 2020 en el que se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, erradicar y reducir la propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco, por lo que las empresas que entreguen sus propuestas lo deberán hacer 15 minutos antes de la hora marcada para dicho acto, debiendo anotarse y firmar la lista de asistencia, elaborándose el acta correspondiente la cual contara con las firmas de los funcionarios públicos presentes en el acto.

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día **2 de diciembre de 2021 a las 01:00 p. m.**

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarse un cordial saludo.

**Atentamente**  
Presidente del Comité de Obra

  
Mtro. Rafael Ramón Morales



c.c.p. Archivo.



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



DEPENDENCIA
OFICIO No.
RAMO

DOOTSM.
DLP/029/21
ADMINISTRATIVO

Tabasco a 17 de noviembre de 2021.
Asunto: Invitación.

GREGORIO LÓPEZ JÍMEZ
CALLE AURELIO SOSA TORRES No. 95
COL. PUEBLO NUEVO
CARDENAS TABASCO



AT N: C. GREGORIO LÓPEZ JÍMEZ
PERSONA FISICA.

Handwritten signature of Gregorio López Jiménez

El Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco, a través del Comité de Obra Pública Municipal, conforme a lo establecido en la fracción II del Art. 30, 46 Y 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco le invita a participar en el procedimiento de contratación por la modalidad de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS de carácter estatal sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, el cual se llevara a cabo en la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.: MJM-INV-FISE-003-21

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN.

UBICACIÓN:
022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

Table with 8 columns: Licitación No., Límite para aceptar o declinar invitación, Visita al sitio de los trabajos, Junta de aclaraciones, Presentación y apertura de propuesta, Fallo para la adjudicación del contrato, Plazo de Ejecución 60 DIAS (Inicio/Terminación), Capital contable mínimo acreditado. Row 1: MJM-INV-FISE-003-21, 23 de noviembre de 2021, 22 de noviembre de 2021 (08:00 a. m.), 22 de noviembre de 2021 (12:00 p. m.), 29 de noviembre de 2021 (01:00 p. m.), 2 de diciembre de 2021 (01:00 p. m.), 15 de diciembre de 2021 / 12 de febrero de 2022, \$896,551.72

Contar con registro vigente el Padrón de contratista del Estado de Tabasco; la especialidad solicitada será:
221.- Pavimentación Hidráulica y/o Asfáltica y/o 222.- Mantenimiento, conservación y obras complementarias de carreteras.

Recepción de Propuestas y Apertura de Sobres: La presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en la oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales con dirección en calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco.

Visita de Obra: Los participantes deberán presentarse en la fecha y hora señalada en el lugar que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de donde se partirá al lugar de ejecución de los trabajos.



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**

**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"**



**Junta de Aclaraciones:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Los recursos para la celebración de los trabajos descritos corresponden a FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2021, autorizados según el OFICIO No. DPM/65/2021 del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

De acuerdo al artículo 47 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, en caso de aceptar participar se deberá manifestar por escrito a la persona que signa la presente invitación a más tardar el día señalado y quedará obligado a presentar propuesta, en el entendido que si no lo hace, la contraloría inhabilitará por noventa días naturales para participar en procesos de contratación por invitación a cuando menos tres personas y adjudicación directa, al contratista que habiendo aceptado participar por escrito y no presenten propuesta, lo anterior en concordancia con lo establecido en el artículo 47 fracción IV de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. La fecha de inicio de inhabilitación, será la de la presentación y entrega de propuestas.

Se le solicita acudir de 09:00 a.m. a 14:00 p.m. de lunes a viernes a la dirección de obras ordenamiento territorial y servicios municipales con dirección en calle Plaza Hidalgo No. 1, Jalpa de Méndez, Tabasco, con su carta de aceptación para que le sean proporcionados las bases de la licitación y sus anexos.

Las bases tendrán un costo de **\$1,000.00 ---( UN MIL PESOS 00/100 M.N. )---**.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de la Licitación, así como en las proposiciones presentadas podrá ser negociada.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No podrá participar persona física o jurídico colectiva que no se encuentre inscrita o en proceso de inscripción en el Padrón de Contratista del Estado de Tabasco.

Al licitante ganador se le otorgara anticipo del **30.00%**.

El acto de apertura de propuesta se llevará a cabo de manera interna, por lo cual deberá entregar su propuesta en un sobre cerrado de manera inviolable, con fundamento en el decreto único No. 3018 de fecha 20 de marzo de 2020 en el que se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco, por lo que las empresas que entreguen sus propuestas lo deberán hacer 15 minutos antes de la hora marcada para dicho acto, debiendo anotarse y firmar la lista de asistencia, elaborándose el acta correspondiente la cual contara con las firmas de los funcionarios públicos presentes en el acto.

**El Fallo:** Se llevará a cabo en las oficinas de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales el día **2 de diciembre de 2021 a las 01:00 p. m.**

Sin más por el momento quedo de usted, y aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**  
Presidente del Comité de Obra

  
**Mtro. Rafael Ramón Morales**



c.c.p. Archivo.



# GABRIELA TOVILLA LAY

R.F.C. TOLG910620UZ5  
CURP. TOLG910620MTCVYB03  
Calle Adolfo Ruiz Cortinez S/N  
Esd. Tomas Garrido (Junto a La Imprenta)

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 19 DE NOVIEMBRE DE 2021

## OFICIO DE ACEPTACION

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA  
AT'N. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA  
P R E S E N T E:

EN RESPUESTA A SU OFICIO No. DLP/030/21, DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, EN DONDE SE NOS HACE LA ATENTA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL:

**Procedimiento De Contratación No.:** MJM-INV-FISE-003-21.

**Modalidad Del Procedimiento:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

**Descripción y Ubicación:**

OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN., UBICACIÓN: 022.- RA. EL CAMPO PETRÓLERO MECOACÁN.

**Fecha De Inicio.:** 15-DIC-21. **Fecha De Terminación.:** 12-FEB-22. **Plazo De Ejecución:** 60 Días.

POR ESTE CONDUCTO, ME ES GRATO INFORMAR A USTED NUESTRA ACEPTACION DE PARTICIPACION EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION ARRIBA REFERIDO.



C.C.P. ACUSE RECIBIDO.

ATENTAMENTE

C. GABRIELA TOVILLA LAY  
Administrador Único





**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**MODALIDAD:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
**LICITACIÓN No:** MJM-INV-FISE-003-21  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN.  
**UBICACIÓN:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las **12:00 p. m.** del día **22 de noviembre de 2021**, hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

- 1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
- 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.  
**OBSERVACIONES:**



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**

**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"**



La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por la convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos, el tablero de identificación de obra, la elaboración de los planos finales de la obra, las pruebas de laboratorio y el cargo de director responsable de obra.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

No habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las **12:45 p. m.** del día **22 de noviembre de 2021**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

**REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TAB.**

**ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS ORD. TERRIT. Y SERV. MPALES

**ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ**  
SUPERVISOR DE OBRAS DE LA DOOTSM

**ARQ. ABELARDO ALEJANDRO RAMÍREZ**  
REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

G

T



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



CONTRATISTAS PRESENTES EN EL ACTO

EMPRESA CONTRATISTA

FIRMA

GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ

GABRIELA TOVILLA LAY

JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

**MODALIDAD:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
**LICITACIÓN No:** MJM-INV-FISE-003-21  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN  
**UBICACIÓN:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

*LISTA DE ASISTENCIA*

*POR LOS PARTICIPANTES*

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ	C. JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ	
GABRIELA TOVILLA LAY	C. SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS	
JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ	C. CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES	





**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**

**MODALIDAD:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
**LICITACIÓN No:** MJM-INV-FISE-003-21  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN.  
**UBICACIÓN:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN.

En la Ciudad de Jalpa de Méndez siendo las **01:00 p. m.**, del día **29 de noviembre de 2021** y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 Y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en: la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, sita en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los servidores públicos, los invitados, cuyos nombres figuran al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo la apertura de proposiciones técnica-económica relativa al procedimiento de contratación bajo la modalidad de **INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** arriba indicada, presidiendo este acto el **Ing. Oscar Jesús Pérez Arias**, Jefe del departamento de licitaciones y precios unitarios en representación del **Mtro. Rafael Ramón Morales** presidente del Comité de obra pública.

Acto seguido se procedió a la apertura de los sobres de las proposiciones técnicas, verificando que las mismas cumplieran con los requisitos establecidos para la licitación; las propuestas presentadas por los licitantes, hacen un total de 3 (tres) cotizaciones recibidas:

De acuerdo al artículo 41 de la ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco se establece que:

- A).- Se revisó primeramente la propuesta Técnica
- b).- Se desechó las propuestas que omitieron alguna documentación solicitada en el pliego de requisitos exigidos en las bases de licitación.
- c).- Se devolverá al licitante las propuestas desechadas en un plazo de 15 días.
- d).- Toda la documentación será recibida para su revisión detallada.

Observaciones:



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**

**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"**



Las propuestas cumplieron con los requisitos solicitados en las bases.

A continuación, se procedió a la revisión de los documentos que contienen las propuestas económicas de los licitantes y se verificó cuantitativamente que las mismas contuvieran los documentos solicitados

Propuestas económicas desechadas en la revisión cuantitativa:

Licitante: Ninguno

**Causas: No aplica**

Propuestas económicas aceptadas para su análisis cualitativo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 40 y 41 De La Ley De Obras Publicas Y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco:

EMPRESAS:	PROPUESTAS SIN INC. I.V.A.	PLAZO DE EJECUCIÓN
<b>1. GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ</b>	<b>\$2,197,909.51</b>	<b>60 días</b>
<b>2. GABRIELA TOVILLA LAY</b>	<b>\$2,232,269.73</b>	<b>60 días</b>
<b>3. JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ</b>	<b>\$2,238,694.13</b>	<b>60 días</b>

**PRESUPUESTO BASE: \$2,241,379.31 (MONTO SIN I.V.A.)**

Acto seguido el Ing. Oscar Jesús Pérez Arias, Jefe del departamento de licitaciones y precios unitarios de la dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales procedió a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas; se procedió a rubricar la carta compromiso (**Anexo 1E**), el catálogo de conceptos (**Anexo 11E**) en el que se consignan los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación y el programa de obra de los trabajos (**Anexo 12E**), en cumplimiento al artículo 41 y 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco: así mismo conforme a lo establecido en el Artículo 41 Fracción VI de la misma ley, se informa a los presentes que el día **2 de diciembre de 2021** a las **01:00 p. m.**, se dará a conocer en este mismo lugar el fallo de esta licitación.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado el acto a la **02:20 p. m.**, del mismo día de su inicio, del cual se levanta la presente acta, que fue leída a los presentes, quienes proceden a firmar de conformidad, al calce y al margen de la misma, para dar fe de su legalidad



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**

**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"**



conforme a lo establecido en el artículo 41 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

**Por los servidores públicos e invitados:**

**ING. OSCAR JESÚS PÉREZ ARIAS**  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
Y PRECIOS UNITARIOS

**POR LOS LICITANTES:**

**EMPRESAS:**

**FIRMAS:**

**GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ**


**C. JUAN MANUEL RAMÓN HERNÁNDEZ**

**GABRIELA TOVILLA LAY**

**C. SANDRA RODRIGUEZ DE DIOS**

**JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ**

**C. CARLOS ENRIQUE LOPEZ TORRES**

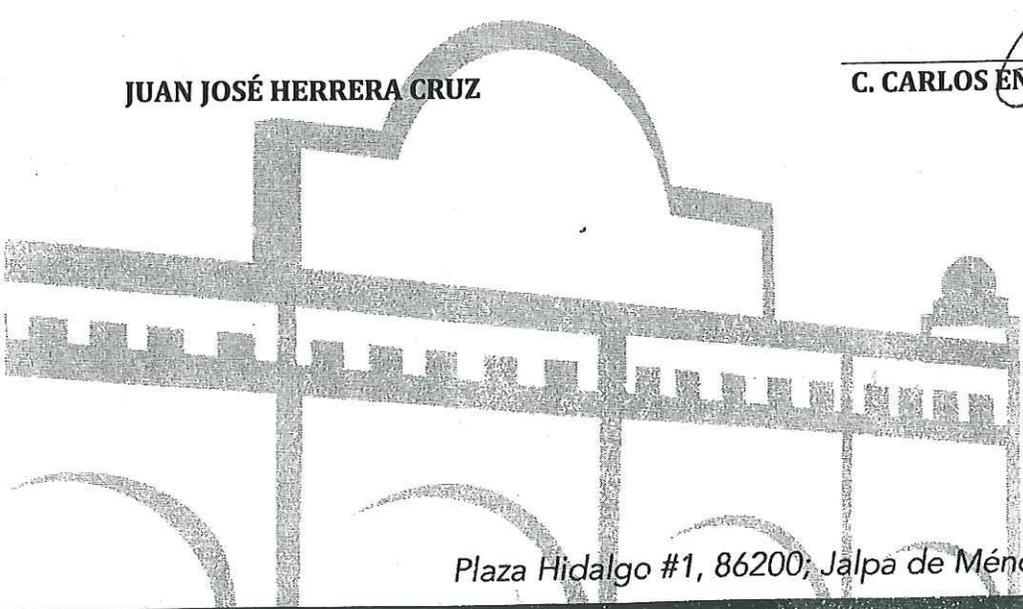



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

**DICTAMEN TÉCNICO  
PARA LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA**

**MODALIDAD:** INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
**LICITACIÓN No:** MJM-INV-FISE-003-21  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN  
**UBICACIÓN:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 11:00 a. m. del día 1 de diciembre de 2021, y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y 37 y 38 de su Reglamento y a las bases de licitación, la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales proporciona el dictamen correspondiente que servirá como fundamento para el fallo para la adjudicación del contrato, en base a lo siguiente.

**l).- Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:**

a).- El día 17 de noviembre de 2021, se enviaron Invitaciones para el procedimiento de contratación bajo la modalidad de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, para participar en este acto a las siguientes empresas:

GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ  
 GABRIELA TOVILLA LAY  
 JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ

b).- Aceptando su participación las siguientes empresas:

1. GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ
2. GABRIELA TOVILLA LAY
3. JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ

c).- Se llevó a cabo la Visita de Obra el día 22 de noviembre de 2021 a las 08:00 a. m. y la Junta de Aclaraciones a las 12:00 p. m. del mismo día, a las cuales asistieron las siguientes empresas:

1. GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ
2. GABRIELA TOVILLA LAY
3. JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

II).- Las propuestas se analizaron en forma cuantitativa el día 29 de noviembre de 2021, día de la recepción, Apertura Técnica y Económica de las propuestas en la cual solo basto con la presentación de los documentos solicitados en las bases de licitación de acuerdo al Artículo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ	\$2,197,909.51	ACEPTADA
2	GABRIELA TOVILLA LAY	\$2,232,269.73	ACEPTADA
3	JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ	\$2,238,694.13	ACEPTADA

III).- Razones Legales, Técnicas y Económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas por los licitantes de acuerdo a los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

- Ninguna.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1	GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ	\$2,197,909.51	ACEPTADA
2	GABRIELA TOVILLA LAY	\$2,232,269.73	ACEPTADA
3	JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ	\$2,238,694.13	ACEPTADA

IV).- Relación de los licitantes cuyas propuestas cumplieron con los requerimientos exigidos por la evaluación ubicados del mayor al menor de acuerdo a los montos revisados y corregidos, de acuerdo al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

No.	Nombre de la empresa.	Monto Ofertado Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
1.	GABRIELA TOVILLA LAY	\$2,232,269.73	SE CONSIDERA SOLVENTE
2.	JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ	\$2,238,694.13	SE CONSIDERA SOLVENTE
3.	GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ	\$2,197,909.51	SE CONSIDERA SOLVENTE

**PRESUPUESTO BASE: \$2,241,379.31 SIN INCLUIR I.V.A.**



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024



CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

RANGO DE EVALUACIÓN:

a).- Propuesta Mayor	\$ 2,238,694.13
b).- Propuesta Menor	\$ 2,197,909.51
Diferencia	\$ 40,784.62

De donde (1) \* ( \$ 2,238,694.13 )/10= \$ 223,869.41  
De donde: \$ 40,784.62 < \$ 223,869.41  
Cumplíndose la condición

CONDICIÓN: SE CUMPLE CONDICIÓN I (Del artículo 36 del RLOPSRM del Estado de Tabasco)

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN:

Nombre de la empresa.	Monto ofertado: Sin Inc. IVA	Situación de la Propuesta
GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ	\$2,197,909.51	Se Adjudica ya que esta es la propuesta solvente cuyo monto es el más bajo.
GABRIELA TOVILLA LAY	\$2,232,269.73	Se considera solvente.
JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ	\$2,238,694.13	Se considera solvente.

Siendo las 11:40 a. m. del mismo día de su inicio se da por terminada la presente firmando en ella los que intervinieron.

EMITE:

ING. OSCAR JESÚS PÉREZ ARIAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS  
UNITARIOS  
CED. PROF. No. 6021224



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**  
**2021-2024**  
**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE-003-21

OBRA:

OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACÁN

UBICACIÓN: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				GREGORIO LÓPEZ JIMÉNEZ				GABRIELA TOVILLA LAY				JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
I	PRELIMINARES																	
2	Deslote con equipo moto conformadora Ha p.u.o.t.	Ha	0.46	4,998.97	2,294.93	0.102%	\$ 3,232.65	-35%	1,487.02	0.068%	\$ 3,299.87	-34%	1,515.18	0.068%	\$ 5,287.94	6%	2,432.45	0.105%
II	TERRACERIAS																	
3	Excavación en corras y adicionales abajo de la subrasante, en ampliaciones de corte, en abombamiento de taludes, en rebajes de la corona y/o de terrapienes existentes	m³	176.76	26.03	4,601.06	0.205%	\$ 21.54	-17%	3,807.41	0.173%	\$ 20.20	-22%	3,570.55	0.160%	\$ 28.39	9%	5,018.22	0.224%
5	Compactación de la cama de los corries en que se haya ordenado excavación adicional mecánico al noventa por ciento (90%) M.V.S.M.	m³	66.29	14.98	993.02	0.044%	\$ 11.93	-20%	790.84	0.036%	\$ 22.48	50%	1,480.20	0.067%	\$ 16.93	13%	1,122.29	0.050%
6	Formación y compactación de terrapienes de relleno para formar la subrasante con material seleccionado de las excavaciones que se haya ordenado excavación adicional al noventa y cinco por ciento (95%) de su M.V.S.M.	m³	132.57	261.05	34,607.40	1.544%	\$ 264.02	1%	35,001.13	1.592%	\$ 259.92	-3%	33,662.17	1.508%	\$ 280.79	11%	38,550.03	1.722%
7	Carga mecánica a cantón volante, de material producido de cortes y excavaciones de terreno	m³	212.11	15.50	3,287.71	0.177%	\$ 14.57	-6%	3,090.44	0.141%	\$ 16.16	4%	3,427.70	0.154%	\$ 19.46	26%	4,127.66	0.184%
8	Acarreo de material producido de cortes y excavaciones de terreno, para ser empujado sobre caminos pavimentados, por la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m³/km	212.11	12.16	2,579.26	0.115%	\$ 11.96	-2%	2,536.84	0.115%	\$ 12.01	-1%	2,547.44	0.114%	\$ 12.80	5%	2,715.01	0.121%
10	Construcción de base hidráulica empujando material pétreo triturado, grava de 1" a fines, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M.	m²	66.29	1,032.81	68,464.97	3.055%	\$ 1,072.60	-2%	67,125.25	3.054%	\$ 1,013.18	-2%	67,163.70	3.009%	\$ 984.20	-4%	65,905.52	2.841%
III	RENIVELACION																	
11	Barrido de la superficie por tratar por medios manuales, para recibir cheso de liga	ha	0.63	3,787.13	2,385.89	0.108%	\$ 3,024.79	-20%	1,995.62	0.087%	\$ 4,594.45	21%	2,884.50	0.130%	\$ 4,207.44	11%	2,650.69	0.119%
12	Emulsión asfáltica empujada en riegos de liga (renivelación, emulsión asfáltica catiónica de cumplimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L	7,500.60	12.51	93,832.51	4.188%	\$ 12.56	0%	94,207.54	4.286%	\$ 13.08	5%	96,107.85	4.395%	\$ 13.32	6%	99,907.99	4.463%
13	Renivelación a base de mezcla asfáltica (arena de río-emulsión), compactada al noventa y cinco por ciento (95%) con maquinaria, incluye material ya elaborado	m²	125.01	2,663.70	336,739.44	15.024%	\$ 2,554.12	-5%	319,290.54	14.527%	\$ 2,692.54	0%	336,594.43	15.079%	\$ 2,662.01	-1%	332,777.87	14.865%
V	PAVIMENTO ASFALTICO																	
14	Barrido de la superficie por tratar por medios mecánicos, para recibir riego de impregnación	ha	0.04	1,880.00	75.20	0.003%	\$ 1,724.91	-8%	68.00	0.003%	\$ 3,251.83	73%	130.07	0.006%	\$ 2,009.82	7%	80.39	0.004%
15	Emulsión asfáltica empujada en riegos de impregnación (base hidráulica, emulsión asfáltica catiónica de cumplimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L	662.85	12.51	8,292.25	0.370%	\$ 12.56	0%	8,325.40	0.379%	\$ 13.22	6%	8,762.88	0.393%	\$ 13.32	6%	8,829.16	0.394%
16	Suministro y colocación de arena para cubrir base impregnada (poroso)	m³	3.54	304.87	1,079.24	0.048%	\$ 289.84	-5%	1,026.03	0.047%	\$ 300.53	28%	1,382.48	0.062%	\$ 328.26	9%	1,162.11	0.052%
17	Barrido de la superficie por tratar por medios mecánicos, para recibir riego de liga	ha	0.58	1,883.08	1,092.19	0.049%	\$ 1,724.91	-8%	1,000.45	0.046%	\$ 3,251.83	73%	1,886.06	0.084%	\$ 2,009.82	7%	1,165.70	0.052%
18	Emulsión asfáltica empujada en riegos de liga (sobrecapa y carpeta, emulsión asfáltica catiónica de cumplimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L	6,942.00	12.51	86,844.42	3.875%	\$ 12.56	0%	87,191.52	3.967%	\$ 13.08	5%	90,801.36	4.068%	\$ 13.32	6%	92,467.44	4.130%



LICITACION No:  
OBRA:

MJM-INV-FISE-003-21  
OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACÁN

UBICACIÓN:

022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			GREGORIO LÓPEZ JIMÉNEZ			GABRIELA TOVILLA LAY			JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
19	Construcción de carpeta con espesor adalco en caliente con material pétreo grueso de 1/2" a finos y cemento asfáltico PG 64-22 compactada al noventa y cinco por ciento (95%)	m <sup>2</sup>	289.25	4,199.87	1,214,812.40	54.199%	4,257.83	1,231,577.33	1%	56.034%	4,164.98	1,204,720.47	-1%	53.989%	4,054.01	1,172,622.39	-3%	52.380%
20	Suministro y aplicación de sello premezclado sincronizado con equipo computarizado. Incluye: emulsión asfáltica de rampamiento rápido modificada con polímero tipo I alta viscosidad para riego de liga, sello 3-A premezclado con astallo PG 64-22	m <sup>2</sup>	5,766.86	43.91	253,222.82	11.298%	39.73	229,117.35	-10%	10.424%	43.98	253,626.50	0%	11.362%	46.24	266,659.61	5%	11.917%
VI	SEÑALAMIENTO																	
21	Raya lateral sencilla continua de 10 cm de ancho, con un espesor húmedo de 21 milímetros de pulgada (0.5334 mm) con pintura para tránsito 100% acrílica base agua color blanco para todo clima (AWP) marca 3M o similar, con microesferas de vidrio (0.262 Kg/m <sup>2</sup> ) y elementos cerámicos (0.109 Kg/m <sup>2</sup> ) aplicados con equipo	m	7,640.00	11.01	84,116.40	3.753%	9.63	73,573.20	-13%	3.347%	10.47	79,990.80	-5%	3.583%	12.26	93,666.40	11%	4.184%
22	Raya central sencilla continua o discontinua de 10 cm de ancho, con un espesor húmedo de 21 milímetros de pulgada (0.5334 mm) con pintura para tránsito 100% acrílica base agua color amarillo para todo clima (AWP) marca 3M o similar, con microesferas de vidrio (0.262 Kg/m <sup>2</sup> ) y elementos cerámicos (0.109 Kg/m <sup>2</sup> ) aplicados con equipo	m	3,820.00	11.01	42,056.20	1.976%	9.63	36,786.60	-13%	1.674%	10.47	39,995.40	-5%	1.792%	12.26	46,833.20	11%	2.082%

SUB-TOTAL: \$ 2,241,376.31  
IVA: \$ 350,620.69  
TOTAL: \$ 2,600,000.00

\$ 2,197,909.51  
\$ 351,665.52  
\$ 2,549,575.03

\$ 2,232,697.79  
\$ 357,163.16  
\$ 2,589,860.95

\$ 2,238,694.13  
\$ 356,191.06  
\$ 2,596,885.19

ELABORO  
  
ING. OSCAR JESÚS GONZÁLEZ ARIAS  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS  
DE LA D.O.T.S.M.  
CED. PROF. No. 602/1224



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

**ACTA DE FALLO Y ADJUDICACION**

<b>MODALIDAD:</b>	INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
<b>LICITACIÓN No:</b>	MJM-INV-FISE-003-21
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:</b>	OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN.
<b>UBICACIÓN:</b>	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN.

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO., SIENDO LAS **01:00 P. M.** DEL DIA **2 de diciembre de 2021**, DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO DE APERTURA TECNICA-ECONOMICA CELEBRADO EL DIA **29 de noviembre de 2021**, DE ACUERDO AL ARTICULO **41 FRACCION VII, VIII Y IX DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO** Y PARA CONOCER EL FALLO QUE EMITE EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES CITO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA Y EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 42 JUNTO CON TODOS SUS PÁRRAFOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTICULO 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

A CONTINUACIÓN, SE DA A CONOCER LA RELACION DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS O ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE: NINGUNO

ACTO SEGUIDO SE DIO LECTURA AL DICTAMEN ECONÓMICO, CUYO RESULTADO CONSISTE EN LO SIGUIENTE:

9



**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024**



**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"

**LAS PROPUESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LAS BASES, POR LO QUE SON LEGAL, TECNICA Y ECONOMICAMENTE SOLVENTES.**

UNA VEZ CONCLUÍDA LA LECTURA DEL DICTAMEN ANTES CITADO, EL C. ING. OSCAR JESUS PEREZ ARIAS, EN PRESENCIA DE LOS DEMÁS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, LICITANTES E INVITADOS, COMUNICA EL FALLO PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA DE REFERENCIA MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA: **GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ**, YA QUE LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL LICITANTE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, Y EN CONSECUENCIA SE LE ADJUDICA EL CONTRATO RELATIVO A LA OBRA ANTES MENCIONADA, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

<b>No. DE CONTRATO:</b>	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:</b>	OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN.
<b>UBICACIÓN:</b>	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN
<b>MONTO DEL CONTRATO: (INCLUYE I.V.A.)</b>	\$2,549,575.03---( DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 3/100 M.N. )---
<b>ANTICIPO:</b>	\$764,872.51 ---( SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. )---
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	60 DÍAS CALENDARIO
<b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b>	del 15 de diciembre de 2021 al 12 de febrero de 2022

LA PRESENTE ACTA SURTE EFECTO DE NOTIFICACIÓN PARA EL LICITANTE ADJUDICADO, COMUNICÁNDOLE QUE LA FIRMA DEL CONTRATO NO. **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021** QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA **3 de diciembre de 2021** A LAS **11:00 a. m.** EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

DE IGUAL MANERA PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR EN EL MISMO LUGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVAMENTE, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO.

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL "CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL **30%** DEL MONTO CONTRATADO, OBLIGÁNDOSE EL "CONTRATISTA" A UTILIZARLO



  
 Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



EN LA SIGUIENTE FORMA: 20% PARA EL INICIO DE LA OBRA Y 10% EN LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES QUE SE REQUIERAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS. ASI MISMO DEBERA PRESENTAR LA GARANTÍA DEL ANTICIPO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ESTE FALLO.

SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA A LAS 01:45 p. m. DEL MISMO DIA DE SU INICIO PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, FIRMAN DE CONFORMIDAD LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO.

POR LA DEPENDENCIA:

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

EMITE:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

EVALUA:

ING. OSCAR JESÚS PÉREZ ARIAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y  
PRECIOS UNITARIOS

POR LOS LICITANTES:

EMPRESAS:

GREGORIO LÓPEZ JÍMENEZ


JUAN JOSÉ HERRERA CRUZ

GABRIELA TOVILLA LAY

FIRMA:



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



"2021: Año de la Independencia".

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETROLERO MECOACAN
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.- URBANIZACION

LOCALIZACION: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LO CUAL SE LLEVARÁN ACABO LAS SIGUIENTES ACCIONES. DESORILLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, BASSE HIDRÁULICA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION, RENIVELACIÓ ASFÁLTICA, TENDIDO DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y PINTADO DE RAYAS LATERALES.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 334 HABITANTES



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



"2021: Año de la Independencia".

**VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

**OPFS-008.- REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN**

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.- URBANIZACION

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO A BASE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LO CUAL SE LLEVARÁN ACABO LAS SIGUIENTES ACCIONES. DESORILLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, BASSE HIDRÁULICA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION, RENIVELACIÓ ASFÁLTICA, TENDIDO DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y PINTADO DE RAYAS LATERALES.

022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 18 de octubre de 2021

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 18 de Octubre de 2021

Folio No.: DPADS/ /2021  
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández  
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra OPFS-008 REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN, a ejecutarse en: 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
OPFS-008	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA CAMPO PETRÓLERO MECOACAN	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	3.82KM	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,600,000.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE: AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

<b>OBRA:</b>	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
<b>CONTRATO</b>	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
<b>PERIODO</b>	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
<b>LOCALIDAD</b>	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	<b>FECHA:</b>	24 MARZO DE 2022

## LETRERO ALUSIVO A LA OBRA



**ARO. JOSE JESUS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

- 1 PRELIMINARES
- 2 DESORILLE CON EQUIPO MOTO CONFORMADORA P.U.O.T.

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** 10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008



**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021

**CONTRATO:** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

**PERIODO:** DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

**LOCALIDAD:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN

**FECHA:** 24 MARZO DE 2022

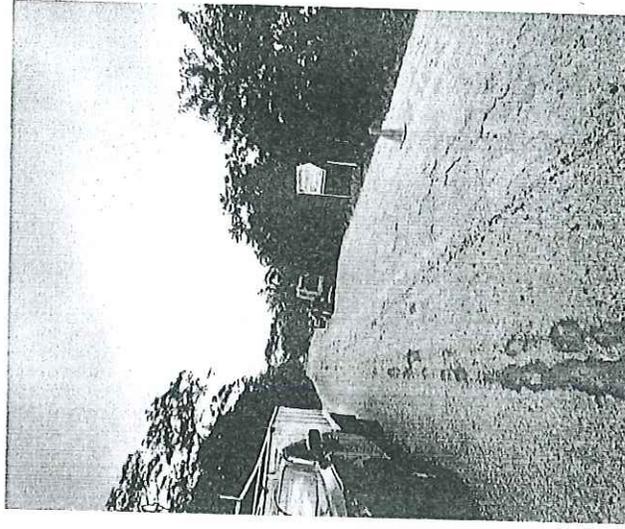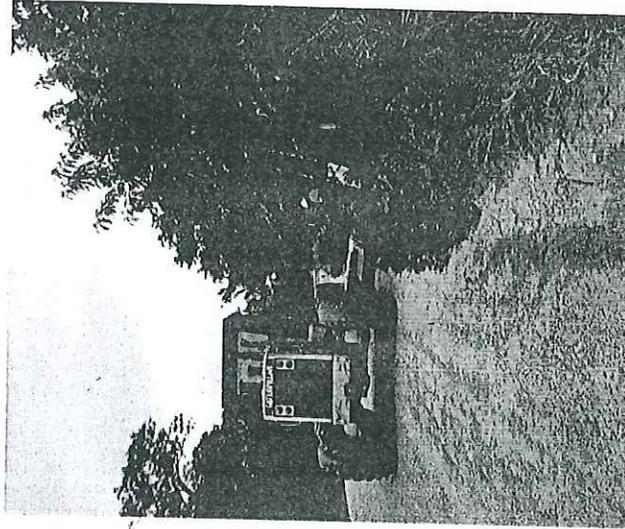

**ARO. JOSÉ JESÚS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM







**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN
FECHA:	24 MARZO DE 2022

- II TERRACERIAS
- 3 EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, EN AMPLIACIONES DE TALUDES, EN ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA Y/O DE TERRAPLENES EXISTENTES

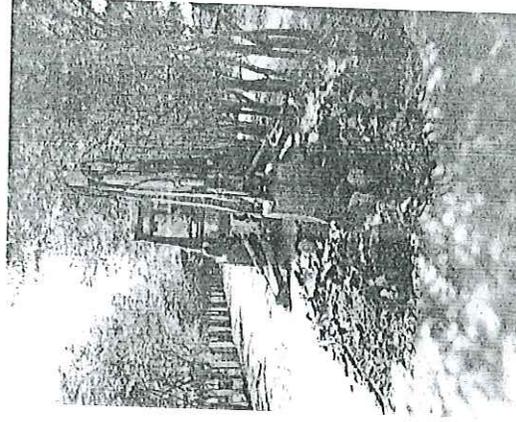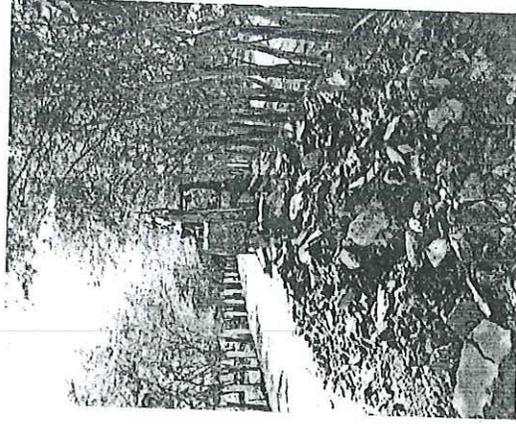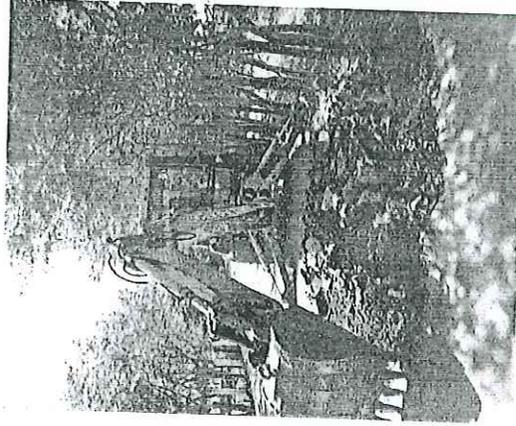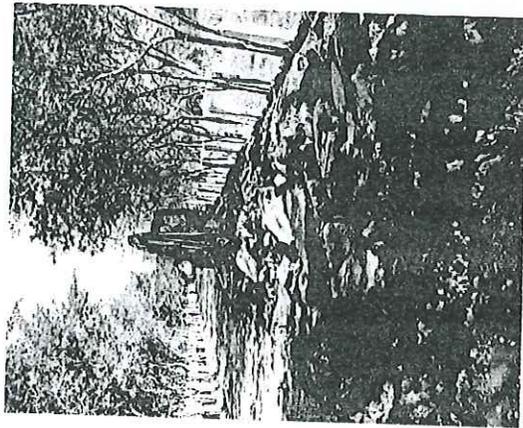

**ARO-JOSE-JESUS-SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM

**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500





TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
E-Mail: greglop.com ; reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008

OBRA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	CTO-OP.-MJAL.-DOOTSM-FISE-004-2021
CONTRATO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022
PERIODO	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN
LOCALIDAD	FECHA: 24 MARZO DE 2022

5 COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL CON EQUIPO MECÁNICO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) M.V.S.M.

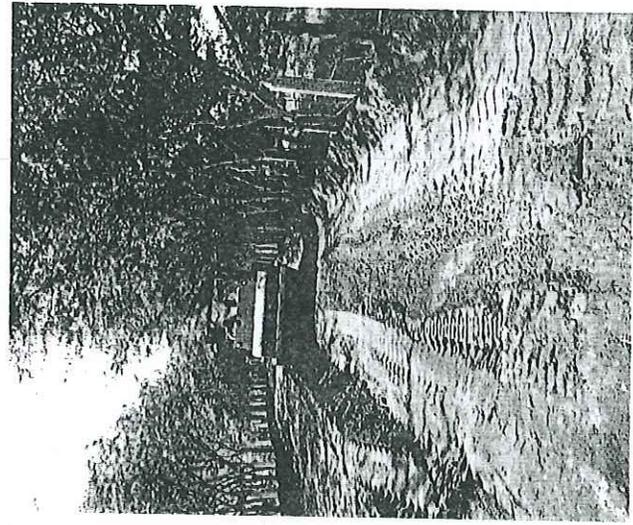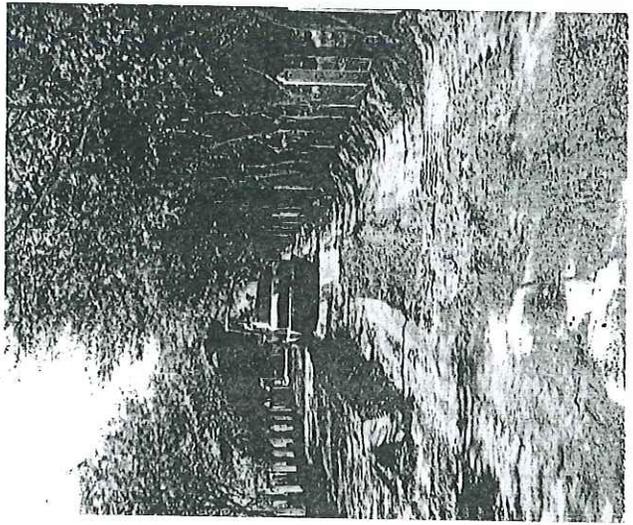

ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA DOOTSM

**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LOJG990919RU6 CURP.LOJG990919HTCPM00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500




TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	FECHA:	24 MARZO DE 2022

6 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (ARENILLA), EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU M.V.S.M.

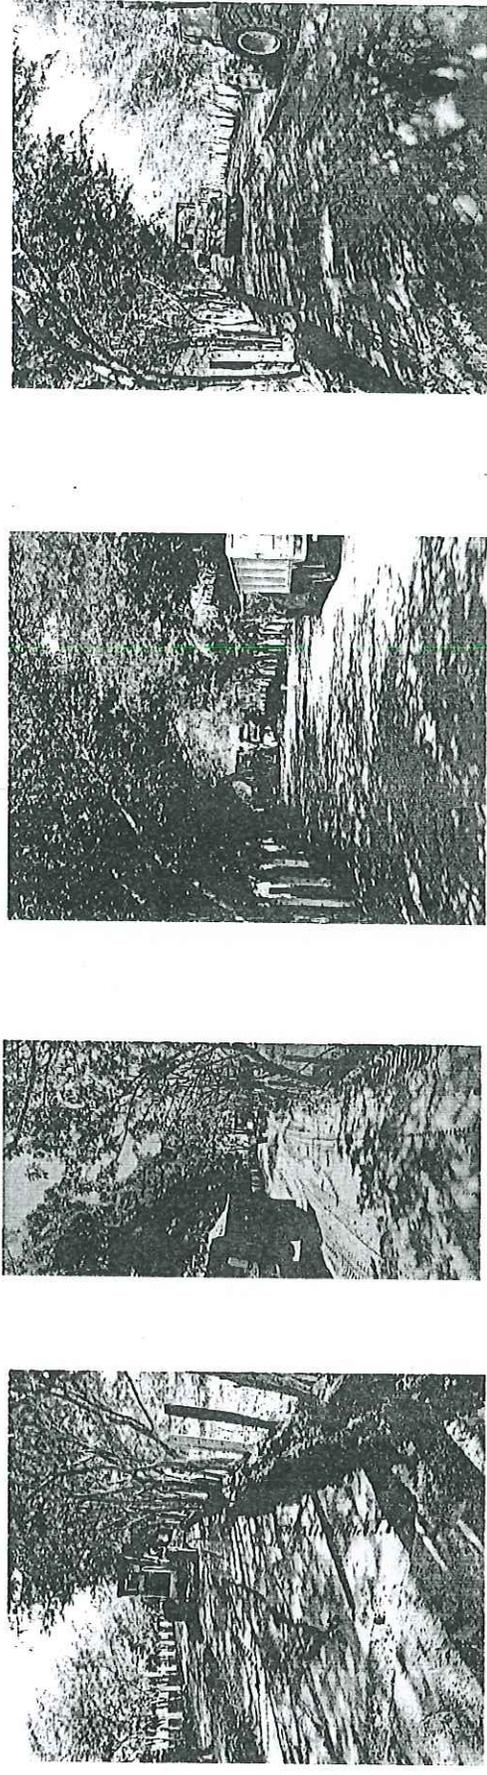

ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM





**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LOJG980919RU6, CURP LOJG980919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P.: 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN		FECHA: 24 MARZO DE 2022

7 CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES DE TERRENO

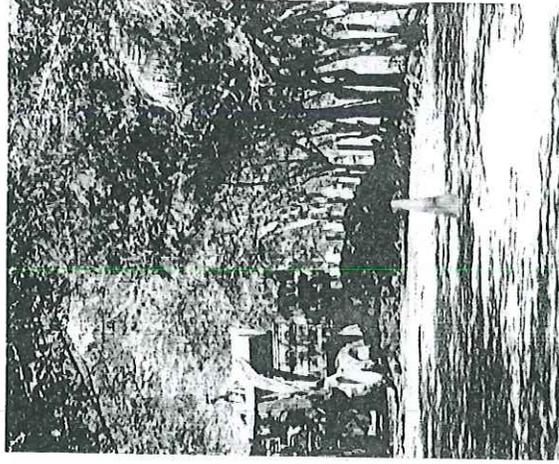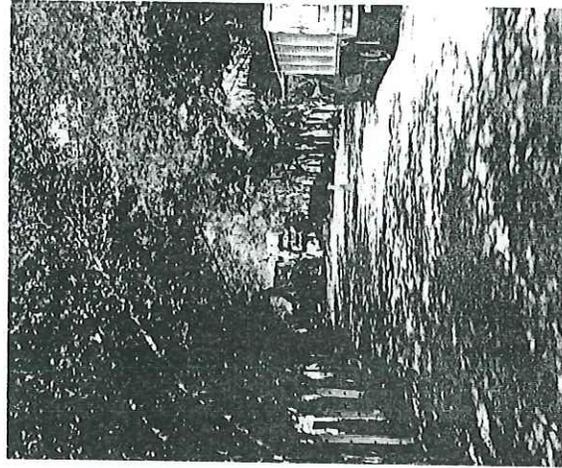

ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJG990919RU6. CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE-AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500



TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68

E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	FECHA:	24 MARZO DE 2022

8 ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES DE TERRENO AL PRIMER KILÓMETRO SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS, TARIFA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.

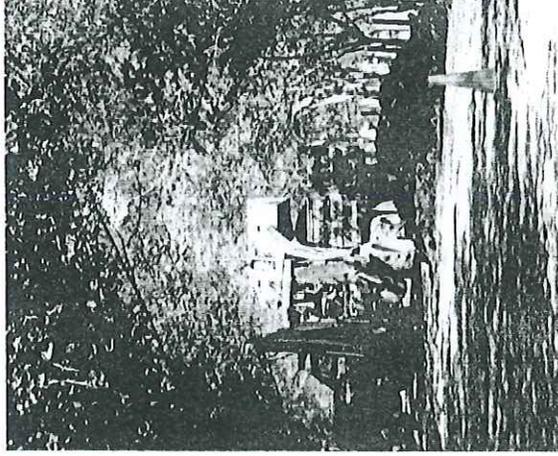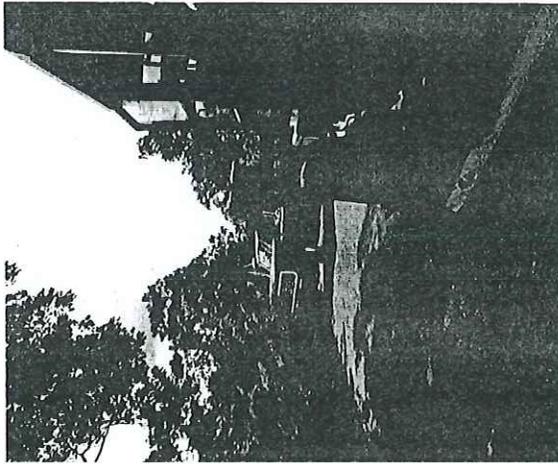

**ING. JOSE JESUS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

*[Handwritten signature]*

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM

**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LOJG990919RU6 CURP LOJG990919HTCPMIR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-96, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 866500



TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** 10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008





**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021

**CONTRATO:** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

**PERIODO:** DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

**LOCALIDAD:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN **FECHA:** 24 MARZO DE 2022

10 CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EMPLEANDO MATERIAL PÉTREO TRITURADO, GRAVA DE 1 ½" A FINOS, COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M.MATERIAL PUESTO EN OBRA

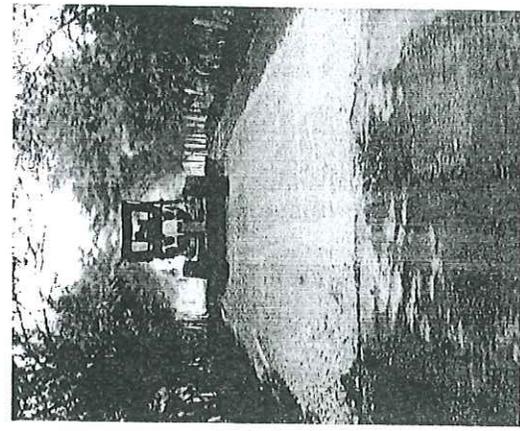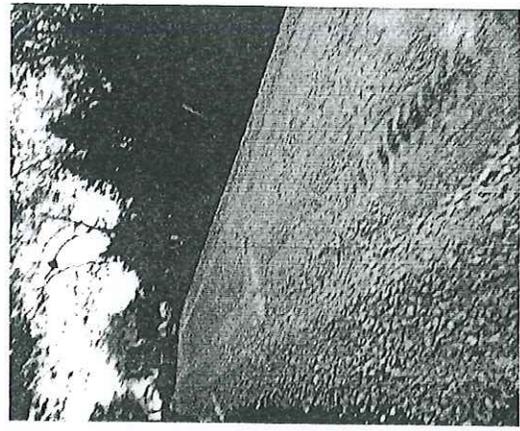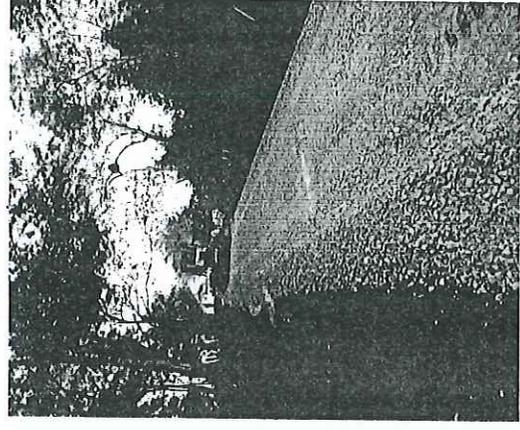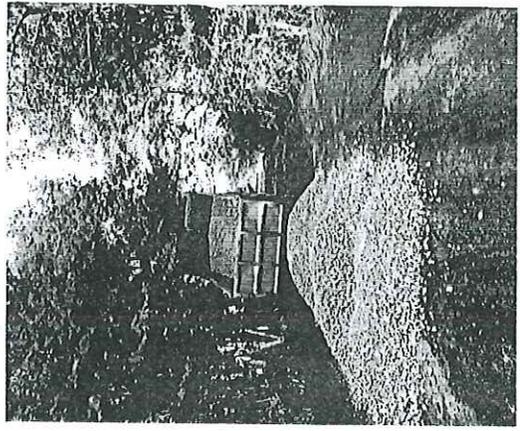

**ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJG990919RU6, CURP.LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 96500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68

E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** 10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008

**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021

**CONTRATO**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

**PERIODO**

DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

**LOCALIDAD**

022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN

**FECHA:** 24 MARZO DE 2022

### III RENIVELACION

11 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MANUALES, PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA



*(Signature)*  
**ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

*(Signature)*

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**


R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCFMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. Imss e INFONAVIT: E7422501105


# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	FECHA:	24 MARZO DE 2022

12 EMULSIÓN ASFÁLTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE LIGA (RENIVELACIÓN, EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65)

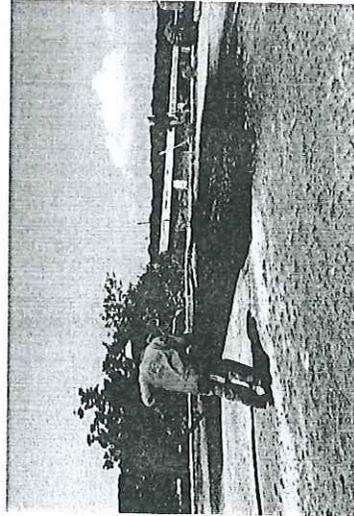

*(Signature)*  
**ARQ. JOSÉ JESÚS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

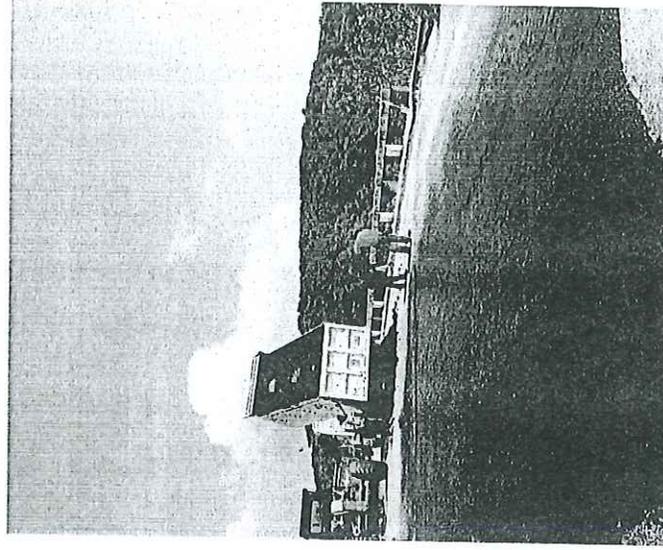

*(Signature)*  
**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM






**Gregorio Lopez Jimenez**  
 R.F.C. LQJ990919RU6, CÚRPLQJG990919HTCPMR00  
 CALLE-AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P:86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	FECHA:	24 MARZO DE 2022

13 RENIVELACION A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA DE RÍO-EMULSIÓN SUPERESTABLE), COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) CON MAQUINARIA, INCLUYE: ARENA, EMULSIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE LA MEZCLA

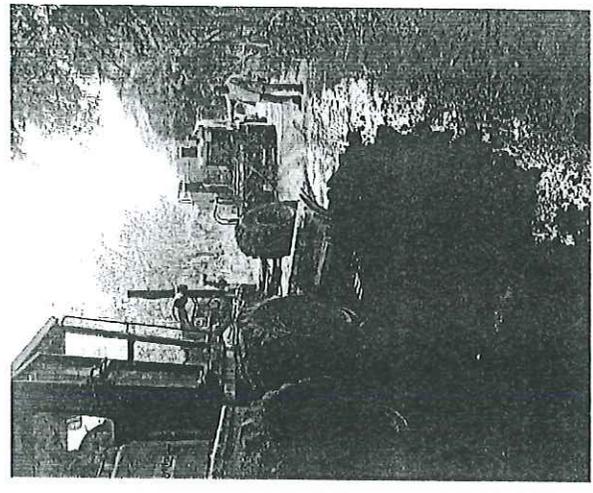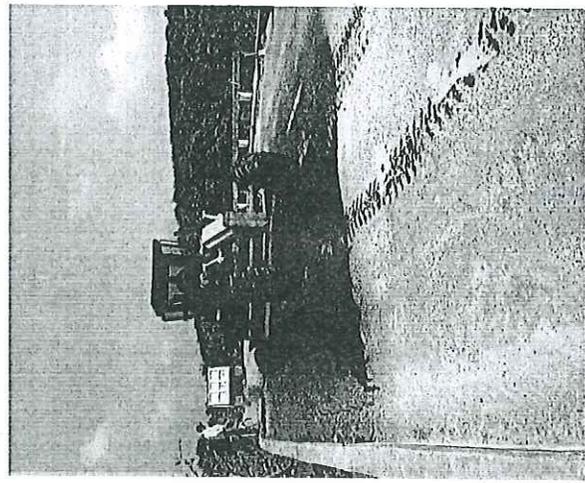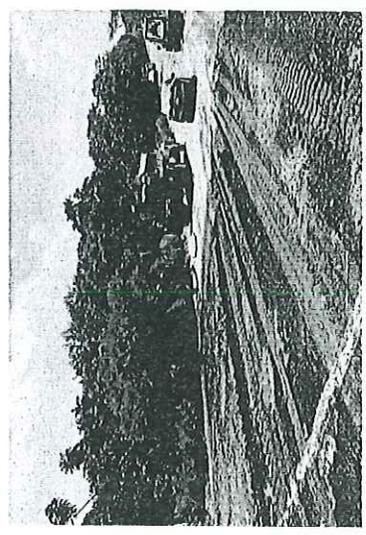

ARQ.-JOSE-JESUS-SARAO FELIX  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500



TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68

E-Mail: greglop.com ; reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN
	FECHA: 24 MARZO DE 2022

V PAVIMENTO ASFALTICO  
 14 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, PARA RECIBIR RIEGO DE IMPREGNACION

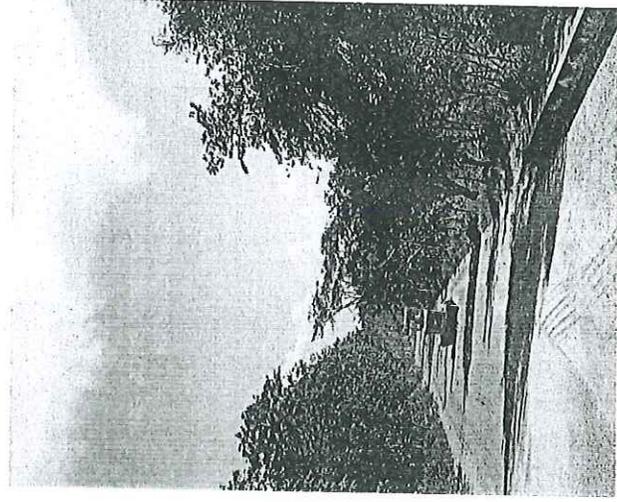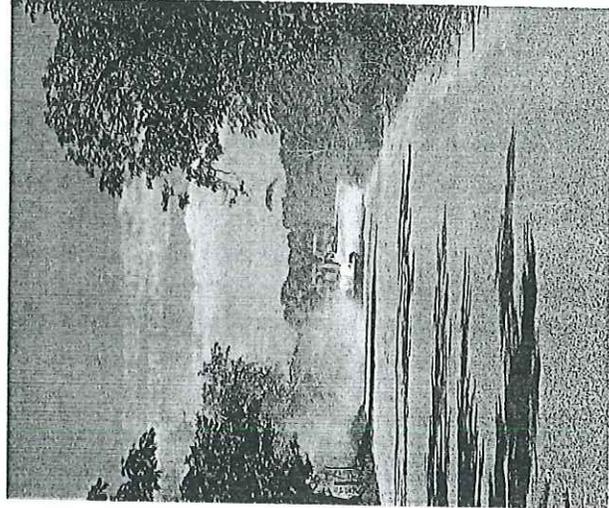

ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX  
 SUPERINTENDENTE DE OBRAS

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRAS DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJ990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE-AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68

E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

## ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** 10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008

**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021

**CONTRATO**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

**PERIODO**



DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

**LOCALIDAD**

022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN

**FECHA:** 24 MARZO DE 2022

15 EMULSIÓN ASFÁLTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN (BASE HIDRÁULICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65)

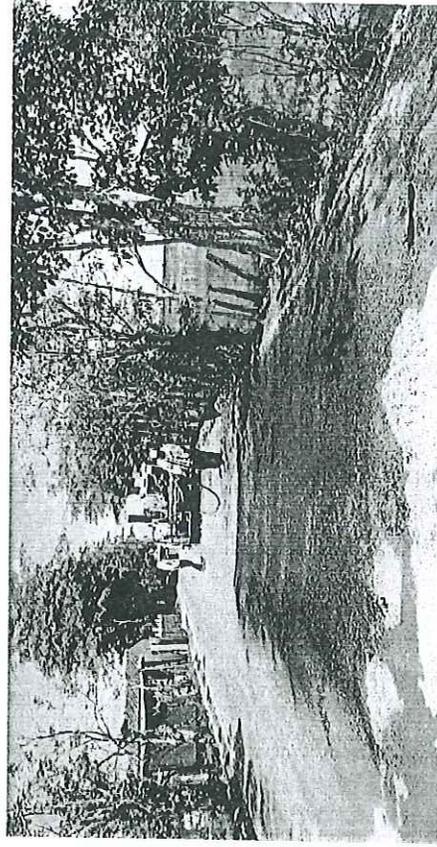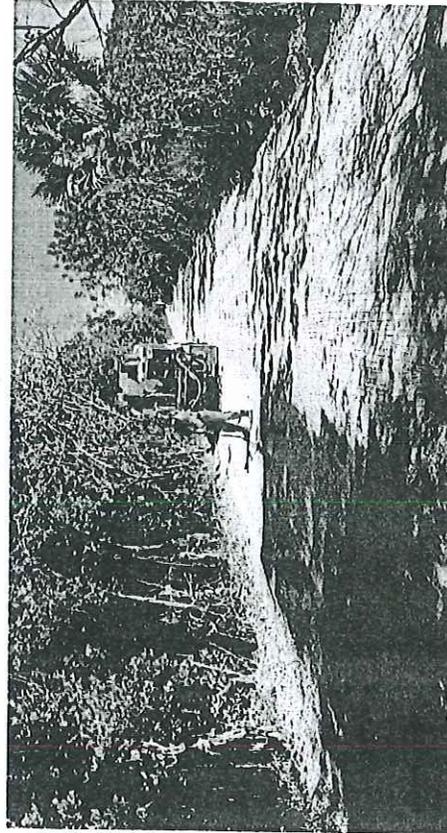

**ARG-JOSE-JESUS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** 10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008


**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS:** FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021

**CONTRATO:** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

**PERIODO:** DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

**LOCALIDAD:** 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN **FECHA:** 24 MARZO DE 2022

16 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CUBRIR BASE IMPREGNADA (POREO)

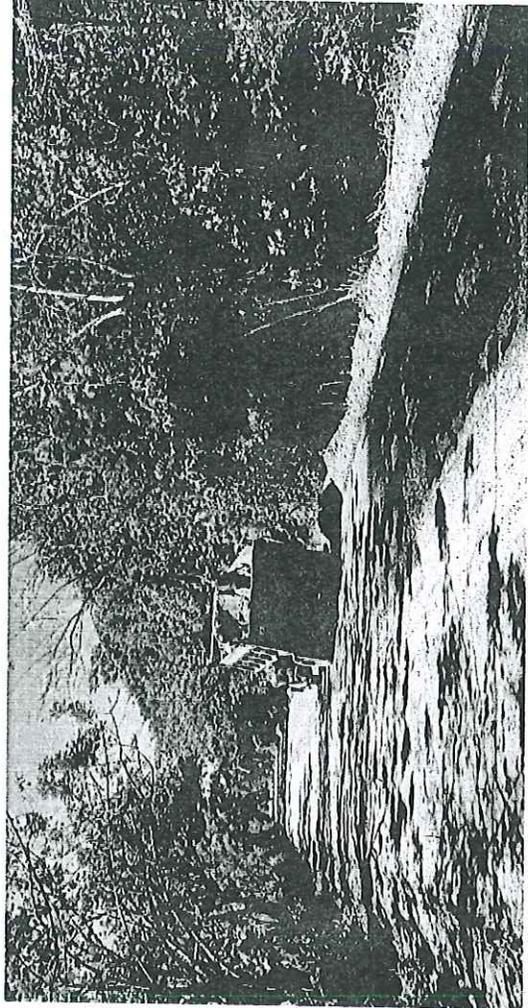

**ARO. JOSE JESUS SARAO FELIX**  
 -SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**



R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMFR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail: greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA:	10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008		
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021		
PERIODO	DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022		
LOCALIDAD	022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	FECHA:	24 MARZO DE 2022

17 BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MECANICOS, PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA

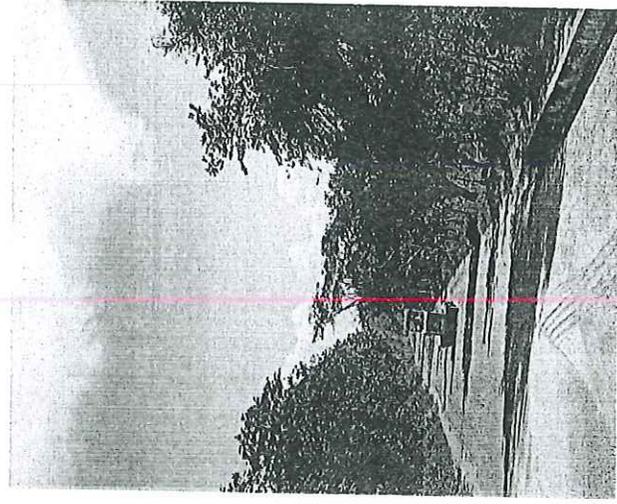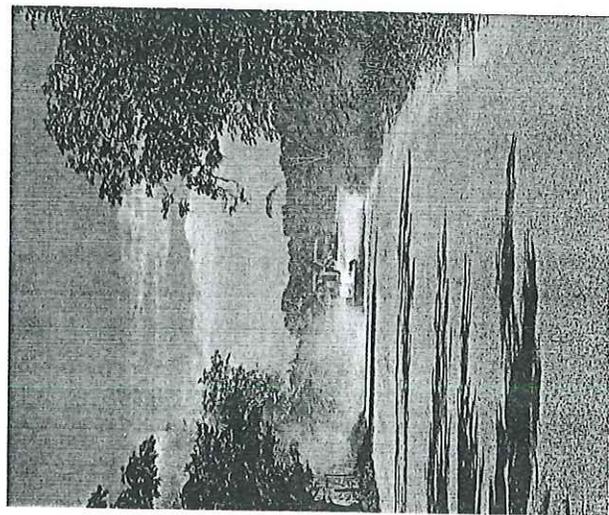

ARQ. JOSE JESUS SARAO FELIX  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.F.C. LOJG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68

E-Mail. greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

**OBRA:** I0001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008

**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS**

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021

**CONTRATO**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

**PERIODO**



DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

**LOCALIDAD**

022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN

**FECHA:** 24 MARZO DE 2022

18 EMULSIÓN ASFÁLTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE LIGA (SOBRECARPETA Y CARPETA, EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65)

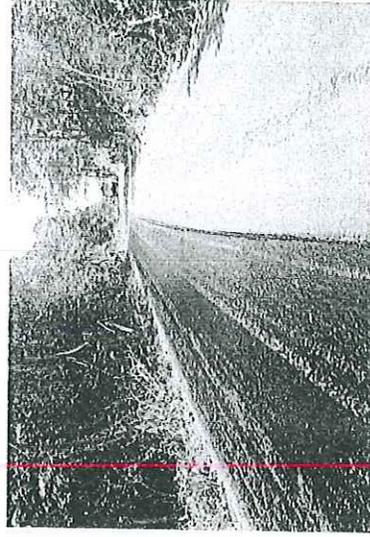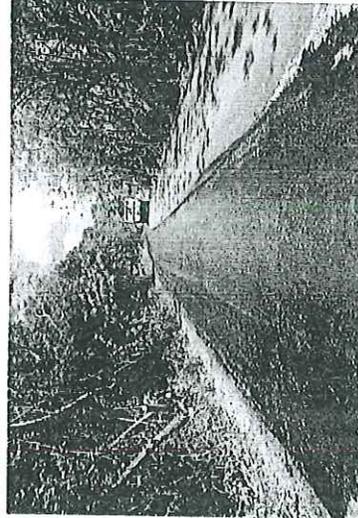

ARQ. JOSÉ JESÚS SÁRAO FÉLIX  
 -SUPERINTENDENTE DE OBRA-

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM



**Gregorio Lopez Jimenez**

R.E.C. LOIG990919RU6, CURP LOJG990919HTCPMR00  
 CALLE AURELIO SOSA TORRES No-95, COL. PUEBLO NUEVO  
 CARDENAS, TABASCO, MEXICO, C.P. 86500

TEL. (937) 190 - 69-76-, (937) 142-16-68  
 E-Mail. greglop.com : reg. imss e INFONAVIT: E7422501105

# ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: 10001.-REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA ENTIDADES (FISE)2021






CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

PERIODO DEL 04 DE ENERO DEL 202 AL 19 DE MARZO DEL 2022

LOCALIDAD 022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN

FECHA: 24 MARZO DE 2022

19 SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO (GRAVA DE 1/2" A FINOS) Y CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), NO INCLUYE EL COSTO DEL CEMENTO ASFÁLTICO

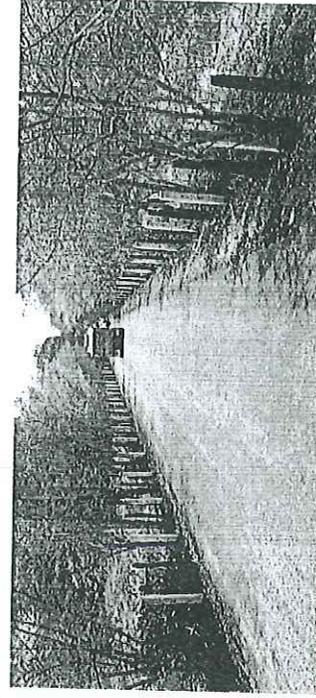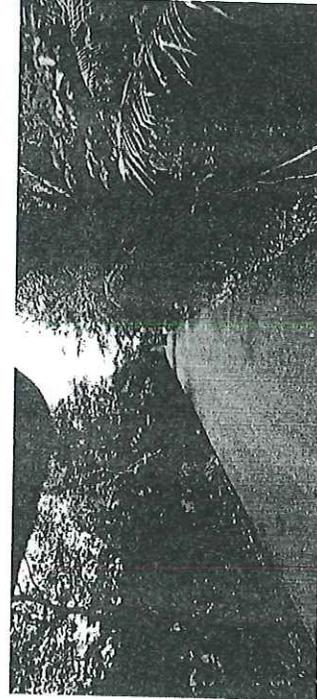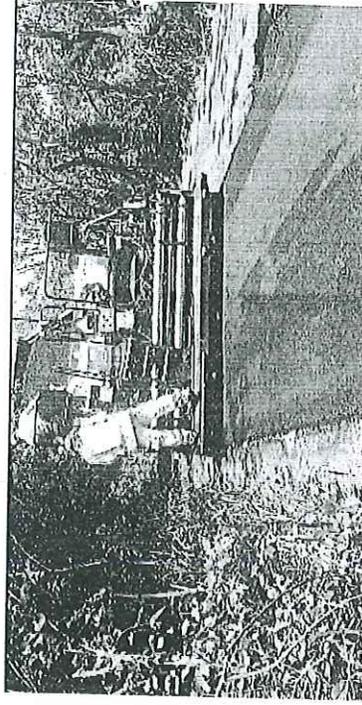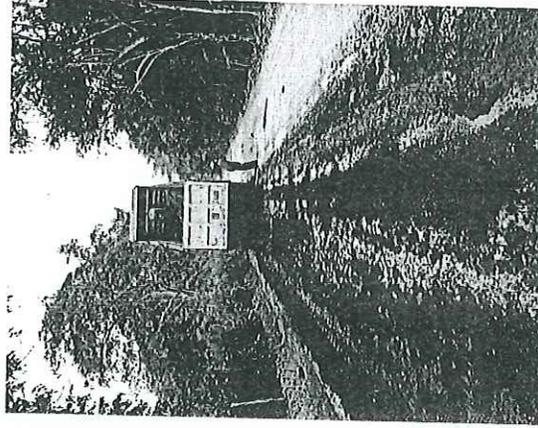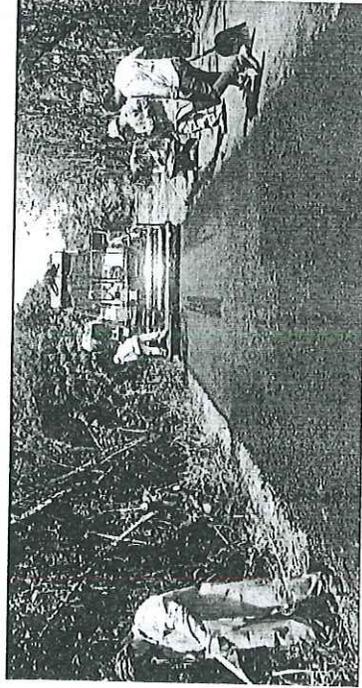

**ARO JOSE JESUS SARAO FELIX**  
 SUPERINTENDENTE DE OBRA

**ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ**  
 RESIDENTE DE OBRA DOOTSM

Nota No 01

Con esta fecha se apertura la presente bitácora para llevar el seguimiento de los trabajos relacionados con la Obra: OPES-008.- REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOMCAN, Ubicado en la Rta. CAMPO — PETROLERO MECOMCAN.

## Datos Generales:

Obra: Rehabilitación de Camino con mezcla Asfáltica en caliente en el municipio de Jalpa de Méndez, Rancharía campo petrolero mecoacan.

Nombre de Proyecto: OPES-008

Localidad: Rta. el campo Petrolero mecoacan

Origen de los Recursos: Fondo de Infraestructura Social para Entidades (FISE) 2021

Modalidad de ejecución: Contrato

Nº de Contrato: CTO-OP-MJAL-DOOSTM-FISE-004-2021

Importe de contrato: \$ 2,549,575.03

Importe de Anticipo: \$ 764,872.31

Fecha de Inicio de Contrato: 15 diciembre 2021

Fecha de terminación de contrato: 12 de febrero 2021

Plazo de ejecución: 60 días hábiles

Fecha de Inicio Diferida: 04 enero 2022

Fecha de terminación Diferida: 04 Marzo 2022

Empresa contratista: Gregorio Lopez Jimenez

Dirección: Calle Durilio Sosa Torres N.º 95

Col. Pueblo Nuevo, Cardenas, Tab.

Contancia Nota N° 01

Fianza de cumplimiento: 033643-00000

A Fianzadora: TOKIO MARINE HCC MEXICO, Compañia Aseguradora S.A de C.V


Monto: \$ 254,957.50

Fianza de Anticipo: 033641-00000


A Fianzadora: TOKIO MARINE HCC MEXICO, Compañia Aseguradora S.A de C.V

Monto: \$ 764,872.51

Firmas Autorizadas.



Ing. José Alfredo Jiménez González  
Residente de obra



Arq. José Jesús Saros Félix  
Superintendente

Nota N:02

04 Enero del 2022

Mediante oficio de fecha del 03 Enero del 2022, la Contratista solicita el diferimiento al plazo de ejecución de la obra, debido a que la Dirección de Finanzas Municipales se retraso en la entrega del pago del anticipo, por lo cual la Dirección de Obras Públicas y la Contratista, mediante oficio D0075M/002/2022 de fecha 04 de Enero del 2022, se ponen de acuerdo y establecen el diferimiento al plazo de ejecución de obra con fecha de inicio del 04 de Enero del 2022 al 04 de Marzo del 2022, celebrandose así un convenio de diferimiento de inicio de los trabajos, por el atraso en la entrega del anticipo



Ing. José Alfredo Jiménez González  
Presidente de obra.



Ing. José Jesús Sandoz Félix  
Superintendente

Nota No 3

06 Enero del 2022.

Al realizar recorrido por todo el tramo comprendido en el proyecto, se determina los tramos que deberan ser considerados cajas debido a lo dañado que se encuentra el arroyo del camino y se ubican según su cadeneramiento.

0+266.00	al	0+291.0	todo el carril
0+460.00	✓	0+510.0	✓
0+540.00	✓	0+620.0	Lado derecho
0+840.00	✓	0+880.0	Lado izquierdo
0+921.00	✓	0+981.0	todo carril
0+981.00	✓	1+025.0	Lado izquierdo
2+173.00	✓	2+220.0	Todo el carril
2+310.00	✓	2+408.0	Lado derecho
2+709.00	✓	2+770.0	Lado derecho
2+940.00	✓	3+020.0	Todo el carril
3+263.00	✓	3+267.0	En fase de agua
2+540.00	✓	2+544.0	✓
3+570.00	✓	3+590.0	Todo el carril

Cabe hacer mención que debido a esta situación se tendría que realizar un ajuste a la ejecución de cada uno de los conceptos con relación a su volumetría y es probable que la meta sea menor a la considerada en base a esto, se le autoriza a la empresa contratista la ejecución de los cajas en los cadeneramientos, aptos mencionados y a la generación de cantidades adicionales de los conceptos que por su naturaleza se requerirán. Cabe hacer mención que la carretera ha sufrido daños por el alto tráfico de camiones volteos de 14m<sup>3</sup> y maquinaria de Pemex que transitan continuamente por esta vía.

Ing. José Alfredo Jimenez Cruz  
Residente de obra

Ing. José Jesús Sarag Félix  
Superintendente

Nota No 04

10 de Enero del 2022

Se realizan trabajos de desmonte del camino, utilizando Moto compactadora, así también el material producido del desmonte, se junta en porciones a fin de retirarlos, de igual manera se realiza los tajos de los tiempos que se caejan tal es el e+266 al e+291.0. Trabajandose medio carril, a fin de permitir el paso de vehículos.

Ing. José Alfredo Jiménez Calz  
 Presidente obra

Ing. José Jesús Sosa Félix  
 Superintendente

Nota N° 05

12 Enero del 2022.

Se inician los trabajos de excavación en e+266. al e+291.0 se trabaja en medio carril a fin de no interrumpir el tráfico, se utiliza retroexcavadora para realizar los cajeros y cargar el material producido de la excavación a Camión volteo, así también se realiza la compactación del terreno natural después del corte.

Ing. José Alfredo Jiménez Calz  
 Residente de obra

Ing. José Jesús Sosa Félix  
 Superintendente

Nota N.º 06

14 Enero del 2022

Se prosiguen con los trabajos de cajeros en este día y se trabajó en el cadeneramiento 0+266 al 0+291 en carril derecho y así completar todo el carril, de igual manera se inician los rellenos con material de banco a fin de que no se interrumpa el tráfico. Se compacta con rodillo liso vibratorio, el material producto de la excavación se carga y se acarrea con camion de volteo



Ing. José Alfredo Jiménez Cruz  
Residente de obra




Ing. José Jesús Sarcos Félix  
Superintendente

Nota N.º 07

18 Enero del 2022

Se realiza cajero en 0+460 al 0+510.0, el material producto de la excavación se retira en camion volteo, se compacta el terreno natural despues del corte, así tambien se rellena con material de banco, el cual es compactado con rodillo liso vibratorio.



Ing. José Alfredo Jiménez Cruz  
Residente de obra




Ing. José Jesús Sarcos Félix  
Superintendente

Nota N° 08 20 Enero del 2022

Continua llegando material de banco "arenella" así como revestimiento, el cual se almacena en area determinada por la autoridad del lugar, se continúan con las excavaciones en cajas en 0+540 al 0+620 lado derecho, 0+840 al 0+880.0 lado izquierdo, 0+921 al 0+981, 0+981.0 al 1+025.0. El material producto de la excavacion es cargado a camion volteo y a solicitud de la delegada de la comunidad se les deposita en zonas bajas de la comunidad, así tambien en viviendas modestas

  
 Ing. José A. Jiménez Celis  
 Residente de obra

  
 Arq. José Luis Sarao Félix  
 Superintendente

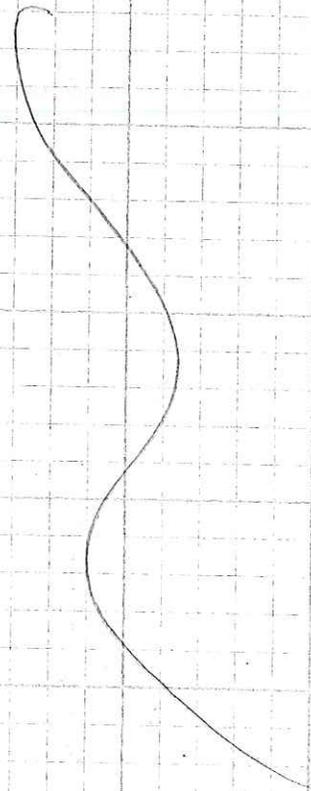

Nota N° 01

22 Enero del 2022

Se realiza el relleno de cajas 0+540.0 al 0+620.0  
0+840 al 0+880.0 y se hace excavación en 0+921 al  
0+981, 0+981 al 1+025, retirándose el material  
producto de la excavación el cual se entrega a  
la comunidad, también se realiza el tendido  
nivelado y compactado de revestimiento en cajas  
0+266 al 0+291, 0+460 al 0+510, 0+540 al 0+620  
0+840 al 0+880, También se realiza el relleno y  
compactado de material de banco "arenilla" en  
0+921 al 0+981, 0+981 al 1+025, llega personal  
de laboratorio de Mecánica de Suelos y verifican  
mediante calas, la compactación del terraplen en cajas  
terraplenadas y con base hidráulica

Ing. José Alfredo Jiménez Calz

Arq. José Jesús Sarao Félix

Nota N° 10

24 Enero del 2022

La contratista incrementa su fuerza de Trabajo, a fin de agilizar los trabajos y debido a las proximidades de lluvia, se realiza el trazo y se inician las excavaciones en cadenamiento 2+173 al 2+220, 2+310 al 2+408, 2709 al 2+2770, así también el material producto de la excavación es retirado, Así también se realiza el relleno con arenilla en las cajas realizadas y también se realiza el tenido y compactado de Base Hidráulica en cajas realizadas.

Ing. Jose Alfredo Jimenez Ciler.  
Residente de obra

Arq. Jose Jesus Sano Felix.  
Superintendente.

Nota Nº 11 26 Enero del 2022


Se realiza el trazo, excavación de cajas, en los codenamientos 2+940 al 3+020, 3+263 al 3+267, 2+540 al 2+544, 3+570 al 3+590, así también se realiza el retiro del material producto de excavación así también se realiza el relleno y compactado de cajas realizadas y se les tiende a fina y compacta la Base Hidráulica.



Ing. José Alfredo Jiménez González.  
Residente de obra



Arq. José Jesús Saro Félix  
Superintendente.



Nota N° 12 28 Enero de 2022

Debido a las proximidades de las lluvias se le indica a la contratista que será necesario realizar el barrido y realizar el riego de impregnación y el pereo de los tramos a los cuales se le realizó ya el tendido y compactado de la Base Hidráulica de los cajeros realizados, este día llega la petrolizadora y se inician los trabajos de impregnación en los tramos del 0+266 al 0+291 y en 0+460 al 0+510, 0+540 al 0+620, lado derecho, 0+840 al 0+880 lado izquierdo, y 0+921 al 0+981, 0+981. Al 1+025, 2+173 al 2+220, 2+310 al 2+408, al 2+2770, 2+940 al 3+020, 3+263 al 3+267, 2+540 al 2+544, 3+570 al 3+590.

  
Ing. José Alfredo Jiménez Glez.  
Residente de Obra.

  
Arq. José Jesús Saro Félix  
Superintendente.

Nota #13 31 de Enero del 2022

Se realiza el barrido y el riego de liga para la aplicación de Mezcla en firo del cadeneramiento 0+200 al 0+291 en todo lo ancho del Arroyo del camino 0+460 al 0+510, 0+540 al 0+620, todo desde 0+540 al 0+880 fello 159, 0+921 al 0+981, 0+981 al 1+025, 2+173 al 2+320, 2+310 al 2+408, 2+409 al 2+770, 2+740 al 3+020 3+263 al 3+267, 3+540 al 2+544, 3+370 al 3+590.

  
Ing. Jose A. Jimenez Cej  
Residente obra.


  
Arq. Jose Jesus Barao Felix  
Superintendente

Nota 13 bis

06 Febrero del 2022

Debido a las constantes precipitaciones pluviales, no se laboran los dias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pues las condiciones del terreno impiden, por encontrarse saturados de agua, y con las lluvias, no se realiza actividad alguna.

  
Ing. Jose A. Jimenez Cej  
Residente de obra

  
Arq. Jose Jesus Barao Felix  
Superintendente

Nota No 14

07 Febrero del 2022

La contratista Hace entrega de numeros generadores y estimación, de los trabajos ejecutados correspondiente al mes de enero periodo del 04 al 31 de enero del 2022.

Asi tambien a partir de hoy se autoriza la Suspencion de los trabajos por petición de la contratista.

Ing. José Alfredo Jimenez Glez.  
Residente de Obras.

Arq. José Jesus Sano Felix  
Superintendente.

Nota No 15

07 Febrero del 2022

Este dia no se labora en la obra: debido a las fuertes lluvias presentadas en esta localidad de campo petrolero mecoacan. Durante toda la jornada haciéndose efectiva la suspensión de los trabajos.

Ing. José A Jimenez G.

Arq. José Jesus Sano Felix

Nota # 16 08 de febrero 2022

Este día tampoco se puede realizar actividad alguna en los trabajos amparados en este contrato debido a las intensas lluvias presentadas durante la jornada de trabajo, debiendo dejar los viajes de mezcla en frío cubierto a fin de protegerlo del agua ya que esta hace que pierda su consistencia, y en cumplimiento a la suspensión otorgada por la DDOTSM.




Ing. Jose A. Jimenez Glez  
Residente de obra

Arq. Jose Luis Sarao Felix  
Superintendente

Nota # 17 09 de febrero del 2022.

continúan las lluvias intensas en esta zona que debido a su ubicación en la costa, hace que los temporales de lluvia sean más continuos en esta época debido a esto, no se realiza actividad alguna en la obra en campo petrolero Mecoa can, en cumplimiento a suspensión otorgada por la DDOTSM.




Ing. Jose A. Jimenez Glez  
Residente de obra

Arq. Jose Luis Sarao Felix  
Superintendente


Nada #18

11 de febrero 2022

se continúa Sin realizar actividad alguna en la obra denominada: Rehabilitación de camino con mezcla asfáltica en caliente en el Municipio de Jalpa de Méndez ubicada en rancharía campo petropro Mecoaacan debido a las intensas lluvias presentadas en esta zona, así también se observa el paso de camiones de volteos de  $14m^3$  cargados con arenilla, de manera continua en esta jornada se contaron 9 camiones y cada uno realiza 8 vueltas, hago mención a esto pues al entrar parados los trabajos, vemos como el peso de los camiones de volteo a gran velocidad dañan el arroyo de la carretera incluyendo los trabajos que venimos realizando, se continúan las inactividades en cumplimiento a suspensión otorgada por la DEOTSM.




Ing. José A. Jimenez Colon  
Residente




Lic. José Jesús Sáenz Félix  
Superintendente

Nota. 19 12 de Febrero 2022


Este día tampoco se puede realizar alguna en los trabajos amparados en este contrato debido a las intensas lluvias presentadas durante la Jornada de Trabajo, y en cumplimiento a suspensión otorgada por la DOSTM.

  
Ing. Jose Alfredo Jimenez Alez.  
Residente de Obra.

  
Arq. Jose Jesus Sarao Felix  
Superintendente.

Nota. 20 14 de Febrero 2022

Continúan las lluvias intensas en esta zona que debido a su ubicación en la costa, hace que las temporadas de lluvias sean más intensas y continuas en estas fechas, debido a esto no se realiza actividad alguna en la obra en campo petrolero mecoacan, dando cumplimiento a suspensión otorgada por la DOSTM.

  
Ing. Jose Alfredo Jimenez Alez.  
Residente de Obra.

  
Arq. Jose Jesus Sarao Felix  
Superintendente.

Nota # 21 15 de Febrero 2022

Continúan las lluvias intensas en esta zona que debido a su ubicación en la costa, hace que las temporadas de lluvias sean mas continuas en esta epoca, debido a esto no se realiza actividad alguna en la obra en Campo petrolero Mecoaacan dando cumplimiento a suspensión otorgada por la DOSTSM.

Ing. José A. Jiménez Ulez.  
Residente de Obra

Arq. José Jesús Sarao Félix  
Superintendente.

Nota # 22 16 de Febrero 2022

Este día tampoco se puede realizar actividad alguna en los trabajos amparados en este contrato debido a las intensas lluvias presentadas durante la jornada de trabajo, dando cumplimiento a suspensión otorgada por la DOSTSM.

Ing. José A. Jiménez Ulez.  
Residente de Obra

Arq. José Jesús Sarao F.  
Superintendente.

Nota # 23

17 de Febrero 2022

Continúan las lluvias intensas en esta zona que debido a su ubicación en la costa, hace que las temporadas de lluvias sean más continuas en esta época, debido a esto no se realiza actividad alguna en la obra en campo Petrolero Inceocan, dando cumplimiento a suspensión otorgada por la DORTSA.


  
Ing. José Alfredo Jiménez Gil  
Presidente de Obra

  
Arq. José Carlos Sarao Félix  
Superintendente.

Nota # 24

18 de Febrero 2022

Este día tampoco se puede realizar actividad alguna en los trabajos amparados en este contrato debido a las intensas lluvias presentadas durante la jornada de trabajo, dando cumplimiento a suspensión otorgada por la DORTSA.

  
Ing. José Alfredo Jiménez Gil  
Presidente de obra.

  
Arq. José Carlos Sarao F.  
Superintendente.

Nota # 25

22 de febrero del 2022.

Este día se reinician las actividades ampuadas en este contrato, realizando barrido en 0+000 al 0+007.50 en area de cabezal del puente ase tambien se realiza riego de impregnacion para posteriormente nivelar con mezcla en frio en la bajada del puente, posteriormente se realiza el barrido del 0+020.0 al 0+243.0, posteriormente se aplica el riego de liga y se procede con el tendido y nivelado de mezcla en frio, Tambien se realiza el barrido de cadeneramiento 0+353.0 al 0+435.0 dejando preparada la Superficie para recibir el riego de liga con emulsion, este dia dimos parte a la delegado Municipal del lugar que el letrero afisivo a la obra en cuestion fue robado del lugar donde se encontraba instalado, asi tambien se le indica a la contratista, que debera entregar reprogramacion de obra de acuerdo a convenios de obra establecido


Ing. Jose A. Jimenez  
Presidente de obra

Arq. Jose Jesus Berroa Felix  
Suplente

Nota # 26

25 de febrero del 2022.

En cadeneramiento  $0+353.0$  al  $0+455.0$  se aplica el riego de liga con emulsion, realizandose el tendido y nivelado de Mezcla en frio, el tendido se realiza con la motocoformadora, compactandose con el doble rodillo. Tambien se barre con equipo mecanico del cadeneramiento  $0+740$  al  $0+820.0$ , aplicandose el riego de liga con emulsion y tendiendo y nivelando la mezcla en frio con motocoformadora, y compactandose con doble rodillo, de igual manera se realiza barrido del cadeneramiento  $0+840.0$  al  $0+900.0$  y tambien el riego de liga, el tendido de mezcla en frio con motocoformadora compactandose con doble rodillo, este dia llega personal de laboratorio y toman muestras de emulsion, mezcla en frio.




ing. Alfredo Jimenez Cely  
Residente de obra

ing. José Jesús Sarcos Félix  
Superintendente


Nota # 27

27 Febrero del 2022.

Se realiza barrido con equipo mecanico en cadenamiento  $0+1007.50 - 0+1000$ , asi tambien se realiza el riego de liga y se realizo el tendido de carpeta asfaltica en caliente en area del cabozal del puente el revolcadero



Ing. Jose A. Jimenez Cabez  
Presidente de obra



Arq. Jose Jesus Sarao Felix  
Superintendente


Nota # 28

28 Febrero del 2022

Se realiza el barrido con equipo mecanico del cadenamiento  $0+243$  al  $0+353$ , asi tambien se realiza el riego de liga, procediendose con el tendido de carpeta asfaltica en caliente con la finisher, compactandose con doble rodillo y con el compactador a base de neumaticos



Ing. Jose Alfredo Jimenez Cabez  
Presidente de obra



Arq. Jose Jesus Sarao Felix  
Superintendente

Nota # 29

07 Marzo del 2022

Este día se realiza un recorrido y se observan en los tramos que no se pondrá carpeta pero si el sello, zonas calaveradas por lo cual se procede con su barrido en forma manual y con su respectivo riego de impregnación a fin de proceder con la nivelación de esta zona con mezcla en fofo, compactándose con el doble rodillo.

Ing. José A. Jiménez Gtz.  
Residente de obra

Arq. José Jesús Sarco Félix  
Superintendente

Nota #30 08 Marzo del 2022

Este día se presentan en el framo de trabajo las siguientes personalidades:

Por el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco  
Ing. Carlos Harro Suárez Hdez.: Director de la DEOTSM.

Ing. Jose A. Jiménez Glez.: Residente de obras de la DEOTSM

L.T.C. Manuel Antonio Cortez Pérez: Director de Programación UPFAL

Ing. Carlos Alberto Morales Ramón: Subdirector de Programación UPFAL

Mtro. Cristian David Coronel Santos: Contratador Municipal.

Arq. Abelardo Alejandro Ramírez: Jefe de Supervisión Contratos

Por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático del Gobierno del Estado.

Ing. Omar Antonio Hernández Martínez: Enlace Regional

Arq. Alan Rosas Ricardes: Supervisor de obras.

Por la Empresa contratista

C.P. Felipe Meuto Torres Representante

Arq. Jose Jesus Suroo Felix: Superintendente

con la finalidad de constatar los avances de los trabajos así como verificar la condición física del camino objeto de este contrato, así también se expone que debido al replanteamiento del proyecto planteado al inicio de los trabajos y descrito en Nota de Bitácora N.º 3 de fecha 06 de enero del 2022, se deberá de elaborar un convenio de reducción de Metas, así también la contratista ratifica su compromiso de concluir los trabajos el día 19 de Marzo del 2022.

Ing. Jose A. Jiménez Glez.  
Residente de obra

Arq. Jose Jesus Suroo Felix  
Superintendente

Nota # 4

14 Marzo del 2022

Se realiza nivelación de zonas calaveradas en 0+640 al 0+680 realizándose compactación con doble rodillo, así también se realiza el barrido por medios mecánicos del advenimiento 0+445 al 0+760 realizándose también el riego de liga mediante el uso de la petrolizadora, de igual manera se procede con el tendido, nivelado y compactado de carpeta asfáltica con mezcla caliente, se presenta persona de laboratorio para tomar muestras de emulsión y de mezcla caliente utilizada en este tramo.


Ing. José A. Jiménez  
Residente Obra

Ing. José Jesús Sarcos Félix  
Superintendente

Nota # 32

15 de Marzo del 2022



Este día se realiza el barrido por medios mecánicos del cadeneramiento 0+760.0 al cadeneramiento 1+145.0 a la derecha, así también se hace el riego de liga y se procede con el tendido y nivelado de carpeta asfáltica en caliente en esta ala, posterior al tendido y nivelado queda delante la banda de trabajo el doble rodillo y el compactador de neumáticos compactando este tramo de carpeta.

Ing. José A. Jiménez Glez  
Residente de obraArq. José Jesús Sargol Félix  
Superintendente

Nota # 33

16 de Marzo del 2022

Se realiza el barrido por medios mecánicos en cadeneramiento 0+760 al cadeneramiento 1+145 a la izquierda procediéndose a realizar el riego de liga con emulsión y con el tendido, nivelado y compactado de carpeta asfáltica en caliente.

Ing. José A. Jiménez Glez  
Residente de obraArq. José Jesús Sargol Félix  
Superintendente

Nota #24

17 de Marzo del 2022.

Este día Realizamos el barrido por medios mecanicos como trabajo previo para la aplicacion del sello, esta actividad se tiene que realizar de forma continua debido al alto numero de vehiculos que transitan por esta via, en su mayoria camiones de volteo, en esta Jornada se realiza el tendido de Sello premezclado sincronizado del cadenamiento 0+000 al 0+620,0

Ing. Jose A. Jimenez Ceballos  
Residente de obra

Arq. Jose Jesus Sarao Felix  
Superintendente

Nota #25

18 de Marzo del 2022

Este día se realiza el barrido por medios mecanicos del cadenamiento 0+620 al 1+145, y se procede con el Tendido de Sello premezclado sincronizado.

Ing. Jose A. Jimenez Ceballos  
Residente de obra.

Arq. Jose Jesus Sarao Felix  
Superintendente

Nota # 36

19 de Marzo del 2022.

Este día se realiza la aplicación de pintura en rayas lateral continua en zonas laterales del 0+000 al 1+145. así también se aplica también de la pintura en área central de carretera; este día la contratista da por concluidos los trabajos amparados en este contrato, quedando en espera a fin de que los trabajos ejecutados sean recepcionados de conformidad.

Ing. Jose Alfredo Jimenez Cez  
Residente de obra

Arq. Jose Jesus Sargol Felix  
Superintendente

Nota # 37

25 de Marzo del 2022

Este día la contratista entrega estimación N°3 parcial y estimación N°4 finiquito de cantidades adicionales para su revisión.

Ing. Jose A. Jimenez Cez  
Residente de obra

Arq. Jose Jesus Sargol Felix  
Superintendente



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
HEROÍSMO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## ACTA DE RECEPCION FISICA CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD:022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN, JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 08:30 HRS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2022 SE ENCUENTRAN EL ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO;C.GREGORIO LOPEZ JIMENEZ(PERSONA FISICA): PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA:10001.- REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ,RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN.(FISE)(REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008.

### DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad
A	PRELIMINARES		
I	PRELIMINARES		
2	DESORILLE CON EQUIPO MOTO CONFORMADORA P.U.O.T.	HA	0.32
II	TERRACERÍAS		
3	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, EN AMPLIACIONES DE CORTE, EN ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA Y/O DE TERRAPLENES EXISTENTES.	M³	176.76
5	COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL CON EQUIPO MECÁNICO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) M.V.S.M.	M³	66.29
6	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (ARENILLA), EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU M.V.S.M.	M³	132.57
7	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES DE TERRENO.	M³	212.11
8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES DE TERRENO AL PRIMER KILÓMETRO SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS, TARIFA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.	M³/KM	212.11
10	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EMPLEANDO MATERIAL PÉTREO TRITURADO, GRAVA DE 1 ½" A FINOS, COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M.	M³	69.29
III	RENIVELACION		
11	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MANUALES, PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA.	HA	0.36

6



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**ACTA DE RECEPCION FISICA  
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021**

12	EMULSIÓN ASFÁLTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE LIGA (RENIVELACIÓN, EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65).	L	4,402.17
13	RENIVELACION A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA (ARENA DE RÍO-EMULSIÓN), COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) CON MAQUINARIA, INCLUYE: MATERIAL YA ELABORADO.	M³	31.20
V	PAVIMENTO ASFÁLTICO		
14	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA RECIBIR RIEGO DE IMPREGNACIÓN.	HA	
15	EMULSIÓN ASFÁLTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE IMPREGNACIÓN (BASE HIDRÁULICA, EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65).	L	
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA PARA CUBRIR BASE IMPREGNADA (POREO).	M³	
17	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA.	HA	0.49
18	EMULSIÓN ASFÁLTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE LIGA (SOBRECARPETA Y CARPETA, EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65).	L	5,888.97
19	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO (GRAVA DE 1/2" A FINOS) Y CEMENTO ASFÁLTICO PG 64-22 COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), MATERIAL YA ELABORADO.	M³	243.23
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO CON EQUIPO COMPUTARIZADO, INCLUYE: EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO MODIFICADA CON POLÍMERO TIPO I ALTA VISCOSIDAD PARA RIEGO DE LIGA, SELLO 3-A PREMEZCLADO CON ASFALTO PG 64-22.	M²	5,766.86
VI	SEÑALAMIENTO		

6

9



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
DESCUBRIDOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**ACTA DE RECEPCION FISICA  
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021**

21	RAYA LATERAL SENCILLA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR HÚMEDO DE 21 MILÉSIMAS DE PULGADA (0.5334 MM) CON PINTURA PARA TRÁNSITO 100% ACRÍLICA BASE AGUA COLOR BLANCO PARA TODO CLIMA (AWP) MARCA 3M O SIMILAR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO (0.262 KG/M <sup>2</sup> ) Y ELEMENTOS CERÁMICOS (0.109 KG/M <sup>2</sup> ) APLICADOS CON EQUIPO.	M	2,290.00
22	RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR HÚMEDO DE 21 MILÉSIMAS DE PULGADA (0.5334 MM) CON PINTURA PARA TRÁNSITO 100% ACRÍLICA BASE AGUA COLOR AMARILLO PARA TODO CLIMA (AWP) MARCA 3M O SIMILAR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO (0.262 KG/M <sup>2</sup> ) Y ELEMENTOS CERÁMICOS (0.109 KG/M <sup>2</sup> ) APLICADOS CON EQUIPO.	M	1,145.00
<b>CANTIDADES ADICIONALES</b>			
II	<b>TERRACERIAS</b>		
3	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE, EN AMPLIACIONES DE CORTE, EN ABATIMIENTO DE TALUDES, EN REBAJES DE LA CORONA Y/O DE TERRAPLENES EXISTENTES.	M <sup>3</sup>	810.59
5	COMPACTACIÓN DE LA CAMA DE LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL CON EQUIPO MECÁNICO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) M.V.S.M.	M <sup>3</sup>	495.99
6	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE RELLENO PARA FORMAR LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE BANCO (ARENILLA), EN LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO EXCAVACIÓN ADICIONAL AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU M.V.S.M.	M <sup>3</sup>	431.39
7	CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES DE TERRENO.	M <sup>3</sup>	972.21
8	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES Y EXCAVACIONES DE TERRENO AL PRIMER KILÓMETRO SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS, TARIFA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.	M <sup>3</sup> /KM	972.21

9 4



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores**  
Año de **Maadón**  
PEREGRINACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**ACTA DE RECEPCION FISICA**  
**CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021**

10	CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EMPLEANDO MATERIAL PÉTREO TRITURADO, GRAVA DE 1 ½" A FINOS, COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M.	M <sup>3</sup>	356.86
VI	SEÑALAMIENTO		
20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO CON EQUIPO COMPUTARIZADO, INCLUYE: EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO MODIFICADA CON POLÍMERO TIPO I ALTA VISCOSIDAD PARA RIEGO DE LIGA, SELLO 3-A PREMEZCLADO CON ASFALTO PG 64-22.	M <sup>2</sup>	1290.97

**DATOS DEL CONTRATO**

No. DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021  
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 FECHA INICIO DIFERIDA: 04 DE ENERO DEL 2022  
 FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO: 12 DE FEBRERO DEL 2022  
 FECHA DE TERMINACION DIFERIDA: 04 DE MARZO DEL 2022  
 FECHA DE TERMINACION REAL POR CONVENIO DE SUSPENSION TEMPORAL: 19 DE MARZO DEL 2022  
 PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS NATURALES  
 IMPORTE AUTORIZADO: \$ 2,600,000.00  
 IMPORTE CONTRATADO: \$ 2,549,575.03  
 IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 2,549,549.27

**FIANZAS**

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 033643-00000  
 EMPRESA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.  
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 03 DE DICIEMBRE 2021  
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 033641-00000  
 EMPRESA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.  
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 03 DE DICIEMBRE 2021  
 No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS: \$ 254,954.93

EMPRESA AFIANZADORA: TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑIA AFIANZADORA, S.A. DE C.V.

4 9



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**Ricardo  
Flores  
Magón**  
Año de  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## ACTA DE RECEPCION FISICA CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021

FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 23 DE MARZO DEL 2022  
 PERIODO DE EJECUCION  
 FECHA DE INICIO: 15 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 FECHA DE TERMINACION: 12 DE FEBRERO DEL 2022

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
01 (UNO) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 409,874.57	\$ -
02 (DOS) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES.	\$ 608,418.43	\$ -
3 (TRES) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 1,471,759.59	\$ -
04 (CUATRO) FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	\$ 59,496.68	\$ -
	\$ 2,549,549.27	\$ -

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE

QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA. LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001 JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 24 DE MARZO DEL 2022.

\_\_\_\_\_  
ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA

\_\_\_\_\_  
C.GREGORIO LOPEZ JIMENEZ  
ADMINISTRADOR UNICO



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
Precursor de la Revolución Mexicana**

## ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

**CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021**

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL 24 DE MARZO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING.CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO;ING.JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ ,EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C.GREGORIO LOPEZ JIMENEZ EN SU CARACTER DE (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

### I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021
FECHA DE FORMALIZACION:	03 DE DICIEMBRE DEL 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	10001.- REHABILITACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, RANCHERIA CAMPO PETROLERO MECOACAN.(FISE) (REFRENDO 2021) ANTES OPFS-008
MONTO AUTORIZADO:	\$ 2,600,000.00
MONTO CONTRATADO:	\$ 2,549,575.03
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ -
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	60 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO DIFERIDA	04 DE ENERO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	12 DE FEBRERO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION DIFERIDA	04 DE MARZO DEL 2022
FECHA DE TERMINACION MEDIANTE CONVENIO DE SUSPENSION TEMPORAL	19 DE MARZO DEL 2022

### II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
01 (UNO) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	03-feb-22	DEL	04/01/2022	AL	31/01/2022	\$ 409,874.57 \$ 409,874.57
02 (DOS) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES.	03-feb-22	DEL	04/01/2022	AL	31/01/2022	\$ 608,418.43 \$ 1,018,293.00
3 (TRES) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS	20-mar-22	DEL	17/02/2022	AL	19/03/2022	\$ 1,471,759.59 \$ 2,490,052.59
04 (CUATRO) FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	20-mar-22	DEL	17/02/2022	AL	19/03/2022	\$ 59,496.68 \$ 2,549,549.27

*[Handwritten signatures and initials]*



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA**

**ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO  
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021**

**III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD**

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 036142-00000 EXPEDIDA POR AFIANZADORA TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑÍA AFINZADORA, S.A DE C.V., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. GREGORIO LOPEZ JIMENEZ REPRESENTANTE LEGAL, MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FISE-004-2021 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL 24 DE MARZO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ**

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**POR EL CONTRATISTA**

C. GREGORIO LOPEZ JIMENEZ  
ADMINISTRADOR UNICO
