

POBLADO AMATITÁN JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A 20 DE DICIEMBRE DE 2021.

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

ASUNTO: SOLICITANDO REHABILITACIÓN DE CARRETERA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : **REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO** YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDICIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.



C. MARICELA DEL CARMEN TRIANO SEGOVIA

DELEGADO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN: 2 DE FEBRERO DE 2022

OBRA No.: 10082

ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 2 DE FEBRERO DE 2022

La Comunidad de: POBLADO AMATITÁN
del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1 + 254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: LA OBRA INCLUYE BACHEO SUPERFICIAL Y CALAVEREO EN CARPETA ASFÁLTICA DE 10 CM DE ESPESOR, RENIVELACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA Y SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE CON MATERIAL PÉTREO GRAVA DE UNO Y MEDIO A FINOS.

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometan a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
COORDINACIÓN DE DELEGADOS
MUNICIPALES

FIRMA: _____
NOMBRE C. MARICELA DEL CARMEN TRIANO SEGOVIA
CARGO DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



2021-2024



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Magón
Año de
1922
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA**

*DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES*

Jalpa de Méndez, Tabasco a 13 de abril de 2022

DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA

Para la contratación y ejecución de la obra: 10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, Localidad: 0002.-POB. Amatitán del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

ANTECEDENTES

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales dentro de sus facultades establecidas en el artículo 84 fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra la de participar en la planeación y elaborar el Programa de Obras Públicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuesto de las mismas. Estas acciones se llevan a cabo siempre y cuando se disponga de presupuesto en el ejercicio fiscal correspondiente y estos recursos se encuentren dentro del Programa Anual de Obras Públicas del Municipio.

El suscrito Titular de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales cuenta con facultades para la celebración del presente Dictamen de Excepción de Licitación Pública en base al Nombramiento, otorgado por el C. Presidente Municipal y expedido por el Director de Administración, el cual a la presente fecha se encuentra vigente.

FUNDAMENTACIÓN

Con fundamento en lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se emite el presente Dictamen para la contratación conforme al procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas referente a los trabajos de la obra: 10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, Localidad: 0002.-POB. Amatitán

Por lo que con base en los artículos 3º, fracción I, 24,30, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que a la letra dicen:

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature area]



Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran Obra Pública:

1.- La construcción, reconstrucción, modificación, remodelación, instalación o mantenimiento de bienes inmuebles e infraestructura, que por su naturaleza o por disposición de la Ley sean destinados a un servicio público o al uso común.

Artículo 24.- la programación de los recursos de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas no podrán rebasar un ejercicio presupuestal, salvo que se cuente con autorización de la secretaria, el COPLADET, la Tesorería Municipal, o en su equivalente, según sea el caso, en los términos del artículo 25 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.

Artículo 30.- Bajo su responsabilidad, las Dependencias y Entidades podrán contratar Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

- I. **Licitación Pública**
- II. **Invitación a Cuando Menos Tres Personas**
- III. **Adjudicación Directa**

En los procedimientos de contratación, deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normatividad aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo a las Dependencias y Entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 44.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevé el artículo 46 del presente ordenamiento jurídico, las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán optar por no llevar acabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de las modalidades de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.

La opción de las Dependencias y Entidades ejerzan deberá motivarse, según las circunstancias que concurran encada caso, en criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.

La opción de las Dependencias y Entidades ejerzan deberá motivarse, según las circunstancias que concurran encada caso, en criterios de economía, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.

En todo caso se convocará a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo a las características de los trabajos a ejecutar y se apruebe previamente por el comité de la Obra Pública.

[Faint signature and stamp area]



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
PRELUSTRO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Artículo 46.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas, a través de los procedimientos de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando el importe de cada operación no exceda de los montos máximos que se establezcan en el Reglamento de esta Ley en la inteligencia de que, en ningún caso, este importe deberá fraccionarse para quedar comprendido en los supuestos a que se refiere este artículo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

La presente obra tiene la finalidad de mejorar la superficie de rodamiento a base de recarpeteo asfáltico en el poblado Amatitlán del municipio de Jalpa de Méndez, del estado de tabasco, para lo cual se llevarán a cabo las siguientes acciones: desorille con equipo Motoconformadora, excavación en cortes y adicionales debajo de la subrasante, base hidráulica, barrido de la superficie, aplicación de riego de impregnación, renivelación asfáltica, tendido de la carpeta de concreto asfáltico.

MOTIVOS

A continuación, se describe de manera puntual los aspectos que sustenten el ejercicio de la opción:

Basados en los principios de economía, eficacia y eficiencia, se describen la motivación de la emisión del presente Dictamen.

Economía:

Efectuar una Licitación Pública implicará para esta dependencia ejecutora un incremento sustancial en los costos de ésta, ya que las empresas participantes ajenas a esta región o estado participarían con un porcentaje mayor en sus costos indirectos implicando con esto un costo mayor del costo total de la obra, incrementándose también los costos administrativos en la revisión y análisis de estos documentos que estarían fuera del alcance de los costos con los que esta dependencia cuenta para la realización de la obra. Al realizarla por Invitación a cuando menos tres personas se evitarán estos procesos administrativos que infieren en un proceso normal de Licitación Pública y que por el tiempo necesario para la ejecución de la obra se estaría en riesgo de no concluirla en el ejercicio correspondiente además de garantizar que la cantidad del recurso federal sea ejercido a tiempo y evitar con ello el sub ejercicio, en caso contrario se deberá proceder a la devolución de los recursos pendientes por ejercer.

Eficacia y Eficiencia:

El contar con un registro único de contratistas (RUC del Estado) vigente del Gobierno del Estado y saber que cuentan con las especialidades a fines para ejecutar obras que nos permitan transparentar los recursos y basados en su experiencia en la ejecución de trabajos similares, el procedimiento por invitación facultado en el artículo 41 en los supuestos que prevé: las



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Magón**
Año de
PROFESORES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán optar por no llevar el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. Esto nos permite seleccionar con eficacia a los contratistas con la especialidad a fin a la obra, eficientando con eso el proceso de licitación y garantizando a la vez una mejor ejecución de calidad en la realización de la obra la empresa invitada debe ser una empresa seria por lo que hace a su experiencia, capacidad técnica, económica y administrativa además de la capacidad de respuesta inmediata con relación a este tipo de trabajos

CONCLUSIÓN

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 84 fracción IX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 3°, fracción I, 24,30, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco; se determina efectuar el Procedimiento de Licitación a través de Invitación a cuando menos tres personas, para el programa de obra: I0082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, Localidad: 0002.-POB. Amatitán

del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con un monto programado de: **\$3,635,241.90** (Tres millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y un pesos 90/100 m.n.) incluye I.V.A., el cual se ejecutará con el Recurso: RAMO 33 FONDO III debido a que asegurará al Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, economía, eficiencia, financiamiento, precio y demás circunstancias inherentes.

Así lo provee y dictamina.

Atentamente

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Dir. de Obras, Ordenamiento Territorial y Serv. Mpaes.,



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de 2000
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Recibido
01-04-2022
10:30 AM
C

Grupo Obramex, S.A. de C.V.

Calle Margarita 108, Casa 1, Col. Jardines de Villahermosa, Villahermosa, Centro, Tabasco

PRESENTE

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/85/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

ATENCION

Aura María Pérez Cordova
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a cuando menos tres personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ		
Localidad	0002.-POB. Amatitán		
No Licitacion	MJM-INV-R33-003-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	04-abril-2022	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	04-abril-2022	02:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13-abril-2022	12:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	02-mayo-2022
Especialidad Requerida	220 Terracerías y Vialidades		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	05-abril-2022		

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**




Ricardo
Flores
Magón
Año de
Nacimiento
MUSEOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de obra





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo
Abovador
Año de
FUNDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/84/2022

ASUNTO:

INVITACION

OVIDIO RUÍZ RAMÓN

CALLE PRINCIPAL KM 5.5, COL. ANACLETO CANABAL
2DA. SECCIÓN, RÍA, ANACLETO CANABAL 2DA.
SECCIÓN, CENTRO, TABASCO

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

PRESENTE

OVIDIO RUÍZ RAMÓN

ATENCION

REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a cuando menos tres personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ		
Localidad	0002.-POB. Amatitán		
No Licitacion	MJM-INV-R33-003-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	04-abril-2022	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	04-abril-2022	02:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13-abril-2022	12:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	02-mayo-2022
Especialidad Requerida	220 Terracerías y Vialidades		
	Ori		
gen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30		

Fecha Limite Aceptación 05-abril-2022

É solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor
Municipal 9

Recibido
04/11/2020



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
FLORES
MAGÓN
Año de
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de obra





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de
PREFECTOS DE LA MICHOLANCA MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/86/2022

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.

ASUNTO:

INVITACION

Laguna la Polvora Manzana 6A Lote 5, entre calles
Laguna la Tinaja, Col. Lagunas 3ra Etapa,
Villahermosa, Centro, Tabasco

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

PRESENTE

Aida Iracema de la Cruz Pérez

ATENCION

REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a cuando menos tres personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ		
Localidad	0002.-POB. Amatitán		
No Licitacion	MJM-INV-R33-003-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	04-abril-2022	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	04-abril-2022	02:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13-abril-2022	12:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	02-mayo-2022
Especialidad Requerida	220 Terracerías y Vialidades		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	05-abril-2022		

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.-Contralor
Municipal 9

recibido
01-abril-2022
11:00 am



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Inicio
PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD MEXICANA

oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.


La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de obra





Grupo
OBRAMEX S.A. DE C.V.

VILLAHERMOSA TABASCO 04 DE ABRIL DE 2022

ASUNTO: ACEPTACION DE INVITACION


C. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA
PRESENTE:

EN RESPUESTA A SU OFICIO No.: **COPM/85/2022** CON FECHA: **01 DE ABRIL DE 2022**. EN EL CUAL SE NOS HACE LA INVITACION PARTICIPAR EN LA LICITACION POR EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD DE **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**, REFERENTE AL No. DE LICITACION: **MJM-INV-R33-003-22**, PARA LOS TRABAJOS DE LA OBRA: **I0082.-REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ**. CON UN PLAZO DE EJECUCION DE: **30 DIAS**.

LE INFORMAMOS QUE **ACEPTAMOS PARTICIPAR** EN LA MENCIONADA LICITACION.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, ME DESPIDO CON UN CORDIAL SALUDO, QUEDANDO A SUS ORDENES.


ATENTAMENTE




C. Aura María Pérez Córdoba

REPRESENTANTE LEGAL

C.C.P.- ARCHIVO
C.C.P. -C. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS. -CONTRALOR



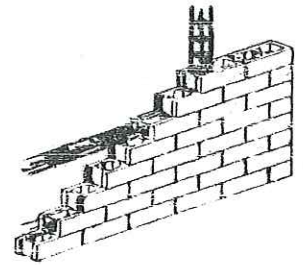

VILLAHERMOSA, TABASCO A 04 DE ABRIL DE 2022

C. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE LA OBRAS
PRESENTE:


ASUNTO: ACEPTACION DE INVITACION.

CON RELACIÓN A SU OFICIO No: **COPM/84/2022** DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2022, MANIFIESTO QUE NUESTRA EMPRESA **ACEPTA**, PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA LICITACION NÚMERO: **MJM-INV-R33-003-22** RELATIVO A LA OBRA: **10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EL CUAL TIENE UN PERIODO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS NATURALES CON FECHA DE INICIO ESTIMADA 02 DE MAYO 2022.**

SIN OTRO PARTICULAR AL RESPECTO, QUEDO DE USTED PARA CUALQUIER DUDA Y/O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

OVIDIO RUIZ RAMON
ADMINISTRADOR ÚNICO



C.C.P. C. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS. - CONTRALOR.
C.C.P. ARCHIVO.

Calle principal km. 5.5, Rchía. Anacieto Canabai 2da. Secc., Centro, Villahermosa, Tabasco,
CP 86280 Correo: ovidioruizramon@gmail.com

REG. IMSS: E75-63378-10/ R.F.C: RURO640426TR0



CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S. A. DE C. V.

Laguna La Pólvara, Manzana 6A, Lote 5; Lagunas 3ra. Etapa
C.P. 86019, Villahermosa, Centro Tabasco
Correo electrónico: corporativoconstructortab@gmail.com

Villahermosa Tabasco, A 01 De Abril del 2022

Asunto: Aceptación de Invitación

C. Rafael Ramón Morales
Presidente Del Comité De Obra Municipal
Jalpa De Méndez, Tabasco
Presente.

En atención a su invitación, me permito notificarle Mi Aceptación de Participación en el Procedimiento de la Licitación No.: MJM-INV-R33-003-22, respecto a la Obra: I0082.-Rehabilitación de carretera Amatitán Entrada San Juanito con concreto asfáltico tramo 0+000 al 1+254 Municipio de Jalpa de Méndez; con un plazo de ejecución De 30 Días Naturales.


Lo anterior, atendiendo Su Oficio No.: COPM/86/2022 de fecha: 1 Abril del año actual.

Sin más que tratar por el momento me despido de usted con un saludo cordial.

Atentamente
"Corporativo Constructor Tabasqueño, S.A. de C.V."

Ing. Aida Iracema De La Cruz Pérez
Administrador Único
Móvil: 9933083395

c.c.p.. C. Cristian David Coronel Santos.-Contralor
c.c.p. Archivo





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de
MEXICANOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/82/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

C. Manuel Pérez Ricárdez

Segundo vocal y Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0002.-POB. Amatitán	RAMO 33 FONDO III	MJM-INV-R33-003-22	13 de abril del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enojando un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

Stamp: 09:27 am 06 ABR. 2022. Recibi: fanny



c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de la Revolución Mexicana
PRELUDER DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/83/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022



C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Secretario Técnico
Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0002.-POB. Amatitán	RAMO 33 FONDO III	MJM-INV-R33-003-22	13 de abril del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

Stamp: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
Stamp: 05 ABR. 2022
Stamp: R. Famy
Stamp: DIRECCIÓN DE CONTRATAciones



c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Magna
MAYOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/81/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

C. Cristian David Coronel Santos

Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0002.-POB. Amatitán	RAMO 33 FONDO III	MJM-INV-R33-003-22	13 de abril del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra



09:26 am
13 de ABR. 2022
Pág 1 de 1

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTRATA
R. Fanny



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de
INDEPENDENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/79/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

Ing. Fernando Naranjo Broca

Presidente De La (CMIC) Delegación Tabasco

Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0002.-POB. Amatitán	RAMO 33 FONDO III	MJM-INV-R33-003-22	13 de abril del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra



Handwritten notes and a stamp: HOR. 14:57 D. 14/04/22

c.c.p.- Archivo
c.c..p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de
MEXICANOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/78/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

MIPA. Carlos Emilio Hernández González

Presidente del Consejo Directivo

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0002.-POB. Amatitán	RAMO 33 FONDO III	MJM-INV-R33-003-22	13 de abril del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra



Recibido
7/04/22
Cristian David Coronel Santos G.L.

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de México
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/80/2022
ASUNTO: INVITACION
Jalpa de Méndez, Tabasco a 1 de abril del 2022

L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora

Secretario De La Funcion Publica

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Invitación a cuando menos tres personas de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0002.-POB. Amatitán	RAMO 33 FONDO III	MJM-INV-R33-003-22	13 de abril del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Ayuntamiento
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra



SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA

RECIBIDO
07 ABR. 2022
18:17
SA

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA
RECIBIDO
23 MAR. 2021
DESPACHO DEL C. SECRETARIO



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRELUSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: *Invitación a cuando menos tres personas*

Jalpa de Méndez, Tabasco a 4 de abril del 2022

No Licitacion	MJM-INV-R33-003-22
Descripcion de la Obra	I0082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
Localidad	0002.-POB. Amatitán
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 10:00:00 a. m. del día 4 de abril del año 2022, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Asimismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
OVIDIO RUÍZ RAMÓN	
C. JAIME DE LA CRUZ RODRÍGUEZ	
Grupo Obramex, S.A. de C.V.	
C. ERIKA CRISTEL PINTO LÓPEZ	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	
C. JONATHAN GARCÍA GARCÍA	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Invitación a cuando menos tres personas

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 02:00:00 p. m. del día 4 de abril del año 2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente: 1.- Se hace la precisión a los licitantes que esta junta se podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

Licitación No. MJM-INV-R33-003-22

Descripción de la Obra	I0082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
Localidad	0002.-POB. Amatitán
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
OVIDIO RUÍZ RAMÓN	
C. JAIME DE LA CRUZ RODRÍGUEZ	
Grupo Obramex, S.A. de C.V.	
C. ERIKA CRISTEL PINTO LÓPEZ	

No Control 9
"c.c.p. Archivo"



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
1876
100
AÑOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE
C.V.

C. JONATHAN GARCÍA GARCÍA

Por el H. Ayuntamiento

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación

Licitación No. MJM-INV-R33-003-22

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las propuestas.

02.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega provisional por obra. No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
PREFECTURA DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL

Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Presentación y Apertura de Propuestas"

Modalidad: Invitación a cuando menos tres personas

No Licitación	MJM-INV-R33-003-22	Presupuesto Base con IVA	\$3,635,241.90
Descripción de la Obra		Localidad	
10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ		0002.-POB. Amatitán	
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 12:00:00 p. m. del día 13 de abril de año 2022 y de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal, y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones" asignado mediante oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1 Grupo Obramex, S.A. de C.V.
- 2 OVIDIO RUÍZ RAMÓN
- 3 CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo e procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en e oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que s cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuación:

EMPRESAS DESECHADAS

LICITANTE	SITUACION DE LA PROPUESTA
	Ninguna

EMPRESAS ACEPTADAS

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	Grupo Obramex, S.A. de C.V.	\$3,099,504.32	30 días
2	OVIDIO RUÍZ RAMÓN	\$3,116,293.96	30 días
3	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$3,120,622.54	30 días

Rosa María Sánchez Castellano



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
ESTADO DE TABASCO

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimiento en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de Estado de Tabasco, Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, y en honor a los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromiso de las propuestas; el fallo de esta licitación se comunicará a los participantes el día: 18 de abril de 2022 a las 11:00:00 a. m., en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Comité de la Obra Pública Municipal

Firmas

C. Carlos Mario Juárez Hernández

Secretario Técnico

C. Adelfo Morales Palma

Invitado de La Función Pública

C. José Isabeño de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones

Licitante / Representante

Firmas

OVIDIO RUIZ FAIMÓN

C. MATILDE ANDRADE HERNÁNDEZ

Grupo Obramex, S.A. de C.V.

C. ROBERTO DE JESÚS DE LA CRUZ LÓPEZ

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.

C. ROSA MARÍA SÁNCHEZ CASTELLANO

[Handwritten signatures]

Roberto de Jesús de la Cruz López

Rosa María Sánchez Castellano



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2022 Flores
Año de Magón
 POR EL SUO DE LA REVOLUCION MEXICANA



MODALIDAD: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
LICITACIÓN No: MJM-INV-R33-003-22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
UBICACIÓN: 0002.-POB. Amatitán

LISTA DE ASISTENCIA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
OVIDIO RUÍZ RAMÓN	MATILDE ANDRADE HERNANDEZ	
Grupo Obramex, S.A. de C.V.	Roberto de Jesús de la Cruz López	
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	Rosa Maria Sanchez Castellano	Rosa Maria Sanchez Castellano

PLAN DE OBRAS P. L. 00207, JALPA DE MENDEZ, QRO.





AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LICITACION No: MJM-INV-R33-003-22
 OBRA: 10082.-REHABILITACION DE CARRETERA AMATTITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
 UBICACION: 002.-POB. AMATTITAN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			CONSTRUCCIONES, PAVIMENTACIONES, MAQUINARIA, OBRAS DE OBRERA			GRUPO IBERLU S.A. DE C.V. ALBA MARIA PEREZ CORROVA OBRANAMEX			CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUERO					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %
I	PRELIMINARES	km	1.44	3048.37	\$ 4,389.85	0.140%	\$ 2,782.57	\$ 4,008.90	-9%	0.129%	\$ 3,455.25	13%	0.161%	\$ 3,549.20	5,110.85	18%	0.183%
1.01	DESORILLE CON EQUIPO MOTO CONFORMADORA PU.OT.	km	1.44	3048.37	\$ 4,389.85	0.140%	\$ 2,782.57	\$ 4,008.90	-9%	0.129%	\$ 3,455.25	13%	0.161%	\$ 3,549.20	5,110.85	18%	0.183%
II	BACHEO SUPERFICIAL CALVEREO EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y ACARREO MANUAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA A RAZON DE 1.2 LTS/M2, MEZCLA ASFALTICA ARENA - EMULSION A RAZON DE 85 LTS/M3, COMPACTACION MANUAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	1462.36	353.6	\$ 517,090.50	16.500%	\$ 352.33	\$ 515,239.30	0%	16.534%	\$ 339.50	-4%	16.018%	\$ 350.69	512,835.02	-1%	16.392%
2.1	BACHEO SUPERFICIAL CALVEREO EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO INCLUYE: DEMOLICION, CARGA Y ACARREO MANUAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA A RAZON DE 1.2 LTS/M2, MEZCLA ASFALTICA ARENA - EMULSION A RAZON DE 85 LTS/M3, COMPACTACION MANUAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	M2	1462.36	353.6	\$ 517,090.50	16.500%	\$ 352.33	\$ 515,239.30	0%	16.534%	\$ 339.50	-4%	16.018%	\$ 350.69	512,835.02	-1%	16.392%
III	RENOVELACION CON MEZCLA ASFALTICA	ha	0.81	2048.81	\$ 1,659.54	0.053%	\$ 2,206.33	\$ 1,787.13	8%	0.057%	\$ 730.06	-61%	0.021%	\$ 812.98	656.51	-60%	0.021%
5.01	BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA	ha	0.81	2048.81	\$ 1,659.54	0.053%	\$ 2,206.33	\$ 1,787.13	8%	0.057%	\$ 730.06	-61%	0.021%	\$ 812.98	656.51	-60%	0.021%
5.02	EMULSION ASFALTICA EMPLEADA EN RIEGOS DE LIGA (RENOVELACION, EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECH.65)	L	8151	14.72	\$ 119,982.72	3.803%	\$ 14.54	\$ 118,515.54	-1%	3.803%	\$ 15.60	6%	4.102%	\$ 16.11	131,312.61	9%	4.197%
4.03	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO (GRAVA DE 1/2" A FINOS) Y CEMENTO ASFALTICO PG.64-22 COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%), INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	m²	163.02	4478.97	\$ 730,161.69	23.258%	\$ 4,446.74	\$ 724,903.55	-1%	23.262%	\$ 4,426.66	-1%	23.335%	\$ 4,406.83	718,298.41	-2%	22.957%
IV	CARPETA ASFALTICA BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA	ha	0.81	2048.81	\$ 1,659.54	0.053%	\$ 2,206.33	\$ 1,787.13	9%	0.057%	\$ 790.06	-61%	0.021%	\$ 812.98	658.51	-60%	0.021%
5.01	CARPETA ASFALTICA BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MANUALES PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA	ha	0.81	2048.81	\$ 1,659.54	0.053%	\$ 2,206.33	\$ 1,787.13	9%	0.057%	\$ 790.06	-61%	0.021%	\$ 812.98	658.51	-60%	0.021%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LICITACION No: MJM-INV-R33-003-22
 OBRA: 10082.-REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE MENDEZ

UBICACION: 002.- POB. AMATITAN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PU	PRESUPUESTO BASE		CONSTRUCCIONES, PAVIMENTACIONES, MAQUINARIA, OBRAS DE OBRERO		GRUPO IBERU S.A. DE C.V. ALPA MARIA PEREZ GONDOVA		CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO							
					IMPORTE	INC. GRAL.	IMPORTE	INC. GRAL.	IMPORTE	INC. GRAL.	IMPORTE	INC. GRAL.						
5.02	EMULSION ASFALTICA L (RENVIELACION, ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65)	L	8151	14.72	\$ 119,982.72	3.823%	\$ 14.54	\$ 118,515.54	-1%	3.803%	\$ 15.90	\$ 127,155.60	9%	4.102%	\$ 16.11	\$ 131,312.61	9%	4.197%
4.03	CONSTRUCCION DE CARPETA CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO (GRAVA DE 1/2" A FINOS) Y CEMENTO ASFALTICO PG 54-22 COMPACTADA AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%). INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA	m²	244.53	4,478.97	\$ 1,095,242.53	34.949%	\$ 4,446.74	\$ 1,087,261.33	-1%	34.893%	\$ 4,236.66	\$ 1,084,896.47	-1%	35.002%	\$ 4,405.83	\$ 1,077,357.61	-2%	34.426%
5.01	SELLO BARRIDO DE LA SUPERFICIE POR TRATAR POR MEDIOS MAMUALES, PARA RECIBIR RIEGO DE LIGA	ma	0.81	2,048.91	\$ 1,659.54	0.053%	\$ 2,205.33	\$ 1,787.13	8%	0.057%	\$ 790.06	\$ 639.95	-61%	0.021%	\$ 613.98	\$ 558.51	-60%	0.021%
5.02	EMPLEADA EN RIEGOS DE LIGA (RENVIELACION, EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE ALTA VISCOSIDAD ECM-65)	L	8151	14.72	\$ 119,982.72	3.829%	\$ 14.54	\$ 118,515.54	-1%	3.803%	\$ 15.60	\$ 127,155.60	6%	4.102%	\$ 16.11	\$ 131,312.61	9%	4.197%
5.03	DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO CON EQUIPO COMPUTARIZADO. INCLUYE: EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO CON POLIMERO MODIFICADA CON SELLO TIPO I ALTA VISCOSIDAD PARA RIEGO DE LIGA, SELLO 3-A PREMEZCLADO CON ASFALTO PG 54-22	m²	8151	43.23	\$ 352,367.73	11.244%	\$ 43.41	\$ 353,834.91	0%	11.354%	\$ 41.65	\$ 341,119.35	-3%	11.005%	\$ 43.20	\$ 352,123.20	0%	11.255%
VI	SEÑALAMIENTO RAYA LATERAL SENCILLA CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR HUMEDO DE 21 MILESIMAS DE PULGADA (0.5334 MM) CON PINTURA PARA TRANSITO 100% ACRILICA BASE AGUA COLOR BLANCO PARA TODO CLIMA (AWP) MARCA 3M O SIMILAR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO (0.282 KG/M³) Y ELEMENTOS CERAMICOS (0.109 KG/M³) APLICADOS CON EQUIPO	m	2508	13.57	\$ 34,033.56	1.086%	\$ 13.44	\$ 33,707.52	-1%	1.082%	\$ 12.64	\$ 31,701.12	-7%	1.023%	\$ 13.04	\$ 32,704.32	-4%	1.045%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales



LICITACION No: MJM-INV-R33-003-22
 OBRA: 10082.-REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
 UBICACION: 002.- POB. AMATITAN

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			CONSTRUCCIONES, PAVIMENTACIONES, MAQUINARIA DVIDIO RUIZ RAMON			GRUPO IBERIUM S.A. DE C.V. AURA MARIA PEREZ CORDOVA ORBAVEX			CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	CI.A EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	CI.A EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	CI.A EN %	INC. GRAL
6.02	RAYA CENTRAL SENCILLA CONTINUA O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON UN ESPESOR HUMEDO DE 21 MILESIMAS DE PULGADA (0.5334 MM) CON PINTURA PARA TRANSITO 100% ACRILICA BASE AGUA COLOR AMARILLO PARA TODO CLIMA (AWP) MARCA 3M O SIMILAR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO (0.262 KG/M ²) Y ELEMENTOS CERAMICOS (0.109 KG/M ²) APLICADOS CON EQUIPO	m	1254	13.57	\$ 17,016.78	0.543%	13.44	\$ 16,853.76	-1%	0.541%	12.64	\$ 15,850.56	-7%	0.511%	13.04	\$ 16,352.16	-4%	0.523%
VII	OBRAS COMPLEMENTARIAS																	
7.01	CONSTRUCCION DE TOPES SECCION DE 5.00 MTS DE LONGITUD, 1.50 MTS DE ANCHO Y 10 CMS DE ALTURA A BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALENTE INCLUYE: SUMINISTROS DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza	4	4,650.00	\$ 18,600.00	0.594%	4,870.17	\$ 19,480.68	5%	0.625%	4,459.77	\$ 17,839.08	-4%	0.576%	4,496.50	\$ 17,987.60	-3%	0.575%
			SUB-TOTAL			\$ 3,132,829.22		\$ 3,116,253.96		\$ 3,099,504.32		\$ 3,128,622.54						
			IVA			\$ 401,443.60		\$ 459,657.03		\$ 495,920.89		\$ 505,579.67						
			TOTAL			\$ 3,534,272.82		\$ 3,575,910.99		\$ 3,595,425.21		\$ 3,634,202.15						

ELABORO

 ING. JOSE ROBERTO DE LA CRUZ VAZQUEZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y NEGOCIOS UNITARIOS
 DE LA DDOOTSM



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECIOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Dictamen Técnico"

Modalidad: *Invitación a cuando menos tres personas*

No Licitacion	MJM-INV-R33-003-22		
Descripcion de la Obra	I0082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ		
Localidad	0002.-POB. Amatitán		
Plazo Ejecucion	30 días	Capital Autorizado sin IVA	\$3,133,829.22
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA **\$3,133,829.22**

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo **\$3,120,622.54**

B).- Monto Mínimo **\$3,099,504.32**

Diferencia **\$21,118.22**

De donde:

1 X **\$3,120,622.54** ÷ 10 **\$312,062.25**

De donde: \$21,118.22 Menor que < \$312,062.25

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Situación de la Propuesta
OVIDIO RUÍZ RAMÓN	\$3,116,293.96	Se considera solvente
Grupo Obramex, S.A. de C.V.	\$3,099,504.32	Se considera solvente
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$3,120,622.54	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

EVENTO	FECHAS
Fecha de Invitación	01-abril-2022
Visita de Obra	04-abril-2022
Junta de Aclaraciones	04-abril-2022
Apertura de Propuestas	13-abril-2022

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación..

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos

Empresa	Monto Ofertado
OVIDIO RUÍZ RAMÓN	\$3,116,293.96
Grupo Obramex, S.A. de C.V.	\$3,099,504.32
CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$3,120,622.54

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica-económica de los



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Piñeres
Magón
Año de
FUNDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

licitantes, se determina que la empresa: Grupo Obramex, S.A. de C.V., Representada Legalmente por: Aura María Pérez Cordova, Se considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económico; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha: 13 de abril del 2022

Firma

Elaboró

C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

"Acta de Fallo para la Adjudicación de Contrato de la Obra Pública"

Invitación a cuando menos tres personas
Licitación No: MJM-INV-R33-003-22

Descripción Obra	10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
Localidad	0002.-POB. Amatitán
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y, 34, 35 y 36 de su Reglamento.

En la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las: 11:00:00 a. m. del día 18 de abril del año 2022, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 12:00:00 p. m. del día 13 de abril del año 2022 para conocer el fallo que emite el Ayuntamiento, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, de esta ciudad las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Acto seguido se dio lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente:

Propuestas desechadas en la evaluación cualitativa:

No se desecharon propuestas ya que todas cumplen con lo estipulado en las bases de licitación.

Propuestas Aceptadas:

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	Grupo Obramex, S.A. de C.V.	\$3,099,504.32	30 días
2	OVIDIO RUÍZ RAMÓN	\$3,116,293.96	30 días
3	CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.	\$3,120,622.54	30 días

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el **C. José Isabelino de la Cruz Isidro** con cargo de Jefe de Licitaciones, y en presencia de los servidores públicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de:

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Monto Ofertado con Letra	Plazo de Ejecución
Grupo Obramex, S.A. de C.V.	\$3,099,504.32	TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 32 /100 M.N.	30

Firmas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Magaña
EDUCACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones

Empresa/Representante

OVIDIO RUÍZ RAMÓN

C. JAIME DE LA CRUZ RODRÍGUEZ

Grupo Obramex, S.A. de C.V.

C. ERIKA CRISTEL PINTO LÓPEZ

CORPORATIVO CONSTRUCTOR TABASQUEÑO, S.A. DE C.V.

C. JONATHAN GARCÍA GARCÍA

Firmas



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

Contrato de Obra Pública a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Licitación	MJM-INV-R33-003-22
Fecha de Licitación:	01 de abril de 2022
Descripción De la Obra:	10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
Localidad:	0002.-POB. Amatitán
Programa:	Carreteras
Actividad Institucional:	006.- Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
Autorización del Recurso:	OFICIO DPM/177/2022
Fecha de Autorización del Recurso:	30 de marzo de 2022
Aprobación por Cabildo:	ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 18.- de fecha: 15 de marzo de 2022
Unidad Responsable:	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	61501.- Construcción de vías de comunicación
Origen de los Recursos:	RAMO 33 FONDO III
Metas:	1.25 KM
Contrato No:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022
Fecha De Contrato:	22 de abril de 2022
Importe Autorizado:	\$3,635,241.90 <i>Incluye I.V.A.</i>
Importe Contratado:	\$3,595,425.01 <i>Incluye I.V.A.</i>
Anticipo: 30 %	\$1,078,627,50 <i>Incluye I.V.A.</i>
Fecha de Visita De Obra:	04 de abril de 2022
Plazo de Ejecución:	30 Días
Fecha de Adjudicación:	18 de abril de 2022
Mod de la Adjudicación:	Invitación a cuando menos tres personas
Fecha de Inicio:	02 de mayo de 2022

Plaza Hidalgo #1, 86200 Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

Fecha de Terminación:	31 de mayo de 2022
Contratista:	Grupo Obramex, S.A. de C.V.
Representante legal:	Aura María Pérez Cordova
Domicilio Fiscal:	Calle Margarita 108, Casa 1, Col. Jardines de Villahermosa, Villahermosa
Ciudad o Población:	Centro, Tabasco
Clave de RFC:	GOB080220Q4A
Teléfono:	9933575891
Registro del IMSS:	E7552857103

Contrato de la Obra Pública a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quién en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el **C. Rafael Ramón Morales** en calidad de Presidente del comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: **Grupo Obramex, S.A. de C.V.** a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por el: Aura María Pérez Cordova en su carácter de Representante Legal.

DECLARACIONES

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo

I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

I.3.- que la **Lic. Nuris López Sánchez**, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la sesión ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y síndico de hacienda, respectivamente, Plaza Hidalgo # 1, 06200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- El C. **Carlos Mario Juárez Hernández**, acredita su personalidad como **Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**, con su nombramiento de fecha 5 de octubre de 2021, otorgado por la **Lic. Nuris López Sánchez**, Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser Persona Jurídico Colectiva tal y como acredita su personalidad jurídica mediante escritura pública No. **8315 volumen 205** de fecha **21 de marzo de 2013**, pasada ante la fé del **Lic. Lic. Leticia del Carmen Gutiérrez Ruíz**, titular de la notaría Pública número **26**, con adscripción en la **Calle primavera No. 103, esq. Paseo Usumacinta, col. Atasta de Serra, Villahermosa, Tab.**; Registro Federal de Contribuyente **GOB080220Q4A**, que cuenta con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. **E7552857103**, así como con el registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. **SC-PC-01488**

II.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: **Calle Margarita 108, Casa 1, Col. Jardines de Villahermosa, Villahermosa, Centro, Tabasco**; mismo que señala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos señala correo electrónico **grupoobramex@gmail.com** mismo que estará vigente, para los conceptos previstos en la cláusula vigésima quinta y demás obligaciones previstas en este instrumento.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos.

II.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
PUEBLA DE LA BUENESERVIDAD**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a las obras:

10082.- REHABILITACIÓN DE CARRETERA AMATITÁN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ en la localidad de: **0002.-POB. Amatitán** del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecución de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: \$3,595,425.01 (Tres millones quinientos noventa y cinco mil cuatrocientos veinticinco pesos 01/100 m.n.) incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de **30 días naturales**, siendo la fecha de inicio **02 de mayo de 2022** y la terminación el día: **31 de mayo de 2022**

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magon**
FUNDADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **Grupo Obramex, S.A. de C.V.** mediante el procedimiento de **Invitación a cuando menos tres personas** licitación No. **MJM-INV-R33-003-22**

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: **18 de abril de 2022** en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos: RAMO 33 FONDO III autorizados mediante: Oficio emitido por el OFICIO DPM/177/2022 de fecha 30 de marzo de 2022 **afectando** la partida: 61501.- Construcción de vías de comunicación

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SÉPTIMA. - ANTICIPOS.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (**Treinta por ciento**) monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: \$1,078,627.50 (**Un millón setenta y ocho mil seiscientos veintisiete pesos 50/100 m.n.**) incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1. B0200. Jalpa de Méndez. Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo Flores
Año de Maestría
PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

OCTAVA. - GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

- I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- II.- Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Finanzas Municipal.
- III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;
- V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".
- VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
MAYORCÍAS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

DÉCIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" deberá tener un representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

Plaza Hidalgo #1. 86200 Jalpa de Méndez. Tlax.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón**
MUNICIPIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

El SUPERINTENDENTE, deberá contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar, mismo que fungirá como director responsable de obra, según lo establecido en el Artículo 56, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 días naturales, el contratista deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las fechas de corte de las estimaciones podrán ser los días 15, 30 y término de obra.

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas señaladas para ello, será declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente será notificado a la Contraloría municipal y a la Función Pública para su incorporación en el listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, "EL CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones:

CONCEPTO	PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA	0.5% (CINCO AL MILLAR)
CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.2% (DOS AL MILLAR)

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Plaza Hidalgo #1, B2700, Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo Flores
Año de Maqon
PRELUDIO DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su recepción física.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo que no exceda de quince días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", podrá, dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Año de
Maón**
REPUBLICA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

Plaza Hidalgo #1, 86200 Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo Flores
Magón
Año de
Magón
MUNICIPIO DE LA BENVENIDA MEXICANA**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables e éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecución de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:

- a) Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al contrato **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022**.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos pactados en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecución de los de los trabajos correspondiente al contrato **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022**, "EL **AYUNTAMIENTO**" le aplicará una penalización a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retención económica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa de Ejecución de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retención, "EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los

Pasea Hidalgo #1, 86201, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magon
HÉROES DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

trabajos programados, encuentra que el **CONTRATISTA** no ha recuperado los atrasos anteriores, la penalización respectiva será aplicada en términos de lo siguiente:

- i. Si la cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
- ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
- iii. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha señalada para la terminación total de los trabajos correspondientes al contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificará que el "CONTRATISTA" haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalización establecida en este inciso, quedarán en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicación de la penalización establecida en el inciso b) de ésta cláusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la conclusión de los trabajos.

b) Penalización por atraso en la terminación de los trabajos correspondientes al "Contrato"

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos correspondientes al "CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalización definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al "Contrato" no concluida; dicha penalización será aplicada por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el "contrato" de que se trate, misma que será efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta cláusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalización señalada en este inciso b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO"

Plaza Hidalgo #1, 86300 Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo Flores
Año de **Maestro**
DEFENSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

por cada día natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada día de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Días de atraso)

Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados

Días de atraso=Fecha programada de terminación - Fecha de conclusión de los trabajos

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

El monto máximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliación de Monto, se generan al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula "EL AYUNTAMIENTO", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje señalado en el párrafo anterior, debiendo además ejecutar la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMA. - REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



**Ricardo
Flores
Año de
Magón
PREFECTURA DE LA DELEGACIÓN MEXICALTA**

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrán ser mayor de 20 días naturales. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
- II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

Plaza Hidalgo #1. 86200, Jalpa de Méndez, Tlax.

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Plaza Hidalgo #1, 86305, Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de las observaciones que deriven de las auditorías internas o externas practicadas a este proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco a los: 22 días del mes de abril de 2022.

"POR EL AYUNTAMIENTO"

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del comité de obra

"EL CONTRATISTA"

Grupo Obramex, S.A. de C.V.

Aura María Pérez Cordova
Representante Legal

TESTIGOS

C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

C. Eder Izquierdo Hernández
Director de Finanzas
Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OBRA:10082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K008.- CARRETERAS

LA PRESENTE OBRA CONSISTE EN REHABILITAR EL DRENAJE SANITARIO CON EL TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, SONDEO DE LINEAS, EXCAVACION EN ZANJAS CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON EQUIPO MECANICO DONDE SE REQUIERA, PLANTILLA DE ARENA SUSTITUCION DE TUBERIAS DE PVC DE 8" Y 6" DE DIAM, REPARACIONES DE TOMAS DOMICILIARIAS REPOSICION DE PAVIMENTOS CON CONCRETO PREMEZCLADO, BANQUETAS CON CONCRETO HECHO EN OBRA

002.- POB. AMATITAN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 25 de febrero de 2022

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024



DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Jalpa de Mendez, Tabasco, a 25-feb-22

Folio No.: DPADS/ /2022
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra OBRA:10082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, a ejecutarse en: 002.- POB. AMATITAN, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10082	OBRA:10082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	002.- POB. AMATITAN	1.254 KM	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 3,635,241.90

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO: 10092.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATTITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.


LOCALIDAD: 0002.- POB. AMATTITAN
 TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FI11-008-2022
 AREA RESPONSABLE: 008 - DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
 PERIODO ESTIMADO : DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ESTIMACION : 18 DE MAYO DE 2022

ALBUM FOTOGRAFICO

GRUPO OBRANEX S.A. DE C.V.

CONTRATISTA : GRUPO OBRANEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : GOB080220Q4A
 R.U.C.T. : SFP-RUC-01488
 LOCALIDAD : CALLE MARGARITA No. 108, No. INT. CASA 1, COL. JARDINES DE VILLAHERMOSA,
 MUNICIPIO : VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86027

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
5.03.	Suministro y aplicación de sello premezclado sincronizado con equipo computarizado, incluye: emulsión asfáltica de rompimiento rápido modificada con polímero tipo I alta viscosidad para riego de liga, sello 3-A premezclado con asfalto PG 64-22	m ²

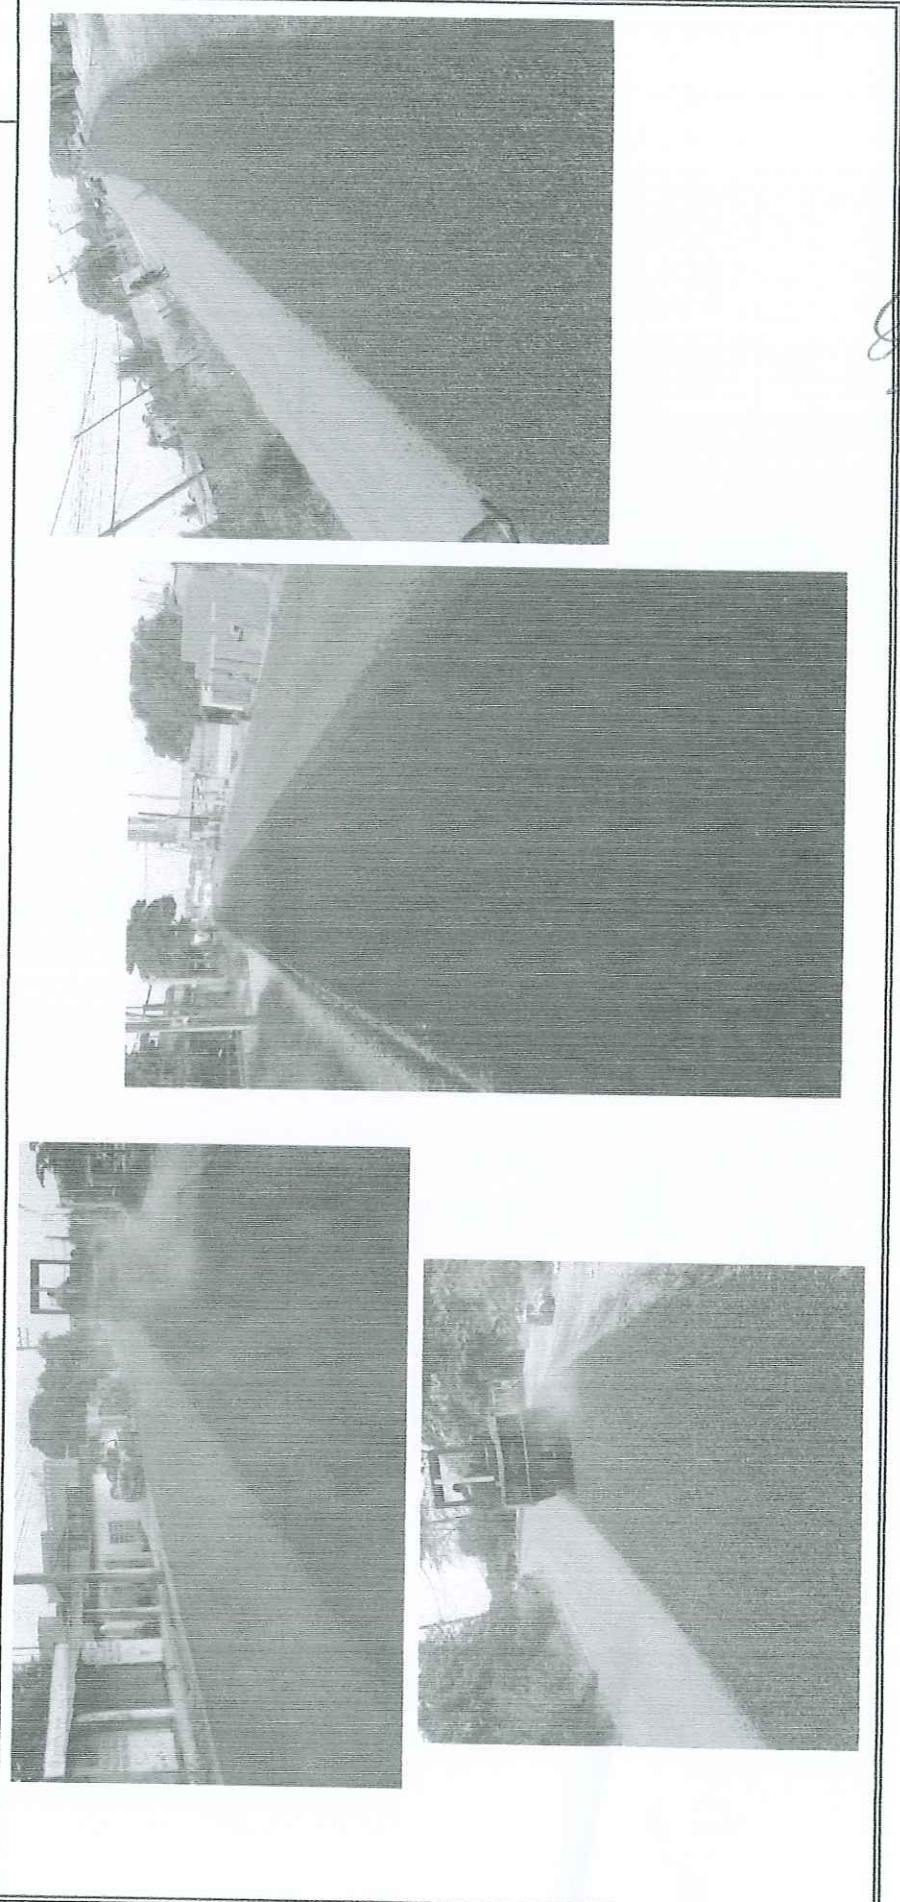

FORMULO:

ING. CARLOS MANUEL NARVAEZ BENITEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO: I0082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

LOCALIDAD: 0002.- POB. AMATITÁN MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022 DE FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022
 AREA RESPONSABLE: 008.- DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS


PERIODO ESTIMADO : DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ESTIMACION : 18 DE MAYO DE 2022

ALBUM FOTOGRAFICO



CONTRATISTA : GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : GOB080220Q4A
 R.U.C.T. : SFP-RUC-01488
 LOCALIDAD : CALLE MARGARITA No. 108, No. INT. CASA 1, COL. JARDINES DE VILAHERMOSA,
 MUNICIPIO : VILAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86027

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
5.01.	Barrido de la superficie por tratar por medios manuales, para recibir riego de liga	ha

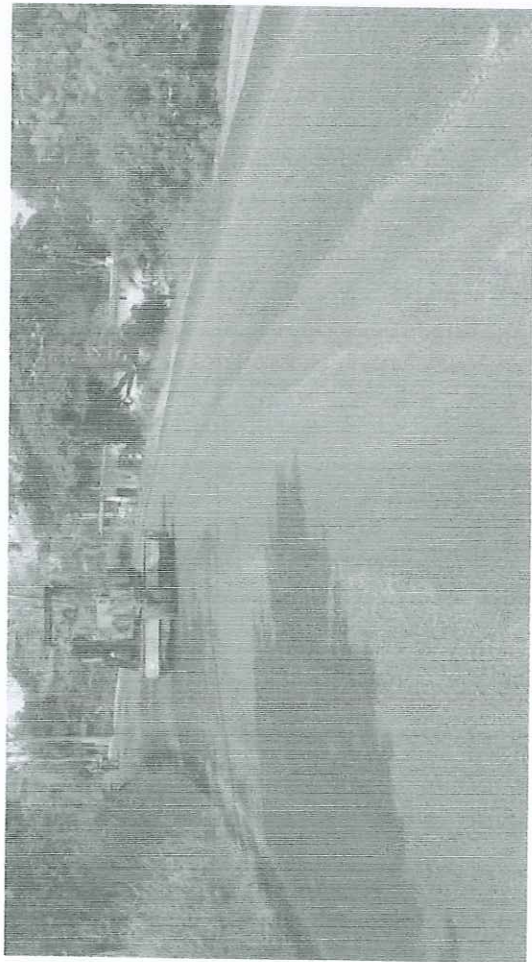

FORMADO:

 ING. CARLOS MANUEL NARVAEZ BENITEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM



ALBUM FOTOGRÁFICO

GRUPO OBRAMEX s.a. de c.v.

CONTRATISTA : GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V -
 R.F.C. : GOB080220Q4A
 R.U.C.T. : SFP-RUC-01488
 LOCALIDAD : CALLE MARGARITA No. 108, N. INT. CASA 1, COL. JARDINES DE VILLAHERMOSA,
 MUNICIPIO : VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86027

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ.
 PROYECTO : 10082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.
 LOCALIDAD: 0002.- POB. AMATITÁN MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022 DE FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022
 AREA RESPONSABLE: 008.- DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
 PERIODO ESTIMADO : DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ESTIMACION : 18 DE MAYO DE 2022

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
5.02.	Emulsión asfáltica empleada en riegos de liga (renivelación, emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L

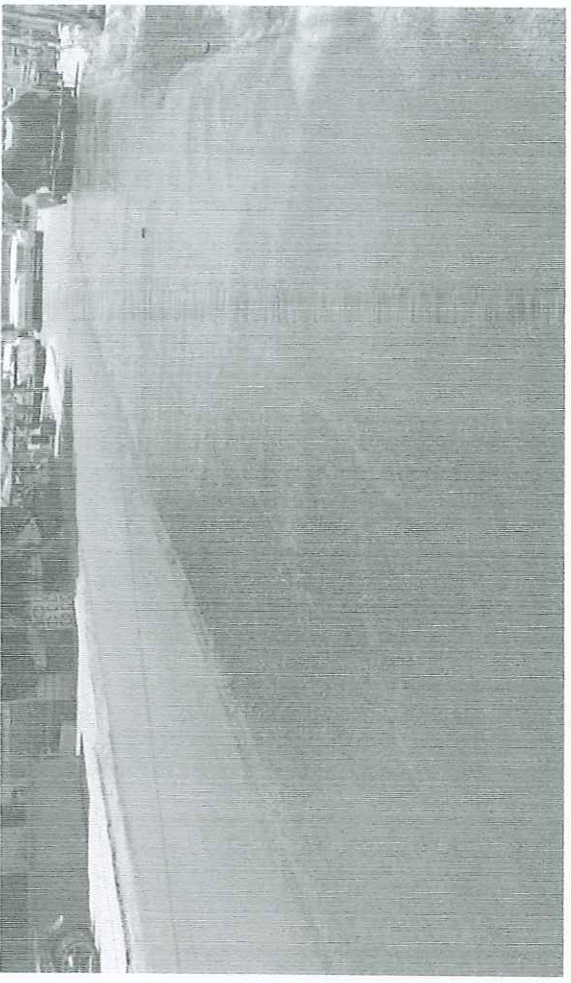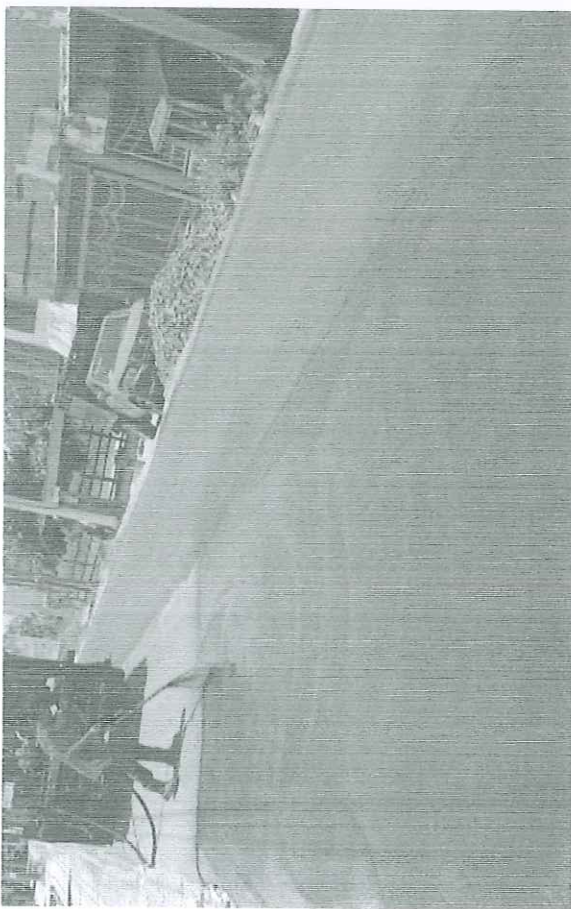

FORMULO:
 ING. CARLOS MANUEL NARVAEZ BENITEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO : I0082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

LOCALIDAD: 0002.- POB. AMATITÁN MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ
 TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022 DE FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022
 AREA RESPONSABLE: 008.- DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
 PERIODO ESTIMADO : DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ESTIMACION : 18 DE MAYO DE 2022


ALBUM FOTOGRAFICO

PAG. 2 DE 12


GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V.

CONTRATISTA : GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C. : GOB080220Q4A
 R.U.C.T. : SFP-RUC-01488
 LOCALIDAD : CALLE MARGARITA No. 108, No. INT. CASA 1, COL. JARDINES DE VILLAHERMOSA,
 MUNICIPIO : VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86027

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
2.10	BACHEO SUPERFICIAL Y CALAVERO EN CARPETA ASFALTICA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CARGA Y ACARREO MANUAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA CATIONICA A RAZÓN DE 1.2 LTS/M2, MEZCLA ASFALTICA ARENA - EMULSIÓN A RAZÓN DE 85 LTS/M3, COMPACTACIÓN MANUAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M2

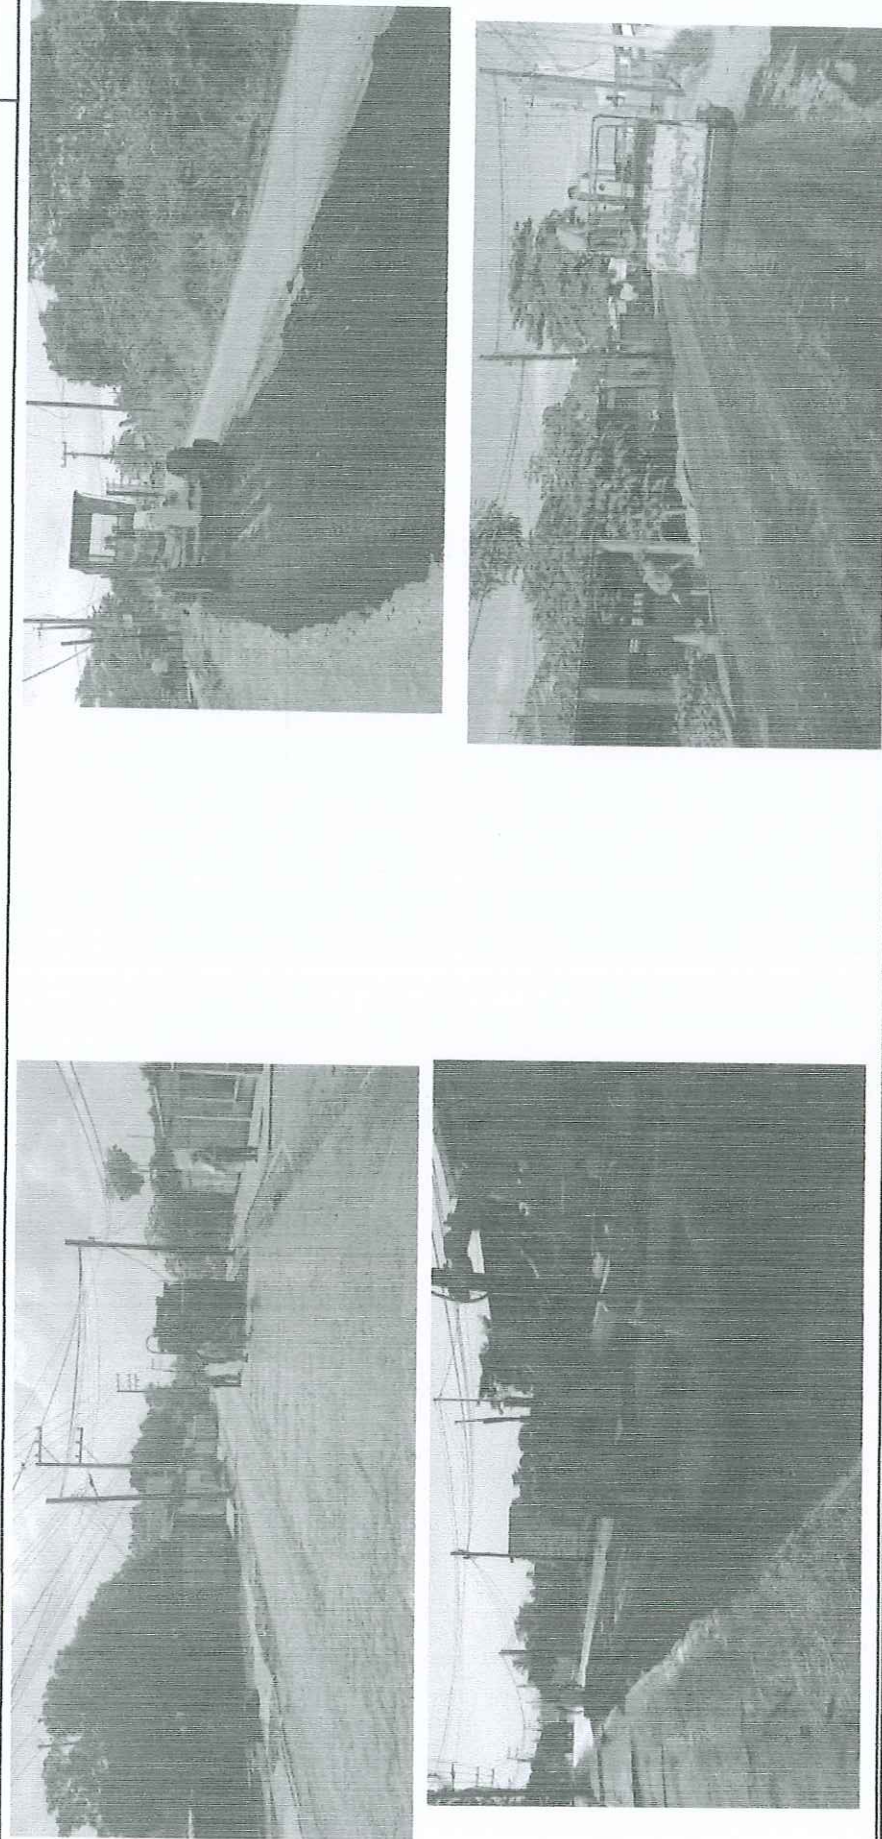


FORMULO: 
 ING. CARLOS MANUEL NARVAEZ BENITEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO: 
 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL - JALPA DE MENDEZ.
 PROYECTO: I0082.- REHABILITACION DE CARRETERA AMATITAN ENTRADA SAN JUANITO CON CONCRETO ASFALTICO TRAMO 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.
 LOCALIDAD: 0002.- POB. AMATITÁN MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
 TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III
 CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-008-2022 DE FECHA: 22 DE ABRIL DE 2022
 AREA RESPONSABLE: 008.- DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 ESTIMACION No. 01 (UNO) TRABAJOS EJECUTADOS
 PERIODO ESTIMADO : DEL 02 AL 15 DE MAYO DE 2022
 FECHA DE ESTIMACION : 18 DE MAYO DE 2022

ALBUM FOTOGRAFICO
 PAG. 1 DE 12
GRUPO OBRAMEX S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA : GRUPO OBRAMEX, S.A. DE C.V.
 R.F.C.: GOB080220C4A
 R.U.C.T.: SFP-RUC-01488
 LOCALIDAD : CALLE MARGARITA No. 108, No. INT. CASA 1, COL. JARDINES DE VILLAHERMOSA,
 MUNICIPIO : VILLAHERMOSA, TABASCO. C.P. 86027

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD
1.01	Desorille con equipo moto conformadora p.u.o.t.	Km

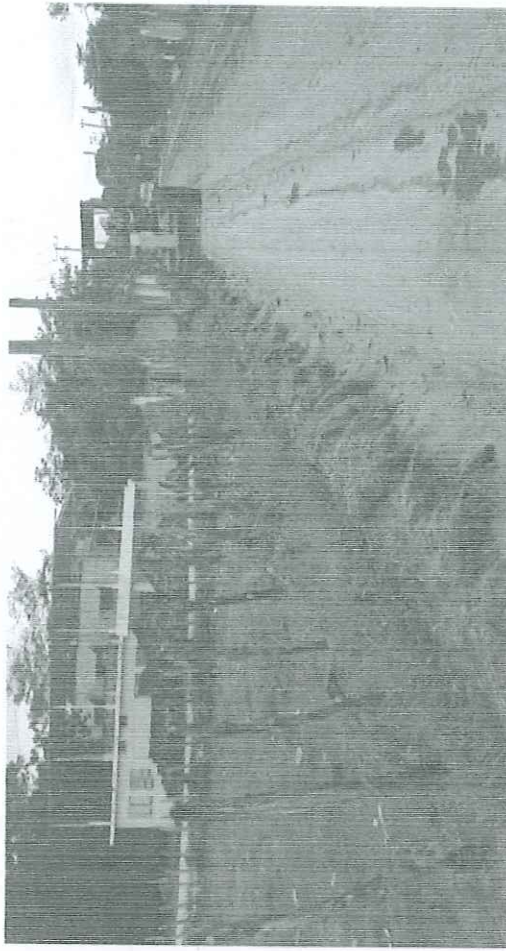

FORMULO: 
 ING. CARLOS MANUEL NARVAEZ BENITEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO: 
 ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZÁLEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

Fecha:

02/MAYO/2022

No.

01

NOTAS DE BITÁCORA

NOTA 01

Con esta fecha se da inicio (Apertura) a la presente bitácora de obra:

Datos Generales

Nombre de la obra: 10082.- Rehabilitación de carretera
 Amatitán Entrante San Juanito con Concreto ASPALTICO
 Tramo 0+000 AL 1+254 MUNICIPIO de Jalpa de Méndez.

Localidad: 0002.- POB. Amatitán

Contrato No: CTO-OP-MIAL-D00TSM-F111-008-2022

Origen de los Recursos: Ramo 33 FONDO 111

Modalidad de ejecución: Contrato

Importe Contratado: \$ 3,595,425.01

Fecha de inicio: 02 de Mayo de 2022

Fecha de terminación: 31 de Mayo/2022

Importe Autorizado: \$ 3,635,241.90

Plazo de ejecución: 30 HUS

Meta: 1.25 Km

Empresa Contratista: Grupo obramex, S.A. de C.V.

Por Parte de la Dependencia

Por la empresa

ING. José Alfredo Jiménez González
 Residente de obra

Cel. Prof. 2009061

ING. Carlos Manuel
 Jiménez Benítez
 Superintendente de
 Construcción

Cel. Prof. 5925187

Fecha: 02/MAYO/2022

No. 02

NOTA 02

Con esta fecha se Realiza la colocación del letrero Alusivo de obra, de Acuerdo A las indicaciones del Residente de obra, por Parte del Ayuntamiento de Jalpa de Mendez.

Por Parte del Ayuntamiento

Por la empresa

Iny. Jose Alfredo Jimenez Gonzalez Residente de obra

Iny. Carlos Manuel Norvaz Benitez Superintendente de Construcción

02/MAYO/2022

NOTA 03

Con esta fecha se le informa Al Ayuntamiento de obra que se Realiza el desorille del camino utilizando de una moto con faros; de igual forma se menciona que se utiliza los señalamientos preventivos ya que una zona muy transitada, por Vehiculos Ligeros y Pesados.

Por Parte del Ayuntamiento

Por la empresa.

Iny. Jose Alfredo Jimenez Gonzalez Residente de obra

Iny. Carlos Manuel Norvaz Benitez Superintendente de Construcción.

Fecha: 04/MAYO/2022

No. 03

NOTA 04

Con esta fecha se da inicio con los trabajos de Bacheo Superficial y Calaverado en Carretera Asfáltica existente de forma manual; Cabe hacer mención que debido al intenso tránsito vehicular se opta por realizar los trabajos de bacheo de forma mecánica; con el objeto de realizar los trabajos lo más rápido posible; con el fin de no obstaculizar el tránsito vehicular; Se utilizan los señalamientos preventivos en todo momento.

Por Parte de la Dependencia

Por la empresa

Ing. Jose Alfredo Jimenez
Gonzalez
Residente de Obra

Ing. Carlos Manuel Navarrete
Benitez
Superintendente de Construcción

NOTA 05

05/MAYO/2022

Con esta fecha se realiza el Bacheo de la Superficie para la aplicación de Piso de Agua (para renovación) y construcción de Carretera con concreto asfáltico en caliente con material Petreo grueso de 1/2" a 9.5% y Cemento Asfáltico PG-64-22 compactado al 95%; Cabe hacer mención que a su vez se continúa con la ejecución de bacheo superficial de acuerdo a las indicaciones de la Residencia de obra.

Por Parte de la Dependencia

Por la Empresa

Ing. Jose Alfredo Jimenez
Gonzalez
Residente de Obra

Ing. Carlos Manuel Navarrete
Benitez
Superintendente de Construcción

07/Mayo/2022

04

NOTA 06

Con esta fecha se continúan con la ejecución de los trabajos de balceos superficial de forma manual y forma mecánica; También se continúan con los trabajos de Barrido de Superficie; Aplicación de ney de agua para fendido y construcción de carpeta asfáltica en caliente. Con material pedregal grado de 1/2" a 4mm, y cemento asfáltico PG-64-22. Compactada a 95%.

Por la Dependencia

Por la empresa

Ing. José Alfredo Jiménez González
Resistente de obra

Ing. Carlos Manuel Nuñez González
Superintendente de Construcción.

NOTA 07

09/Mayo/2022

Con esta fecha se hace mención que se concluyen con los trabajos de Balceos y por lo tanto se continúa con los trabajos de Barrido de superficie; Riego de agua para compactación con carpeta asfáltica en caliente, se acuerda a los mismos efectos del resistente de obra.

Por parte de la Dependencia

Por la empresa

Ing. José Alfredo Jiménez González
Resistente de obra

Ing. Carlos Manuel Nuñez González
Superintendente de Construcción.

Fecha: 10 / MAYO / 2022

No. 05

NOTA 08

Con esta fecha se le informa a la residencia de obra que se realiza los trabajos de terrazo de Superficie para construcción de Carpetas asfálticas en caliente y el riego de ligas con emulsión asfáltica a razón de 1,20 LTS/m²; la construcción de la Carpetas asfáltica es completada al 95%; se hace mención que realicen los Puntos Rectificadores por el Laboratorio de mezcla de Suelos.

Por Parte de la Residencia

Por la empresa

Mrs. Jose Alfredo Jimenez Gonzalez
Residente de obra

Mrs. Carlos Manuel Norvaz Benitez
Superintendente de construcción

NOTA 09

11 / MAYO / 2022

Con esta fecha se continúa con la elaboración de Superficie, Riego de ligas para Suministro y construcción de Carpetas con concreto asfáltico en caliente con material pesado grava de 1/2" a 3/4" y cemento asfáltico P.B. - 64-22, compacta al 95%; se hace mención que se va a generar un Al Doble Al Nivelación de trabajo debido al alto flujo vehicular con el fin de terminar los trabajos en tiempo y forma.

Por Parte de la Residencia

Por la empresa

Mrs. Jose Alfredo Jimenez Gonzalez
Residente de obra

Mrs. Carlos Manuel Norvaz Benitez
Superintendente de construcción

Fecha: 12/MAYO/2022

No. 66

NOTA 10

Con esta fecha se le informa a la Residencia de obra que se continúa con la ejecución de los trabajos de Barrido de Superficie, Aplicación de Viego de Liga con emulsión asfáltica a razón de 112 LTS/M² Suministro y Construcción de Carleta asfáltica en caliente con material Petrol y cemento asfáltico PB-64-22 Compactado Al 95%.

Por Parte de la Residencia

Por la Empresa

Ing. José Alfredo Jiménez González
Residente de Obra

Ing. Carlos Manuel Naranjo Benítez
Superintendente de Construcción

NOTA 11

14/MAYO/2022

Con esta fecha se le informa a la Residencia de obra que se concluye con los trabajos de Construcción de Carleta asfáltica en caliente de ACU-PRADO A las indicaciones del residente de obra de igual manera se da inicio con los trabajos de Barrido de Superficie para la Aplicación de Viego de Liga de emulsión para el suministro y aplicación de Sello Premezclado Sincronizado con equipo Compactador. A su vez se realiza la construcción de tapas de sección de 5 x 1.50 x 1.00 cm. mezcla asfáltica en caliente de acuerdo a las indicaciones del residente.

Por Parte de la Residencia

Por la Empresa

Ing. José Alfredo Jiménez González
Residente de Obra

Ing. Carlos Manuel Naranjo Benítez
Superintendente de Construcción

Fecha:

19 / MAYO / 2022

No.

08

NOTA 1A

Con esta fecha se le hace entrega al residente de obra del Ayuntamiento de la estimación 01 (una) Troncales elevadas del periodo del 02 Mayo AL 19 de Mayo de 2022. con la siguiente documentación:

- Director de Pautura
- Constata de estimación
- estimación
- Generadores de obra
- Croquis
- Album Foto Grafico
- NOTAS de bitácora
- Pruebas de Laboratorio

Lo Anterior para su tramite correspondiente

Por parte de ~~la Alcaldía~~

Ing. Jose Alfredo Jimenez
Gonzalez
residente de obra

Por la empresa

Ing. Carlos Manuel Norvaez
Benitez
Superintendente de Construcción
