



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

**Contrato de Obra Pública a Base**

**de Precios Unitarios y Tiempo Determinado**

<b>Licitación</b>	MJM-ADJ-ISR-001-22
<b>Fecha de Licitación:</b>	19 de agosto de 2022
<b>Descripción De la Obra:</b>	10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*
<b>Localidad:</b>	0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán
<b>Programa:</b>	Carreteras
<b>Actividad Institucional:</b>	006.- Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
<b>Autorización del Recurso:</b>	OFICIO DPM/446/2022
<b>Fecha de Autorización del Recurso:</b>	17 de agosto de 2022
<b>Aprobación por Cabildo:</b>	ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 031.- de fecha: 19 de junio de 2022
<b>Unidad Responsable:</b>	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
<b>Partida:</b>	61501.- Construcción de vías de comunicación
<b>Origen de los Recursos:</b>	ISR
<b>Metas:</b>	36.85 M3

<b>Contrato No:</b>	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022	
<b>Fecha De Contrato:</b>	08 de septiembre de 2022	
<b>Importe Autorizado:</b>	\$79,680.50	Incluye I.V.A.
<b>Importe Contratado:</b>	\$78,703.58	Incluye I.V.A.
<b>Anticipo: 30 %</b>	\$23,611.07	Incluye I.V.A.
<b>Fecha de Visita De Obra:</b>	26 de agosto de 2022	
<b>Plazo de Ejecución:</b>	30 Días	
<b>Fecha de Adjudicación:</b>	06 de septiembre de 2022	
<b>Mod de la Adjudicación:</b>	Adjudicación directa	
<b>Fecha de Inicio:</b>	11 de septiembre de 2022	



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón Año de Magón  
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

Fecha de Terminación:	10 de octubre de 2022
Contratista:	GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Representante legal:	FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ
Domicilio Fiscal:	PRIVADA ZOTZ MANZANA 13 LOTE 4 ENTRE CALLES KAKULKÚ E ITZÁM, COL. LA VENTA, CENTRO
Ciudad o Población:	CENTRO, TABASCO
Clave de RFC:	GBC1911062X5
Teléfono:	9932196757
Registro del IMSS:	E7570211101

Contrato de la Obra Pública a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quién en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el **C. Rafael Ramón Morales** en calidad de Presidente del comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: **GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.** a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por el: FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ en su carácter de Representante Legal.

### DECLARACIONES

#### I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo

I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón  
Año de  
PRESIDENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

1.3.- que la **Lic. Nuris López Sánchez**, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la sesión ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y síndico de hacienda, respectivamente, para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- El C. **Carlos Mario Juárez Hernández**, acredita su personalidad como **Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**, con su nombramiento de fecha 5 de octubre de 2021, otorgado por la **Lic. Nuris López Sánchez**, Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

## II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser Persona Jurídico Colectiva tal y como acredita su personalidad jurídica mediante escritura pública No. 3420 volumen 70 de fecha 06 de noviembre de 2019, pasada ante la fé del Lic. LIC. JAIME ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ, titular de la notaría Pública número 25, con adscripción en la ALLENDE No. 202 ESQ. ARISTA, VILLAHERMOSA; TAB.; Registro Federal de Contribuyente GBC1911062X5, que cuenta con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. E7570211101, así como con el registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-04385

II.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: PRIVADA ZOTZ MANZANA 13 LOTE 4 ENTRE CALLES KAKULKÚ E ITZÁM, COL. LA VENTA, CENTRO, CENTRO, TABASCO; mismo que señala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos señala correo electrónico **grupobetepsacyhotmail.com** mismo que estará vigente, para los conceptos previstos en la cláusula vigésima quinta y demás obligaciones previstas en este instrumento.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos.

II.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;

Plaza Hidalgo # 1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
PRELUDIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

### **III.- LAS PARTES DECLARAN:**

III.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

### **CLÁUSULAS**

#### **PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO**

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a las obras:

**10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*** en la localidad de: **0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán** del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecución de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

#### **SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.**

El importe del presente contrato es por la cantidad de: **\$78,703.58 (Setenta y ocho mil setecientos tres pesos 58/100 m.n.)** incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

#### **TERCERA. - PLAZOS**

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de **30 días naturales**, siendo la fecha de inicio **11 de septiembre de 2022** y la terminación el día: **10 de octubre de 2022**

Plaza Hidalgo #1. 06200, Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

**CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN**

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.** mediante el procedimiento de Adjudicación directa licitación No. **MJM-ADJ-ISR-001-22**

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 06 de septiembre de 2022 en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

**QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS**

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos: ISR autorizados mediante: Oficio emitido por el OFICIO DPM/446/2022 de fecha 17 de agosto de 2022 afectando la partida: 61501.- Construcción de vías de comunicación

**SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:**

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

**SÉPTIMA. - ANTICIPOS.**

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por ciento) monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: \$23,611.07 (Veintitrés mil seiscientos once pesos 07/100 m.n.) incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A. ), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de  
Mayo  
RÍCARDO FLORES  
SECRETARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

#### **OCTAVA. - GARANTÍAS.**

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

I.- Que la fianza se otorgará avendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

II.- Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Finanzas Municipal.

III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores  
Año de Maíz  
PRELITOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

**Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.**

**NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

**DÉCIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

"EL CONTRATISTA" deberá tener un representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación

Plaza Hidalgo #1. 86200. Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberá contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar, mismo que fungirá como director responsable de obra, según lo establecido en el Artículo 56, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 días naturales, el contratista deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las fechas de corte de las estimaciones podrán ser los días 15, 30 y término de obra.

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas señaladas para ello, será declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente será notificado a la Contraloría municipal y a la Función Pública para su incorporación en el listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, "EL CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones:

CONCEPTO	PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA	0.5% (CINCO AL MILLAR)

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
RICARDO FLORES DE LA BECERRIL MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA  
DE LA CONSTRUCCIÓN

0.2% (DOS AL MILLAR)

### **DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS**

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

**En caso de inasistencia del contratista "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su recepción física.**

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo que no exceda de quince días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente.

### **DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.**

"EL AYUNTAMIENTO", podrá, dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,

Plaza Hidalgo # 1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón  
Año de  
MAYOR  
PRESENCIA DE LA LENGUA DE LA MEDIANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

cumpliendo con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

**DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS**

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

**DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

**DÉCIMA SÉPTIMA. - SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO**

Puerta Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.





CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

#### **DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS**

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

#### **DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES**

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecución de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:

- a) Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al contrato **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022**.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos pactados en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecución de los de los trabajos correspondiente al contrato **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022**, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará una penalización a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retención económica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos

Pista Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

programados en el Programa de Ejecución de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retención, "EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el **CONTRATISTA** no ha recuperado los atrasos anteriores, la penalización respectiva será aplicada en términos de lo siguiente:

- i. Si la cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
- ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
- iii. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha señalada para la terminación total de los trabajos correspondientes al contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificará que el "CONTRATISTA" haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalización establecida en este inciso, quedarán en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicación de la penalización establecida en el inciso b) de ésta cláusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la conclusión de los trabajos.

b) Penalización por atraso en la terminación de los trabajos correspondientes al "Contrato"

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos correspondientes al "CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalización definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (**cero punto tres por ciento**) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al "Contrato" no concluida; dicha penalización será aplicada por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el "contrato" de que se trate, misma que será efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta cláusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontará de las estimaciones en

Pista Hidalgo #1. 65200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
RUBÉN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

trámite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalización señalada en este inciso b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO" por cada día natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada día de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

**(0.3% x Trabajos no ejecutados x Días de atraso)**

**Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados**

**Días de atraso=Fecha programada de terminación - Fecha de conclusión de los trabajos**

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

El monto máximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliación de Monto, se generan al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula "EL AYUNTAMIENTO", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje señalado en el párrafo anterior, debiendo además ejecutar la garantía de cumplimiento.

#### **VIGÉSIMA. - REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO**

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón  
Año de Maestría  
REPUBLICA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

**VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.**

*Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.*

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

*"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrán ser mayor de 20 días naturales. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.*

**VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO**

*"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.*

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.*
- II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.*
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".*
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.*
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.*
- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;*

Plaza Hidalgo # 1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

#### **VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
Magón  
PRECURSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

#### **VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

*"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".*

*"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.*

*"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.*

*El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de las observaciones que deriven de las auditorías internas o externas practicadas a este proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.*

#### **VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES**

*"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.*

#### **VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN**

*Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al*

Plaza Hidalgo # 1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.







**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
DEFENSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

fueo que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco a los: 08 días del mes de septiembre de 2022 .

"POR EL AYUNTAMIENTO"

C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del comité de obra

"EL CONTRATISTA"

GRUPO BETEPSA  
CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ  
Representante Legal

TESTIGOS

C. Carlos Mario Juárez Hernández  
Director de Obras, Ordenamiento Territorial  
y Servicios Municipales

C. Eder Izquierdo Hernández  
Director de Finanzas  
Municipal

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo López Coronel  
Año de la  
Municipalidad

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/339/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

CALLE ARBOLEDAS S/N, COL. CENTRO, VILLA JALPA, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

PRESENTE

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*		
Localidad	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Meco		
No Licitacion	MJM-ADJ-ISR-001-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	26-ago.-22	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	26-ago.-22	12:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	05-sep.-22	10:00 a. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	11-septiembre-2022
Especialidad Requerida	110 Reconstrucción, Modificación y Remodelación		
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	26-agosto-2022		

c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

Fecha 19/08/22  
Remedio Lopez Coronel



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de **Magón**  
REFUNDADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


*Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4*

***No podrán subcontratarse partes de la obra.***

*La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.*

*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.*

*No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.*

Atentamente  
  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de obra



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



Ricardo  
Añido  
SECRETARIO DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/338/2022

GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

INVITACION

PRIVADA ZOTZ MANZANA 13 LOTE 4 ENTRE CALLES  
KAKULKÚ E ITZÁM, COL. LA VENTA, CENTRO,  
CENTRO, TABASCO

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

PRESENTE

FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ

ATENCION

REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*		
Localidad	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Meco		
No Licitacion	MJM-ADJ-ISR-001-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	26-ago.-22	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	26-ago.-22	12:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	05-sep.-22	10:00 a. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	11-septiembre-2022
Especialidad Requerida	110 Reconstrucción, Modificación y Remodelación		
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	26-agosto-2022		

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor

Municipal 34

Pajon 19/08/2022. Página 1 de 2

Francisca Pérez Sánchez



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón  
Año de  
MAGÓN  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

*Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4*


***No podrán subcontratarse partes de la obra.***

*La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.*

*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.*

*No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.*

Atentamente

  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de obra

**GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA  
SA. DE CV.**



G.B. CYC, SA DE CV.

RFC: GBC1911062X5, CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4, FRACC. LA VENTA,  
CP. 86288, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO. EMAIL: [grupobetepsacyc@hotmail.com](mailto:grupobetepsacyc@hotmail.com)  
TELF.: 9932196757 / 9931504663

VILLAHERMOSA TABASCO, A 19 DE AGOSTO DE 2022

ASUNTO: CARTA DE ACEPTACION

**C. RAFAEL RAMÓN MORALES**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA  
JALPA DE MENDEZ, TABASCO.  
PRESENTE:

POR ESTE MEDIO ME PERMITO MANIFESTARLE MI ACEPTACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA. No. MJM-ADJ-1SR-001-22, DENOMINADO: I0132.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION \*ISR\*, I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN, \*ISR\*, I0134.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA, EN LA LOCALIDAD 003.- POB. AYAPA, 0011.- R/A. CHACALAPA IRA. SECCION, 0022.- RA. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

C. FRANCISCA PEREZ SANCHEZ

ADMINISTRADOR UNICO



16 DE SEPTIEMBRE No 200 CP 86707  
CD PEMEX, MACUSPANA  
Gerenciarrunkarsoluciones01@outlook.com Teléfono  
9613276350

JALPA DE MENDEZ TABASCO A 19 DE AGOSTO DE 2022

ASUNTO: CARTA DE ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN

**C. RAFAEL RAMÓN MORALES**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA**  
**JALPA DE MENDEZ TAB.**  
**PRESENTE:**

ACEPTÓ DE PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN EN LA LICITACIÓN No. MJM-ADJ-ISR-001-22 DE No. MJM-ADJ-ISR-001-22, TENIENDO COMO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:- I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN \*ISR\*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA \*ISR\*, LOCALIDAD: 0003.- POB. AYAPA, 0011.- CHACALAPA 1RA. SECCIÓN, 0022.- R/A. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.


ATENTAMENTE

  
ING. MARIO TELEZ PÉREZ  
APODERADO LEGAL



# CONSTRUCCIONES CIVILES Y SUS DERIVADOS

## UN ORGANISMO DE ESPACIO INTEGRAL



REMEDIO LOPEZ CORONEL

R.F.C. LOCR-611218-6XA C.U.R.P. LOCR611218HTCPRM06

ARBOLEDAS S/N COL. VILLAJALUPA ENTRE CALLES CARRETERA A LA RA. LA CRUZ  
C.P. 86200 VILLA JALUPA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

VILLA JALUPA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 20 DE AGOSTO DE 2022

ASUNTO: ACEPTACION A INVITACION

C. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA.  
JALPA DE MENDEZ TABASCO.

PRESENTE

ME REFIERO A LA INVITACION A PARTICIPAR EN LA LICITACION POR ADJUDICACION DIRECTA, DE LAS OBRAS: **I0132.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION \*ISR\***, **I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\***, **I0134.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA \*ISR\***. UBICADO EN LAS LOCALIDADES: **0003.- POB. AYAPA**, **0011.- CHACALAPA 1RA. SECCION**, **0022.- R/A. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ TABASCO.** CON No. DE LICITACION: **MJM-ADJ-ISR-001-22.** ME PERMITO MANIFESTARLE **MI ACEPTACION** A PARTICIPAR EN DICHO PROCESO.

POR LO ANTERIOR, QUEDO ANTE SUS FINAS ATENCIONES

ATENTAMENTE

  
REMEDIO LOPEZ CORONEL  
ADMINISTRADOR UNICO







**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Ricardo Flores Magón**  
Año de la Revolución Mexicana  
MAYORÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
No. OFICIO: COPM/335/2022  
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**C. Manuel Pérez Ricárdez**

Segundo vocal y Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Atentamente,

**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

11:32 am  
31 AGO. 2022  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

JALPA DE MÉNDEZ  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
31 AGO. 2022  
RECIBIDO  
SINDICO DE HACIENDA

Hora: 11:32 am  
*[Handwritten signature]*



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
PRECURSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/330/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**MIPA. Carlos Emilio Hernández González**

Presidente del Consejo Directivo

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitación	Fecha y hora de apertura
10132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN 'ISR', 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN 'ISR', 10134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA 'ISR'	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

**Atentamente**

**C. Rafael Ramon Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 34

Página 1 de 1

*Handwritten signature and date: 31/08/22*



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/337/2022.

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**C. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director de la Dirección de Obras,**  
**Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**

Secretario Técnico

**Edificio**


En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN 'ISR', I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN 'ISR', I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA 'ISR'	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente  
**C. Rafael Ramón Morales**



c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 34



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de  
1902  
CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
No. OFICIO: COPM/336/2022  
ASUNTO: INVITACION  
Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**C. Eder Izquierdo Hernández**

Primer vocal

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripción Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitación	Fecha y hora de apertura
10132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, 10134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021, 2024  
11:32 a.m.  
31 AGO. 2022  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE CONTRATORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021, 2024  
30 AGO. 2022  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
10:21

c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 34

Página 1 de 1



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
MAYORADO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/333/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**C. Cristian David Coronel Santos**

Dir. De contraloría

**Edificio**

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

**Atentamente**  
**C. Rafael Ramon Morales**  
Presidente del Comité de la Obra



c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 34



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Ricardo Flores Magón**  
Año de Magón  
PRELUSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
No. OFICIO: COPM/334/2022  
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**C. Cristian David Coronel Santos**

Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, 10134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

**Atentamente**  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024  
1132 Com  
31 AGO. 2022  
REGIDOR  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 34

Página 1 de 1



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores**  
Año de Magón  
SECRETARÍA DE LA DELEGACIÓN TABASCO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
No. OFICIO: COPM/331/2022  
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**Ing. Fernando Naranjo Broca**

Presidente De La (CMIC) Delegación Tabasco

Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO-MECOACAN *ISR*, 10134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

**Atentamente**  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra



RA  
c.c.p.- Archivo 12:22 p.m. J...  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**Ricardo Flores Magón**  
Año de la Revolución Mexicana

**DEPENDENCIA:** DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
**No. OFICIO:** COPM/332/2022  
**ASUNTO:** INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 19 de agosto del 2022

**L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora**

Secretario De La Funcion Publica

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, 10134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-ISR-001-22	5 de septiembre del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

**Atentamente**  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
C. Cristian David Coronel Santos  
31 AGO. 2022  
12:13  
sh  
Rafael Morales  
Página 1 de 1

c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 34





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
FLORES  
MAGÓN  
Año de  
MAGÓN  
MAYOR  
DEL GOBIERNO DE LA ESTADIDAD DE TABASCO

## "Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación directa

Jalpa de Méndez, Tabasco a 26 de agosto del 2022

No Licitacion	MJM-ADJ-ISR-001-22
Descripcion de la Obra	I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*
Localidad	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 10:00:00 a. m. del día 26 de agosto del año 2022, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Asimismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	
C. REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	
GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	
C. FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ	
RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	
C. DISNEY HERNÁNDEZ IZQUIERDO	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ARQ. DANIELA RABANALES MÁRQUEZ	



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022** *Ricardo Flores*  
*Año de Magón*  
DECLARADO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**MODALIDAD:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**LICITACIÓN No:** I/JM-ADJ-ISR-001-22  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN \*ISR\*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA \*ISR\*  
**UBICACIÓN:** 0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán

**LISTA DE ASISTENCIA APERTURA**

**POR LOS PARTICIPANTES**

**CONTRATISTA**

**REPRESENTANTE**

**FIRMA**

GRUPO CONSTRUCCIONES COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. **BETEPSA Y FRANCISCO PEREZ SANCHEZ**

*[Handwritten signature]*

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

*Remedio Lopez Coronel*

*[Handwritten signature]*

RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.

*Disney Hernández*

*[Handwritten signature]*

Plaza Hidalgo #1, B6200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo

Jalpa de

Méndez

### "Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación directa

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 12:00:00 p. m. del día 26 de agosto del año 2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente: 1.- Se hace la precisión a los licitantes que esta junta se podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

#### Licitación No. MJM-ADJ-ISR-001-22

Descripción de la Obra	I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACÁN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA *ISR*
Localidad	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mécoacán
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
REMEDIO LÓPEZ CORONEL C. REMEDIO LÓPEZ CORONEL	



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**Ricardo Flores**  
**2022 Año de Magón**  
SECRETARÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.

C. FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ

RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.

C. DISNEY HERNÁNDEZ IZQUIERDO

Por el H. Ayuntamiento

C. José Isabelino de la Cruz Isidro  
*Jefe del Departamento de Licitaciones*

*Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.*

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación

**Licitación No. MJM-ADJ-ISR-001-22**

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las propuestas.

02.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega provisional por obra. No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir

*Plaza Hidalgo #1, Box 00, Jalpa de Médez, Tab.*





**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
SECRETARÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo  
Año de  
MEXICO

**"Acta de Presentación y Apertura de Propuestas"**

**Modalidad: Adjudicación directa**

No Licitación	MJM-ADJ-ISR-001-22	Presupuesto Base con IVA	\$387,289.25
Descripción de la Obra		Localidad	
10132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN 'ISR', 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACÁN 'ISR', 10134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA 'ISR'		0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecocacán	
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES		

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 10:00:00 a. m. del día 5 de septiembre del año 2022 y de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No: 1 Col. Centro, los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal, y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones" asignado mediante oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1 GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
- 2 RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.
- 3 REMEDIO LÓPEZ CORONEL

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuación:

**EMPRESAS DESECHADAS**

LICITANTE	SITUACION DE LA PROPUESTA
Ninguna.	

**EMPRESAS ACEPTADAS**

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$330,447.00	30 días
2	RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	\$331,900.95	30 días

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

3	REMEDIO LÓPEZ CORONEL	\$333,203.91	30 días
---	-----------------------	--------------	---------

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimiento en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromiso de las propuestas; el fallo de esta licitación se comunicará a los participantes el día: 6 de septiembre del 2022 a las 10:00:00 a. m., en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Comité de la Obra Pública Municipal

Firmas

**C. José Isabelino de la Cruz Isidro**  
Jefe del Departamento de Licitaciones

**C. Carlos Mario Juárez Hernández**  
Secretario Técnico

Licitante / Representante

Firmas

GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  
C. FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ

REMEDIO LÓPEZ CORONEL  
C. REMEDIO LÓPEZ CORONEL

RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.  
C. DISNEY HERNÁNDEZ IZQUIERDO



**DIRECCIÓN DE**  
**OBRAS, ORDENAMIENTO**  
**TERRITORIAL Y SERVICIOS**  
**MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores  
 Año de Magón  
 PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**MODALIDAD:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**LICITACIÓN No:** M/M-ADJ-ISR-001-22  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN \*ISR\*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA \*ISR\*  
**UBICACIÓN:** 0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecoacán

**LISTA DE ASISTENCIA VISITA**

**POR LOS PARTICIPANTES**

**CONTRATISTA**

**REPRESENTANTE**

**FIRMA**

GRUPO CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. **BETEPSA**  
 Y FRANCISCO PEREZ SANCHEZ

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

Remedio Lopez Coronel

RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.

Risary Hernandez 129

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.







**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO**  
**YUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**  
 2021-2024  
**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-ISR-001-22

OBRA: I0132.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA RIA CHACALAPA 1RA. SECCION \*ISR\*

UBICACIÓN: 0011.-R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE				GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.				RINKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.				REMEDILO LOPEZ CORONEL			
	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
1	PRELIMINARES.															
DESM-CERC	26	108.62 \$	2,850.12 \$	2.802%	106.39 \$	2,766.14 \$	-3%	2.754%	106.39 \$	2,766.14 \$	-3%	2.741%	108.02 \$	2,808.52 \$	-1%	2.779%
	ml	Desmantelamiento de cerca natural de 2.00 ms. de altura, con 4 hilos de alambre de pua y postes rollizos a cada 2.00 m. de distancia con medios manuales incluye: extracción de postes de hasta 50 cm. de entierro, rellenos de oficios producto del retiro de postes, herramienta y mano de obra.														
CERC	26	\$302.71	7,870.46 \$	7.738%	302.24 \$	7,858.24 \$	0%	7.823%	302.24 \$	7,858.24 \$	0%	7.786%	303.88 \$	7,900.88 \$	0%	7.800%
	ml	Desmantelamiento de cerca natural de 2.00 ms. de altura, con 4 hilos de alambre de puas cal. 12 fijado con grampos de acero galvanizado, postes rollizos a cada 2.00 m. de distancia con medios manuales incluye: hincado de postes de hasta 50 cm. de profundidad, fijado de postes con material producto de la excavación, herramienta y mano de obra.														
DEMO-LOS	1.73	\$2,476.96	4,285.14 \$	4.213%	2,448.71 \$	4,236.27 \$	-1%	4.217%	2,515.33 \$	4,351.52 \$	2%	4.311%	2,465.45 \$	4,265.23 \$	0%	4.211%
	m3	Demolición de bsa superior de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'c= 250 kg/cm2, hasta una altura de 12.50 m. de sección 3.40 m x 3.40 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoledor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producto de la demolición a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.														



LICITACION No: MJM-ADJ-ISR-001-22  
 OBRA: I0132.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA RIA CHACALAPA 1RA. SECCION \*ISR\*  
 UBICACIÓN: 0011.-R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE				GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.				RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.				REMEDI LOPEZ CORONEL			
	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	
5.1	\$2,580.14	\$ 13,158.71	12.937%	\$ 2,550.74	\$ 13,008.77	-1%	12.951%	\$ 2,623.17	\$ 13,378.17	2%	13.255%	\$ 2,568.18	\$ 13,097.72	0%	12.931%	
m3																
Demolición de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm2, hasta una altura de 10.00 m hasta 12.50 m de altura, de sección 3.40 m x 2.50 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoledor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producto de la demolición a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.																
1.73	\$2,338.10	\$ 4,044.91	3.977%	\$ 2,306.40	\$ 3,990.07	-1%	3.972%	\$ 2,306.40	\$ 3,990.07	-1%	3.953%	\$ 2,322.91	\$ 4,018.63	-1%	3.967%	
m3																
Demolición de losa de fondo de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm2, hasta una altura de 10.00 m, de sección 3.40 m x 3.40 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoledor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producto de la demolición a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.																
16	\$2,064.14	\$ 33,026.24	32.471%	\$ 2,040.60	\$ 32,649.60	-1%	32.505%	\$ 2,040.60	\$ 32,649.60	-1%	32.349%	\$ 2,054.55	\$ 32,872.80	0%	32.454%	
m3																
Demolición de columnas, trabes y muros de concreto armado F'C= 250 kg/cm2, de hasta 20 cm de espesor de 0.00 m, hasta 10 m, de altura con equipo mecánico (Martillo demoledor) y herramienta manual, incluye: andamios, equipo de protección, herramienta y mano de obra.																



**LICITACION No:** MJM-ADJ-ISR-001-22  
**OBRA:** I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA RIA CHACALAPA 1RA. SECCION \*ISR\*  
**UBICACIÓN:** 00111.-R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO BASE			GRUPO BETERPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.			REMEDILO LOPEZ CORONEL					
		IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
7.69	\$2,323.19	\$ 17,865.33	17.665%	-1%	\$ 2,289.27	\$ 17,604.49	17.526%	-1%	\$ 2,289.27	\$ 17,604.49	17.442%	-1%	\$ 2,305.80	\$ 17,791.60	-1%	17.506%
48.38	\$182.70	\$ 8,839.03	8.690%	-3%	\$ 177.33	\$ 8,579.23	8.541%	-3%	\$ 177.33	\$ 8,579.23	8.500%	-3%	\$ 180.05	\$ 8,710.82	-1%	8.600%
48.38	\$201.97	\$ 9,771.31	9.607%	0%	\$ 201.59	\$ 9,752.92	9.710%	0%	\$ 201.59	\$ 9,752.92	9.663%	0%	\$ 204.30	\$ 9,884.03	1%	9.759%

SUB-TOTAL: \$ 101,711.25  
 IVA: \$ 16,273.80  
 TOTAL: \$ 117,985.05

\$ 100,445.73  
 \$ 16,071.32  
 \$ 116,517.05

\$ 100,830.38  
 \$ 16,148.86  
 \$ 117,079.24

\$ 101,290.23  
 \$ 16,208.44  
 \$ 117,498.67

**EL ORO**  
  
 ING. JOSÉ ISIDORO DE LA CRUZ ISIDORO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOTSIM.



**YUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**  
**2021-2024**  
**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
*"2021, Año de la Independencia"*



LICITACION No: MJJM-ADJ-ISR-001-22  
 OBRA: I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*  
 UBICACIÓN: 0022.-RVA. CAMPO PETROLERO MECOACAN.

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE				GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORAS S.A. DE C.V.				RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.				REMEDO LOPEZ CORONEL				
	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	
1																	
DEMO-LOS	PRELIMINARES.	M3	1.73	2,476.96 \$	0.238%	2,448.71 \$	-1%	6.244%	2,515.33 \$	4,351.52 \$	2%	6.368%	2,465.45 \$	4,265.23 \$	0%	6.234%	
	Demolicion de losa superior de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm2, hasta una altura de 12.50 m, de seccion 3.40 m x 3.40 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoleedor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producido de la demolicion a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.																
DEMO-TANQ		M3	5.1	\$2,580.14 \$	19.157%	2,650.74 \$	-1%	19.173%	2,623.17 \$	13,378.17 \$	2%	19.578%	2,568.18 \$	13,087.72 \$	0%	19.144%	
	Demolicion de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm2, hasta una altura de 10.00 m hasta 12.50 m de altura, de seccion 3.40 m x 2.50 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoleedor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producido de la demolicion a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.																
DEMO-FOND		M3	1.73	\$2,358.10 \$	5.889%	2,305.40 \$	-1%	5.881%	2,306.40 \$	3,950.07 \$	-1%	5.639%	2,322.91 \$	4,018.53 \$	-1%	5.874%	
	Demolicion de losa de fondo de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm2, hasta una altura de 10.00 m, de seccion 3.40 m x 3.40 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoleedor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producido de la demolicion a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.																

*(Handwritten signature)*



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
 2021-2024  
 CÓMITE DE OBRA PÚBLICA  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJJM-ADJ-ISR-001-22  
 OBRA: I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*  
 UBICACIÓN: 0022.-R/A. CAMPO PETROLERO MECOACAN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO BASE				GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.				RINKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.				REMEDILO LOPEZ CORONEL			
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
DEMO-COLLIM Demolición de columnas, traveses y muros de concreto armado F'c=250 Kg/cm2, de hasta 20 cm de espesor de 0.00 m, hasta 10 m, de altura con equipo mecánico (Martillo demoleedor) y herramienta manual, incluye: andamios, equipo de protección, herramienta y mano de obra.	15	\$2,064.14	\$ 33,026.24	48.06%	2,040.60	\$ 32,649.60	-1%	48.122%	2,040.60	\$ 32,649.60	-1%	47.780%	2,054.55	\$ 32,872.80	0%	48.047%
CAR-MAN Carga manual y acarreo en carretilla hasta una estación de 20 m, del material producto de la demolición	36.85	\$182.70	\$ 6,732.50	9.801%	177.33	\$ 6,534.61	-3%	9.631%	177.33	\$ 6,534.61	-3%	9.563%	180.05	\$ 6,634.94	-1%	9.699%
050204A Carga a mano y acarreo en camión volteo hasta 2.00 km. de materiales: petreos, arena, grava, material producto de la excavación sobre pavimento	36.85	\$201.97	\$ 7,442.59	10.635%	201.59	\$ 7,428.59	0%	10.949%	201.59	\$ 7,428.59	0%	10.871%	204.30	\$ 7,528.46	1%	11.004%

SUB-TOTAL: \$ 68,800.10  
 IVA: \$ 10,933.21  
 TOTAL: \$ 79,733.31

\$ 67,847.91  
 \$ 10,855.67  
 \$ 78,703.58

\$ 68,332.56  
 \$ 10,933.21  
 \$ 79,265.77

\$ 68,417.68  
 \$ 10,946.83  
 \$ 79,364.51

ELABORO  
 ING. ROBERTO GARCÍA GONZÁLEZ  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS DE LA UOOTSIM.



LICITACION No: MJM-ADJ-ISR-001-22  
 OBRA: I0134.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA POB. AYAPA"ISR"  
 UBICACIÓN: 0003.-POB. AYAPA

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE			GRUPO BIETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.			REMEDIO LOPEZ CORONEL					
	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
1															
PRELIMINARES:															
DEMÓ-LOS	1.73	2,476.96 \$	2.621%	2,448.71 \$	4,236.27 \$	-1%	2.613%	2,515.33 \$	4,351.52 \$	2%	2.676%	2,465.45 \$	4,265.23 \$	0%	2.609%
Demolición de losa superior de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm <sup>2</sup> , hasta una altura de 12.50 m, de sección 3.40 m x 3.40 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoledor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producido de la demolición a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.															
DEMO-TANQ	5.1	\$2,580.14 \$	8.050%	2,550.74 \$	13,008.77 \$	-1%	8.023%	2,623.17 \$	13,378.17 \$	2%	8.226%	2,588.18 \$	13,097.72 \$	0%	8.011%
Demolición de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm <sup>2</sup> , hasta una altura de 10.00 m hasta 12.50 m de altura, de sección 3.40 m x 2.90 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoledor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producido de la demolición a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.															
DEMO-FOND	1.73	\$2,338.10 \$	2.474%	2,306.40 \$	3,990.07 \$	-1%	2.461%	2,306.40 \$	3,990.07 \$	-1%	2.453%	2,322.91 \$	4,018.63 \$	-1%	2.458%
Demolición de losa de fondo de tanque de almacenamiento de agua potable en mal estado de concreto armado F'C= 250 kg/cm <sup>2</sup> , hasta una altura de 10.00 m, de sección 3.40 m x 3.40 m x 15 cm de espesor con herramienta mecánica (Martillo demoledor) y manual, incluye: carga a mano en botes de 19 litros, descenso del material producido de la demolición a zona de acopio, andamios, equipo de seguridad y protección, herramienta y mano de obra.															



LICITACION No: MJM-ADJ-ISR-001-22

OBRA: 10134.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA POB. AYAPA"ISR"

UBICACIÓN: 0003.-POB. AYAPA

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CANTIDAD	P.U.	PRESUPUESTO BASE			GRUPO BETERSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.			RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.			REMEDIO LOPEZ CORONEL					
		IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %			
16	\$2,064.14	\$ 33,026.24	20.203%	-1%	\$ 2,040.60	\$ 32,649.60	-1%	20.135%	\$ 2,040.60	\$ 32,649.60	-1%	20.075%	\$ 2,054.55	\$ 32,872.80	0%	20.105%
7.69	\$2,323.19	\$ 17,865.33	10.929%	-1%	\$ 2,289.27	\$ 17,604.49	-1%	10.857%	\$ 2,289.27	\$ 17,604.49	-1%	10.824%	\$ 2,305.80	\$ 17,731.60	-1%	10.845%
19.3	\$238.07	\$ 4,594.75	2.811%	-2%	\$ 233.88	\$ 4,513.88	-2%	2.764%	\$ 233.88	\$ 4,513.88	-2%	2.775%	\$ 237.16	\$ 4,577.19	0%	2.800%
6.25	\$2,369.97	\$ 14,812.31	9.051%	-1%	\$ 2,341.06	\$ 14,631.63	-1%	9.023%	\$ 2,341.06	\$ 14,631.63	-1%	8.986%	\$ 2,357.19	\$ 14,732.44	-1%	9.011%





LICITACION No: MJM-ADJ-ISR-001-22  
 OBRA: 10134.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT DE ALTURA POB. AYAPA"ISR"  
 UBICACIÓN: 0003.-POB. AYAPA

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE				GRUPO BETERSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.				RUNKAR SOLUCIONES S.A. DE C.V.				REMEDIO LOPEZ CORONEL			
	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
DEM-CAST Demolicion de columnas, y castillos de concreto armado F'c=200 kg/cm2, de hasta 15 cm de espesor de 0.00 m, hasta 3 m, de altura con equipo mecánico (Martillo demoleedor) y herramienta manual, incluye: andamios, equipo de protección, herramienta y mano de obra.	21.6	\$1,812.15	\$ 39,142.44	23.945%	\$ 1,790.03	\$ 38,664.65	-1%	23.844%	\$ 1,790.03	\$ 38,664.65	-1%	23.773%	\$ 1,802.33	\$ 38,990.33	-1%	23.811%
DEM-PIOS Demolicion de piso firme existente de 10 cm de esp. por medios manuales; incluye: acarreo de material producto de demolicion hasta una estacion de 50 m indicado por la residencia de obra, carga manual y retro fuera de la obra, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza del area de trabajo	5.4	\$774.68	\$ 4,183.27	2.559%	\$ 752.13	\$ 4,061.50	-3%	2.505%	\$ 752.13	\$ 4,061.50	-3%	2.497%	\$ 763.13	\$ 4,120.90	-1%	2.521%
020114B Acarreo en camion volteo de 7 m3 del km 2 al 20 sobre pavimento según tarifas de la s.c.t.	589.5	\$5.36	\$ 3,159.72	1.933%	\$ 6.74	\$ 3,973.23	26%	2.450%	\$ 6.74	\$ 3,973.23	26%	2.443%	\$ 6.74	\$ 3,973.23	26%	2.430%
050204A Carga a mano y acarreo en camion volteo hasta 2.00 km. de materiales: petreos, arena, grava, material producto de la excavación sobre pavimento	65.5	\$201.97	\$ 13,229.04	8.093%	\$ 201.59	\$ 13,204.15	0%	8.143%	\$ 201.59	\$ 13,204.15	0%	8.119%	\$ 204.30	\$ 13,381.65	1%	8.185%
CAR-MAN Carga manual y acarreo en carretilla hasta una estacion de 20 m, del material producto de la demolicion	65.5	\$182.70	\$ 11,966.65	7.321%	\$ 177.33	\$ 11,615.12	-3%	7.163%	\$ 177.33	\$ 11,615.12	-3%	7.142%	\$ 180.05	\$ 11,793.28	-1%	7.213%

SUB-TOTAL: \$ 163,468.71  
 IVA: \$ 26,154.99  
 TOTAL: \$ 189,623.70

\$ 162,153.96  
 \$ 25,944.54  
 \$ 188,098.50

\$ 163,468.00  
 \$ 26,159.20  
 \$ 189,627.20

ING. JOSÉ SABIDO DE LA CRUZ ISIDRO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOTSIM.





"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitacion	MJM-ADJ-ISR-001-22		
Descripcion de la Obra	I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN 'ISR', I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN 'ISR', I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYAPA 'ISR'		
Localidad	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecocacán		
Plazo Ejecucion	30 días	Capital Autorizado sin IVA	\$333,870.04
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES		

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA \$333,870.04

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo \$333,203.91

B).- Monto Mínimo \$330,447.00

Diferencia \$2,756.91

De donde:

1 X \$333,203.91 ÷ 10 = \$33,320.39



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
POBLADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

De donde: \$2,756.91 Menor que < \$33,320.39

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Situación de la Propuesta
GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$330,447.00	Se considera solvente
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	\$333,203.91	Se considera solvente
RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	\$331,900.95	Se considera solvente

**II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento**

EVENTO	FECHAS
Fecha de Invitación	19-agosto-2022
Visita de Obra	26-agosto-2022
Junta de Aclaraciones	26-agosto-2022
Apertura de Propuestas	05-septiembre-2022

**III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas**

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación..

**IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos**

Empresa	Monto Ofertado
GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$330,447.00
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	\$333,203.91
RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	\$331,900.95

- 01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.
- 02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.
- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

**Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:**



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
MILICIONADO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica-económica de los licitantes, se determina que la empresa: GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., Representada Legalmente por: FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ, Se considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económico; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

**V.- Lugar y fecha de elaboración.**

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha: 5 de septiembre del 2022

Firma

Elaboró

**C. José Isabelino de la Cruz Isidro**

Jefe del Departamento de Licitaciones



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo  
Año de  
MEMORIAS DE LA MICHOCHECA

**"Acta de Fallo para la Adjudicación de Contrato de la Obra Pública"**

*Adjudicación directa*

*Licitación No: MJM-ADJ-ISR-001-22*

Descripción Obra	I0132.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA R/A. CHACALAPA 1RA. SECCIÓN *ISR*, I0133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*, I0134.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA POB. AYA
Localidad	0003.- Pob. Ayapa, 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección, 0022.- R/a. El Campo Petrolero Mecocacán
Origen de Recursos	ISR PARTICIPACIONES

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y, 34, 35 y 36 de su Reglamento.

En la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las: 10:00:00 a. m. del día 6 de septiembre del año 2022, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 10:00:00 a. m. del día 5 de septiembre del año 2022 para conocer el fallo que emite el Ayuntamiento, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, de esta ciudad las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Acto seguido se dio lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente:

Propuestas desechadas en la evaluación cualitativa:

No se desecharon propuestas ya que todas cumplen con lo estipulado en las bases de licitación.

Propuestas Acentadas:

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$330,447.00	30 días
2	RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.	\$331,900.95	30 días
3	REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	\$333,203.91	30 días

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el **C. José Isabelino de la Cruz Isidro** con cargo de Jefe de Licitaciones, y en presencia de los servidores públicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de:

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Monto Ofertado con Letra	Plazo de Ejecución
GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	\$330,447.00	TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE	30

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Año de Magón PRESIDENTE DE LA MUNICIPALIDAD MEXICANA

Firmas

C. José Isabelino de la Cruz Isidro  
Jefe del Departamento de Licitaciones

Empresa/Representante

GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA,

Firmas

C. FRANCISCA PÉREZ SÁNCHEZ

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

C. REMEDIO LÓPEZ CORONEL

RUNKAR SOLUCIONES, S. A. DE C. V.

C. DISNEY HERNÁNDEZ IZQUIERDO



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022** Ricardo Flores Magón Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN**

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K002.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN, PARA LO CUAL SE LLEVARA ACABO LAS SIGUIENTES ACCIONES.

\* DEMOOICIÓN DE LOSAS, MUROS Y COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ACARREO EN CARRETILLA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN HASTA ZONA DE ACOPIO PARA SU POSTERIOR ACARREO EN CAMIÓN DE VOLTEO DE 7 M3 HASTA UNA DISTANCIA DE 2 KM

022.- R/A. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 1 de abril de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



*Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 03 de Enero de 2022*

Folio No.: DPADS/ /2022  
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0133DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN, a ejecutarse en: 022.- R/A. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0133	DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN	022.- R/A. EL CAMPO PETROLERO MECOACÁN	36.85M3	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 79,680.50

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



# ALBUM FOTOGRAFICO

**GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA. DE CV.**

RFC: GBC1911062X5, CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4, FRACC. LA VENTA,



CP. 68288, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO, EMAIL: grupo@betepsa.com

C.B. CVC. SA DE CV. TELF.: 9932190757 / 9931504663

OBRA: I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN \*ISR\*

ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL, TRABAJOS EJECUTADOS



CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ORIGEN DEL RECURSO ISR

LOCALIDAD 0022.- R/a. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN. FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CLAVE CONCEPTO

DEMO-LOS DEMOLICIÓN DE LOSA SUPERIOR DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2, HASTA UNA ALTURA DE 12.50 M, DE SECCIÓN 3.40 M X 3.40 M X 15 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MECÁNICA (MARTILLO DEMOLEDOR) Y MANUAL, INCLUYE: CARGA A MANO EN BOTES DE 19 LITROS, DESCENSO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A ZONA DE ACOPIO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

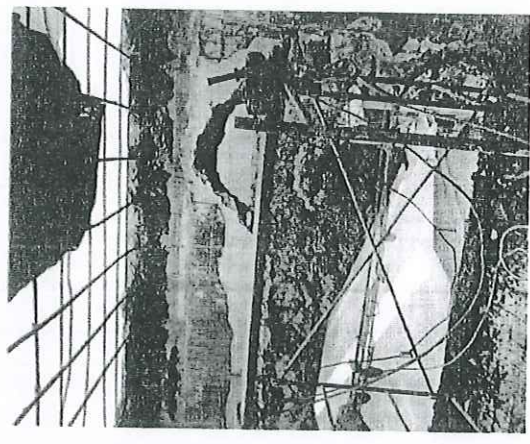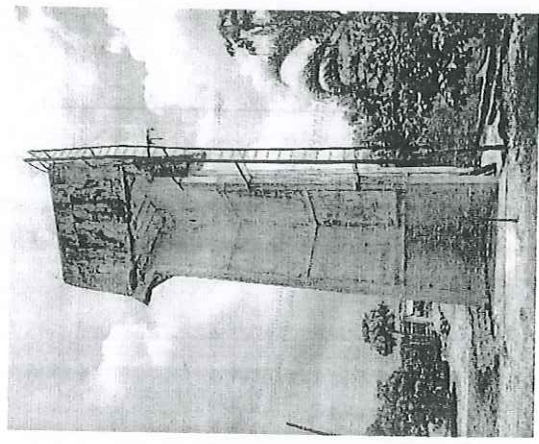

ELABORO

REVISO

ING. ABDI FORRAS GOMEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS BENITO JIMENEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA



# ALBUM FOTOGRAFICO

GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA SA. DE CV.

RFC: GBC19T1062X5, CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4,  
FRACC. LA VENTA,



CP. 86286, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO. EMAIL:  
grupobetepsa@cvc@hotmail.com

G.B. CVC, SA DE CV.

TELF.: 9932496757 / 9931501663

CLAVE

CONCEPTO

DEMO-TANQ

DEMOLICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2. HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M HASTA 12.50 M DE ALTURA, DE SECCION 3.40 M X 2.50 M X 15 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MECANICA (MARTILLO DEMOLEDOR) Y MANUAL, INCLUYE. CARGA A MANO EN BOTES DE 19 LITROS, DESDENSEO DEL MATERIAL. PRODUCTO DE LA DEMOLICION A ZONA DE ACOPIO. ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA



OBRA: 10133 - DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN "ISR"

ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL, TRABAJOS EJECUTADOS

CONTRATO C'TO-CP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ORIGEN DEL RECURSO ISR

LOCALIDAD 0022.- R/a. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN. FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

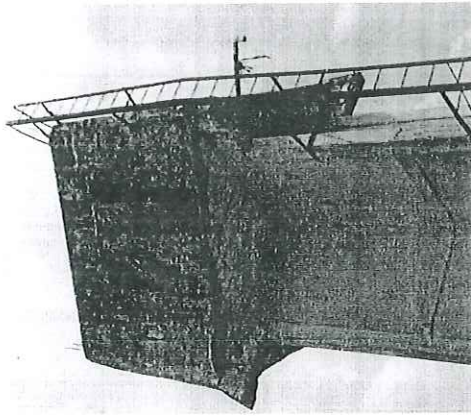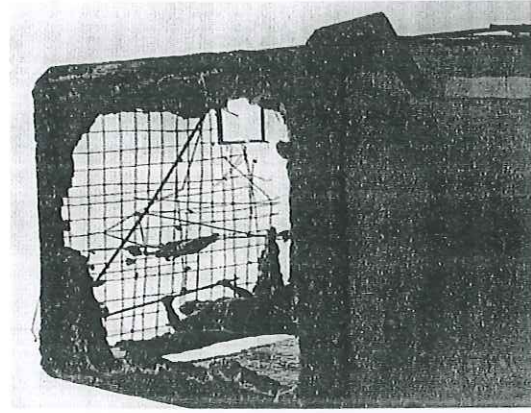

ELABORO

ING. ABDI VORRAS GOMEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO

ING. CARLOS RAEMEDIO JIMENEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

# ALBUM FOTOGRAFICO


OBRA:	I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN "ISR".		
ESTIMACION	1 (UNO) PARCIAL, TRABAJOS EJECUTADOS		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022		
PERIODO	DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ORIGEN DEL RECURSO	ISR
LOCALIDAD	0022.- R/a. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN.	FECHA	03 DE OCTUBRE DE 2022

**GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA SA. DE CV.**  
 RFC: GBC1911062X5, CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4, FRACC. LA VENTA,  
 CP. 86288, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO. EMAIL: [grupobetepsacyc@hotmilit.com](mailto:grupobetepsacyc@hotmilit.com)  
 TELF.: 9932196757 / 9931504663  
**G.B. CYC. SA DE CV.**



CLAVE	CONCEPTO
-------	----------

DEMO-FOND DEMOLICIÓN DE LOSA DE FONDO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MAL ESTADO DE CONCRETO ARMADO F'c= 250 KG/CM2, HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M, DE SECCIÓN 3.40 M X 3.40 M X 15 CM DE ESPESOR CON HERRAMIENTA MECÁNICA (MARTILLO DEMOLEDOR) Y MANUAL, INCLUYE: CARGA A MANO EN BOTES DE 19 LITROS, DESCENSO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A ZONA DE ACOPIO, ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

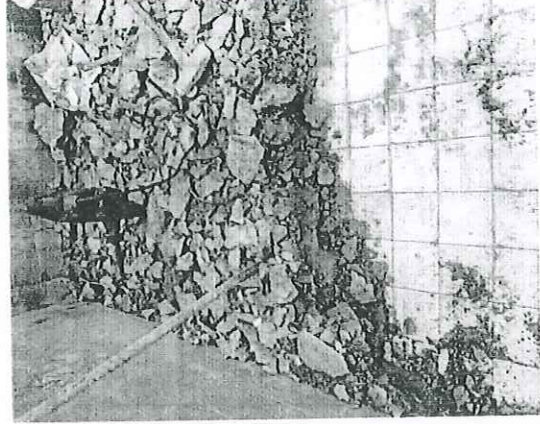

ELABORO

ING. ABDONORRAS GOMEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO  
  
 ING. CARLOS NEMEDIO JIMENEZ JIMENEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

# ALBUM FOTOGRAFICO

**GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA SA. DE CV.**

RFC: GBC1911002X5. CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4,  
FRACC. LA VENTA,



CP. 86288, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO. EMAIL:  
grupobetepsa@grupobetepsa.com

G.B. CYC. SA DE CV.

TELF.: 9932196757 / 9931504663

OBRA: 10133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO  
PETROLERO MECOACAN "ISR"



ESTIMACION 1 (UNO) PARCIAL, TRABAJOS EJECUTADOS

CONTRATO CTO-CP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022

PERIODO DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ORIGIN DEL RECURSO ISR

LOCALIDAD 0022.- R/3. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN. FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022

CLAVE CAR-MAN CONCEPTO CARGA MANUAL Y ACARREO EN CARRETERILLA HASTA UNA ESTACION DE 20 M. DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN

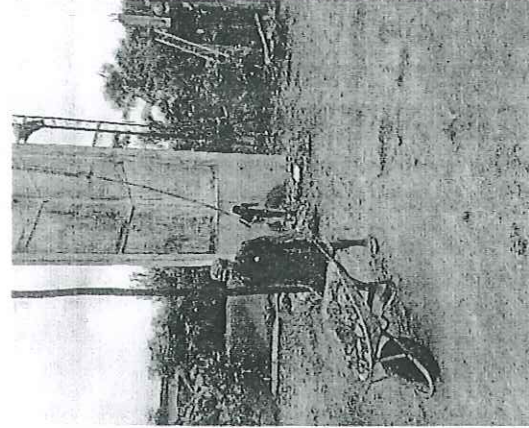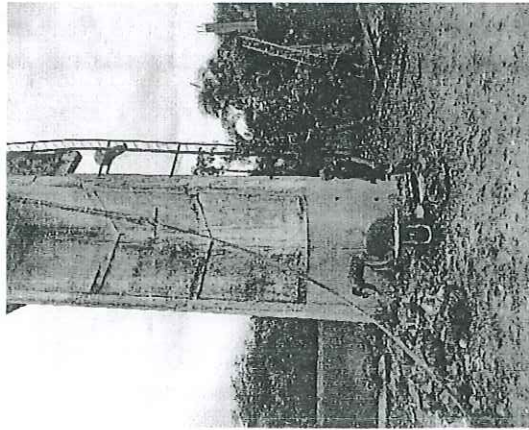

ELABORO

ING. ABDIPORRAS GOMEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO

ING. CATHY ROSARIO SANCHEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA SA. DE CV.**

RFC: GBC1911062X5, CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4,  
FRACC. LA VENTA,



CP. 86288, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO. EMAIL:  
grupobetepsacyc@hotmail.com

G.B. CYC. SA DE CV.




TELF.: 9932196757 / 9931504663

**ALBUM FOTOGRAFICO**

OBRA:	I0133 - DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN "ISR"		
ESTIMACION	1 (UNO) PARCIAL, TRABAJOS EJECUTADOS		
CONTRATO	CTO-CP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022		
PERIODO	DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ORIGEN DEL RECURSO	ISR
LOCALIDAD	0022 - R/a. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN.	FECHA	03 DE OCTUBRE DE 2022

050204A

CARGA A MANO Y ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO HASTA 2.00 KM. DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN SOBRE PAVIMENTO

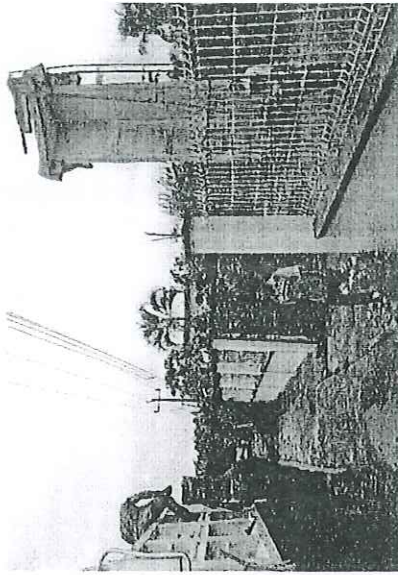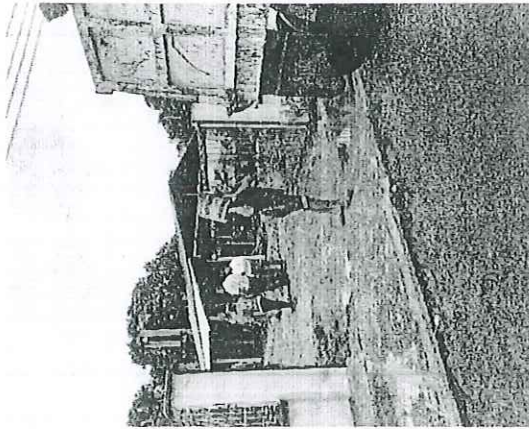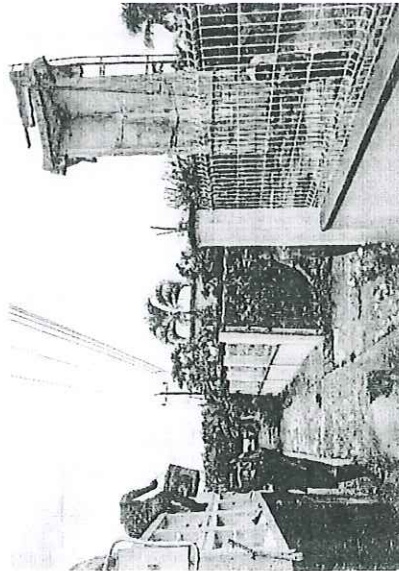

ELABORO

ING. ABDIPORRAS GOMEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA SA. DE CV.**

RFC: GBC1911062X5, CALLE: PRIVADA ZOTZ 10, MANZANA 13 LOTE 4,  
FRACC. LA VENTA,



CP. 86288, VILLAHERMOSA CENTRO, TABASCO. EMAIL:  
grupobetepsa@cvc@hotmail.com


G.B. CVC, SA DE CV.

TELF.: 9932796757 / 9937504663

**ALBUM FOTOGRAFICO**

OBRA:	I0133.- DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN *ISR*		
ESTIMACION	1 (UNO) PARCIAL, TRABAJOS EJECUTADOS		
CONTRATO	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022		
PERIODO	DEL 11 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	ORIGEN DEL RECURSO	ISR
LOCALIDAD	0022.- R/a. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN.	FECHA	103 DE OCTUBRE DE 2022.

**TABLERO INFORMATIVO**

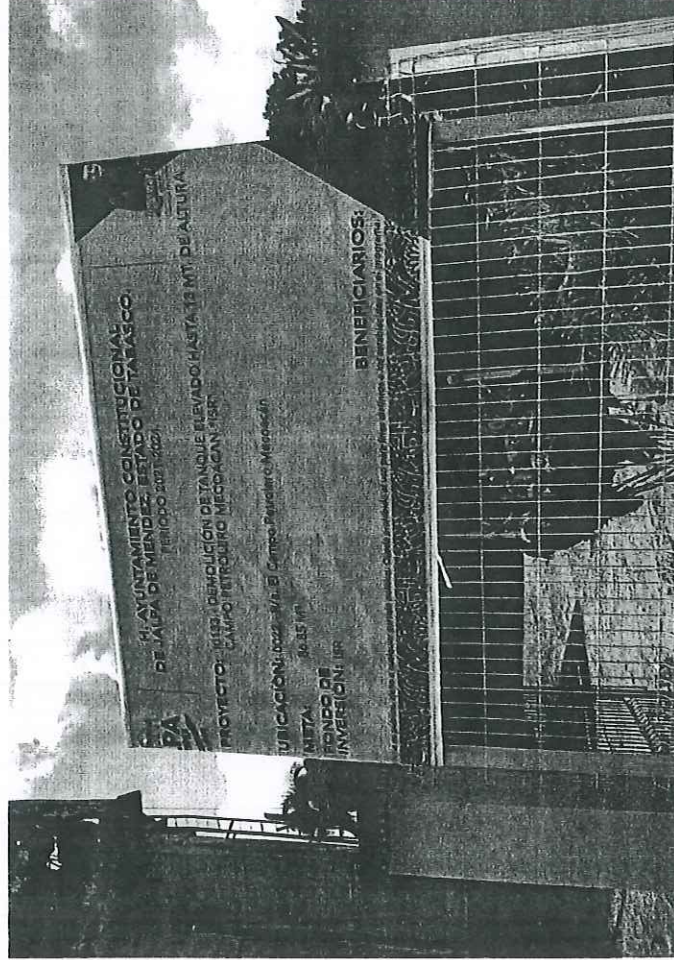

ELABORO  
  
ING. ABDURRRAS GOMEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO  
  
ING. CARLOS JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022.

BITACORA DE OBRA.

CON ESTA FECHA Y EN CUMPLIMIENTO AL INCISO I DEL ARTICULO 95 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE ABRENTA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS DE.- 10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MT. DE ALTURA CAMPO PETROLERO MECOACAN. ISR CON NUMERO DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

LOCALIDAD: 00220- Rta. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN.

10133.- DEMOLICIÓN DE TANQUE ELEVADO HASTA 13M DE ALTURA, CAMPO PETROLERO MECOACAN.

PROYECTO N°

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022.

OFICIO DE CABILDO: ACTA DE CABILDO ORDINARIA N° 031.- DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2022.

ORIGEN DE LOS RECURSOS: ISR.

PROGRAMA PRESUPUESTAL.

FECHA DE INICIO: 11 SEPTIEMBRE DE 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE OCTUBRE DE 2022.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

MONTO CONTRATADO: \$78,703.58

IMPORTE DEL ANTICIPO: \$23,611.074

METAS: 36.85 M3

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-002-2022.

## DATOS DEL CONTRATISTA.

CONTRATISTA: GRUPO BETEPSA CONSTRUCCIONES Y  
COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: PRIVADA ZOTZ MANZANA 13 LOTE 4 ENTRE  
CALLES KAKULKU E ITZAM, COL. LA  
VENTA CENTRO.

REG. FEDERAL DE CAUSANTE: GBC1911062XS

REG. I.M.S.S.: E757021101.

REG. INFONAVIT

REG. PADRÓN DE CONTRATISTA.

REG. DE LA CEMIC

NOMBRE DE LA FIANZADORA.

No DE POLIZA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO.

No DE TELEFONO:

## DATOS DEL SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION.

NOMBRE: ABDI PORRAS GOMEZ.


PROFESION: INGENIERO CIVIL EN ESTRUCTURAS.

DIRECCION: CALLE ATA COA DE JULIAN SANCHEZ 4 COL. JOSE  
MARIA PINO SUAREZ 86029.

CEDULA: 1527251

NUM DE CELULAR: 99 32 07 35 30

CORREO:

FIRMA: 

## DATOS DEL RESIDENTE DE LA DOOTSM.

NOMBRE: CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ

PROFESION: INGENIERO CIVIL.

DIRECCION: CALLE USUMACINTA S/N, Rta. PUEBLO  
VIEJO JALPA DE MENDEZ

CEDULA: 12558273

NUM DE CELULAR: 914 279 3954

CORREO: CARLOS-R-J@LIVE.COM.MX

FIRMA: 

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOSTSM-ISR-002-2022

OBRA: IO133 - DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO HASTA 13 MTS. DE ALTURA. CAMPO PETROLERO MECOACAN

LOCALIDAD: 0022. - P/D. EL CAMPO PETROLERO MECOACAN.

NOTA No. 1.

EL DIA DE HOY SE INICIAN LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ARRIBA MENCIONADO, DONDO INICIO CON LA DEMOLICION DE LA LOSA SUPERIOR DEL TANQUE, UTILIZANDO EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO: 1 MARTILLO DEMOLEDOR.  
1 LOTE DE HERRAMIENTAS.

ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JNER.  
RESIDENTE DE OBRA.

NOTA No. 2.

13/SEPT/22.

SE REALIZA LA DEMOLICION DEL TANQUE DE ALMOZENDAMIENTO DE AGUA UTILIZANDO MARTILLO DEMOLEDOR Y HERRAMIENTA, SE OBSERVA QUE EL MURO CUENTA CON UN ESPESOR DE 25 CM. GENERANDO CANTIDADES ADICIONALES POR 5.17 M<sup>3</sup>. POR LO QUE SE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRA SU AUTORIZACION PARA SU EJECUCION.

EQUIPO: 1 MARTILLO DEMOLEDOR.  
1 LOTE DE HERRAMIENTAS.

ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA.



CONTROL: CTO-OP-MJSL-DOOTSM-ISR-002-2022


NOTA N. 3.

SE OBSERVA AL PERSONAL QUE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE MUROS, CORDENAS Y CASTILLOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO.

EN ATENCIÓN A LO SOLICITADO PARA EJECUTAR CANTIDAD ADICIONAL POR 5.17 M<sup>3</sup>. DEL CONCEPTO DEMO-TANQ. "DEMOLICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ABUS. POTABLE EN MAL ESTADO." MANIFIESTA QUE SE SUBORIZA SU EJECUCION.



ING. DBDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JEREZ.  
RESIDENTE DE OBRAS.

NOTA. No. 4.

16/SEPT/22.


EL PERSONAL SE OCUPA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

- DEMOLICION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE ABUS. CON HERROMIENTO Y MORTILLO DEMOLEDOR, EN COLUMNAS Y CASTILLOS, CORDENAS DE CONCRETO ARMADO.

EQUIPO: 1 LOTE DE HERROMIENTO.  
1 MORTILLO DEMOLEDOR.



ING. DBDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JEREZ.  
RESIDENTE DE OBRAS.


CONTROLADO: CIO-OP-MJAL-DOOTSM-ISR-003-2022

NOTA No. 5

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICION DE MUROS, CASTILLOS, Y CADENAS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE OBUO, ASI TAMBIEN REALIZA LA CARGA Y DESCARGO DEL MATERIAL PRODUCIDO DE LA DEMOLICION EN CARRETILLO FUERA DEL AREA DE TRABAJO. PARA SU POSTERIOR RETIRO.

EQUIPO: 1 MARTILLO DEMOLEDOR  
1 LOTE DE HERRAMIENTAS.

  
ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

  
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ. JUEZ.  
RESIDENTE DE OBRA.


NOTA No 6.

21 / SEP / 22.

SE DA INICIO A LA DEMOLICION DE LA LOSA DE FONDO, OBSERVANDO QUE CUENTA CON 15 CM. DE ESPESOR. LO QUE GENERA UNA CANTIDAD ADICIONAL POR. 0.35 M<sup>3</sup>. LO CUAL SE SOLICITA SU EJECUCION, AUTORIZACION PARA EJECUTARLA.

EQUIPO: 1 MARTILLO DEMOLEDOR.  
1 LOTE DE HERRAMIENTAS.

  
ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

  
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ. JUEZ.  
RESIDENTE DE OBRA.


CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOCKM-ISR-002-2022.

NOTA No. 7


EN RESPONSA A LA NOTA No. 6 ESTA RESIDENCIA DE OBRA AUTORIZA LA EJECUCION DEL CONCEPTO No. DEMO-FONDO: "DEMOLICION DE LOSA DE FONDO DE TANQUE DE AMPLIAMIENTO DE AGUA" POR LA CANTIDAD ADICIONAL DE 0.35 m3



ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ. INCE.  
RESIDENTE DE OBRAS.





CONTRATO : CTO-OP-MJSL - DOSTSM - ISR - 002 - 2022

NOTA No. 8. -

EN VISITA A LA OBRA EL CONTRATISTA EJECUTA LA DEMOLICION DE LOSA DE FONDO A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 15 CM. DE ESPESOR. CON MARTILLO DEMOLIDOR Y HERRAMIENTAS MANUALES.

EQUIPO: 1 MARTILLO DEMOLIDOR.  
1 LOTE DE HERRAMIENTAS.

  
ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.


  
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JNEZ.  
RESIDENTE DE OBRA.


NOTA No. 9

30/ SEPT/ 22.

SE OBSERVA AL PERSONAL REALIZANDO LA CARGA Y DESCARGO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES EN CARPETILLOS, FUERA DEL AREA DE TRABAJO. PARA SER CARGADO Y RETIRADO EN CAMION DE VOLTEO.

EQUIPO: 1 LOTE DE HERRAMIENTAS  
1 CAMION VOLTEO DE 7 m<sup>3</sup>

  
ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

  
ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JNEZ.  
RESIDENTE DE OBRA.


CONTRATO: CTO-OP- MJDL- DOOTSM- ISR- 002- 2022.

NOTA No. 10

SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE TROPES DE CONCRETO ARMADOS., CON HERRAMIENTAS Y MORTILLO DEMOLEDOR...



ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRAS.


NOTA No. 11

04/OCT/22

CON ESTA FECHA SE HACE ENTREGA DE LA ESTIMACION No 1 (UNO) PARCIAL DE TRABAJOS EJECUTADOS. ENTREGANDO TODA LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU REVISION Y EN SU CASO AUTORIZACION.



ING. ABDI PORRAS GOMEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.



ING. CARLOS REMEDIO JIMENEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRAS.
