



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61301.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0045
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: RAMO 33 FONDO III
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DE LICITACION	: MJM-INV-R33-006-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023
FECHA	: 20 DE JUNIO DE 2023
OBRA	: I0045.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA.
LOCALIDAD	: 0030.- R/A. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA).
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 2,780.00 ML.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 40 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 23 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 01 DE AGOSTO DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 3'312,120.23 *(TRES MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO VEINTE PESOS 23/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 3'230,973.29 *(TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 969,291.99 *(NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/238/2023.
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2023.

CONTRATISTA	: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
DOMICILIO	: CALLE GREGORIO MENDEZ SIN NUMERO VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA, TABASCO. C.P.: 86761
REG. FED. DE CAUSANTES	: SACE780111J19
REG. I. M. S. S.	: H3711625108
REG. INFONAVIT	: H3711625108
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-02038



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, "EL AYUNTAMIENTO"; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, REPRESENTADA POR EL C. MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

## DECLARACIONES:

### I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- I.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA

2/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

POTABLE., PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.

I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 FONDO III; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

## II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL C. MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ. ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. SACE780111J19 EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. SNCREL78011127M200. MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: CALLE GREGORIO MENDEZ SIN NUMERO VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA, TABASCO. C.P.: 86761. CORREO: mary\_santos\_01@hotmail.com MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

3/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

### III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

### CLÁUSULAS:

#### PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: 10045.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA. UBICADO EN: 0030.- R/A. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA). Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

#### SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 3'230,973.29 \*\* (TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 29/100 M.N.) \*\* INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

#### TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 40 DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2023 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 01 DE AGOSTO DE 2023.

#### CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO MJM-INV-R33-006-23; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y

4/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023.

## QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

## SEXTO.- ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 30.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 969,291.99 \*\* (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.)\*\*, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO

5/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

## SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES; CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

## OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

## NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

## DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015,

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

#### DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: HSBC MEXICO, S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 021790040679096147

TIPO DE CUENTA: CHEQUES

SUCURSAL: 350 NOMBRE DE LA SUCURSAL: MENDEZ, VILLAHERMOSA, TAB.

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

#### DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

#### DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

8/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

9/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

## DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

## DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

## DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

10/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

## DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

## DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A "EL AYUNTAMIENTO". TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE "EL CONTRATISTA" PARA RECLAMAR EL PAGO.

"EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

## DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL "EL AYUNTAMIENTO" COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR "EL CONTRATISTA", "EL AYUNTAMIENTO" RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$

11/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

"EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

## DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO". NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

## VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

## VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

## VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

13/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

- I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL AYUNTAMIENTO”.
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VIII. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR “EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI “EL AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISIÓN, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENNA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS

14/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.

## VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL “CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL AYUNTAMIENTO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFATORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

## VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE “EL AYUNTAMIENTO” DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL AYUNTAMIENTO”.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

## VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

## VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

## VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.



# CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 20 DE JUNIO DE 2023.

## FIRMAS

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. MTRÓ. RAFAEL/RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”  
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

C. MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ  
PERSONA FISICA

## TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023, DE LA OBRA: I0045.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA. LOCALIDAD: 0030.- R/A. REFORMA 2DA. SECCIÓN (SANTA MARÍA), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.

17/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/298/2023.  
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ  
CALLE GREGORIO MENDEZ SIN NUMERO VILLA VICENTE  
GUERRERO C.P.: 86761 CENTLA, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ  
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	3 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	5 de junio de 2023	11:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	40 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	23 de junio de 2023
Especialidad requerida	240 Líneas y redes de agua potable		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	martes, 6 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Página 1 de

Recibido  
del  
29/05/23



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4


**No podrán subcontratarse partes de la obra.**

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

  
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO**

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/299/2023.  
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

**PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.**

CERRADA HICOTEA EDIF. 6 No. INT. 2 COL. MULTI 80 C.P.:  
36035 COL. TABASCO 2000 VILLAHERMOSA, CENTRO,  
TABASCO.

**PRESENTE:**

AT'N. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ  
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	3 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obra Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	5 de junio de 2023	11:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	40 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	23 de junio de 2023
Especialidad requerida	240 Líneas y redes de agua potable		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	martes, 6 de junio de 2023		

Recibido  
29-Mayo-2023

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

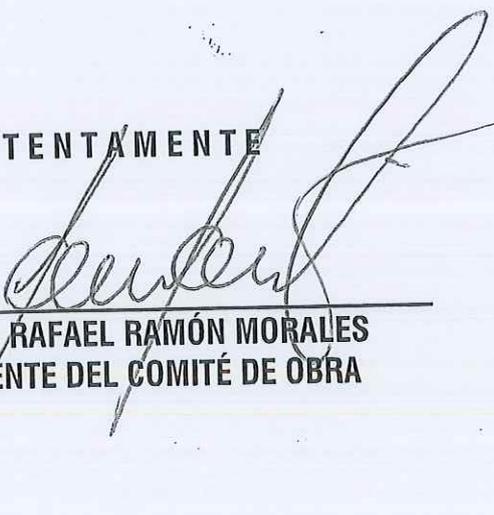
**No podrán subcontratarse partes de la obra.**

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

  
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Página 2 de

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA**  
EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/300/2023.  
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

**MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO**  
AV. VALLE DEL GOLFO MZA 21 LOTE 2 No. INT. DEPTO 2-7  
COL. POMOCA C.P. 86247 NACAJUCA, TABASCO

**PRESENTE:**

**AT'N. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	3 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	5 de junio de 2023	11:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	40 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	23 de junio de 2023
Especialidad requerida	240 Líneas y redes de agua potable		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	martes, 6 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

RECIBI 29/05/2023  
MARIA G. PEREZ CASTRO  
Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4


**No podrán subcontratarse partes de la obra.**

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

  
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CASTRO  
RFC: pecg841127if8 Código Postal: 86245  
MARÍA GUADALUPE PEREZ CASTRO

EMAIL: lic.lupitaperezcastro@gmail.com TELEFONO: 993 370 5634

ASUNTO: ACEPTACION A INVITACION

NACAJUCA, TABASCO A 30 DE MAYO DE 2023


MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.  
JALPA DE MENDEZ, TAB.  
PRESENTE.



POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE Y EN REPRESENTACION COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO, PARA MANIFESTARLE MI ACEPTACION A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE LICITACION No. MJM-INV-R33-006-23, DE LA OBRA: I0045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCION ( SANTA MARIA), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR, ME ES GRATO SALUDARLO.

ATENTAMENTE

  
LIC. MARIA GUADALUPE PEREZ CASTRO  
ADMINISTRADOR UNICO  
TEL CEL: 9933705634  
CORREO: lic.lupitaperezcastro@gmail.com



MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ


RFC: SACE-780111J19 CURP: SACE780111-MTCNRLO6 IMSS:H371162510  
CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y MATERIALES  
DE OBRA CIVIL

Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo: mary\_santos\_01@hotmail.com

VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA TABASCO. 30 DE MAYO DE 2023

ASUNTO: CARTA DE ACEPTACION


MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA  
JALPA DE MENDEZ, TABASCO  
PRESENTE.



POR ESTE MEDIO ME PERMITO COMUNICARLE MI ACEPTACION A PARTICIPAR EN LA LICITACION No. MJM-INV-R33-006-23 DE LA OBRA: I0045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA, UBICADA EN LA RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA), MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.


AGRADECIENDO SU AMABLE INVITACION, ME DESPIDO DE USTED CON EL GUSTO DE SALUDO.

ATENTAMENTE:

  
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ.

ADMINISTRADOR UNICO

Calle Gregorio Méndez S/N. Villa Vicente Guerrero C.P. 86761 Centla Tabasco.



# ROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE C.V.

CONSTRUCCIONES.PROYECTOS.PROTECCION AMBIENTAL

VILLAHERMOSA, TABASCO A 30 DE MAYO DEL 2023

Aceptación de Invitación

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA.  
DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.  
PRESENTE:

MAYO 31 2023  
Oficial 14:10  
DIRECCIÓN DE OBRAS DEL MANEJO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

En atención a su oficio de fecha 29 DE MAYO DE 2023 donde nos hace la invitación a participar en el procedimiento de licitación número MJM-INV-R33-006-23, referente a las obras: I0045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA. Ubicación: 0029.- RA. REFORMA 2DA. SECCION, (SANTA MARIA). Por medio de la presente manifestamos que aceptamos participar en dicha licitación, por lo que presentaremos puntualmente nuestra propuesta el día por ustedes señalado.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE


PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.  
C. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ  
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/302/2023. ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO 2000. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO. PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras Ordenamiento Territorial y Servicio Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.e.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/303/2023.  
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIÁS MORA  
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (TABASCO)  
AV. PASEO TABADCONo. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.  
86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo) dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo,

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
Oficialía de Partes

RECIBIDO  
08 JUN 2023

HORA: 10:16  
ANEXO: 27  
NOMBRE: Dng

C.c.p.- Archivo.


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/308/2023. ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Table with 4 columns: Descripción de la obra, Localidad, No. De Licitación, and a table with columns EVENTO, FECHA, HORA, LUGAR. It details the construction of a water pipe network in Santa María.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Handwritten signature of Rafael Ramón Morales

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

AVANZA CONIGO  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024

RECIBIDO  
06 JUN. 2023  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

OFICIO No. COPM/DLyPU/265/2023  
ASUNTO: INVITACIÓN

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ  
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**PRESENTE:**

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0042.- Rehabilitación de Revestimiento de Camiño en Tramo Familia de la O.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-012-23		
<b>EVENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>LUGAR</b>
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	09:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/306/2023.  
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

**C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ**  
SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**PRESENTE:**

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
<b>EVENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>HORA</b>	<b>LUGAR</b>
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. INTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/304/2023. ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción-III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/305/2023.  
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS  
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,  
TABASCO.

**PRESENTE:**

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	13:50 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## "Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

*Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

Jalpa de Méndez Tabasco a **sábado, 3 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 09:00 hrs. a.m. del día **sábado, 3 de junio de 2023** los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

así mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales sirvan para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ C. MARIA EL VIA DE LOS SANTOS CRUZ	
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V. C. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ	
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ	

Página 1 d

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*  
No. De Licitación: MJM-INV-R33-006-23  
Descripción de la obra: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

Localidad: 0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA  
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	<u>Maria Elvia De Los Santos Cruz</u>	
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	<u>Miguel Ángel Felix Muñoz</u>	
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	<u>Maria Guadalupe Pérez Castro</u>	



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## "Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 5 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	<b>I0045.- Construcción de Red de Agua Entubada.</b>
Localidad:	<b>0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).</b>
No. De Licitación:	<b>MJM-INV-R33-006-23</b>
Origen de los Recursos	<b>RAMO 33 FONDO III</b>

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 11:00 hrs. del día **lunes, 5 de junio de 2023** hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

- 1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
- 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

### OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE **Francisco VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO






- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

No habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las **11:39 hrs. del día Lunes 05 de Junio de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
<b>MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ</b> C. MARIA EL VIA DE LOS SANTOS CRUZ	
<b>PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.</b> C. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ	
<b>MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO</b> C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	
<b>SUPERVISOR DE OBRA</b> C. ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ	
<b>Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez</b> <b>C. ING ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN.</b> jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

### **Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.**

#### **Licitación No. MJM-INV-R33-006-23**

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.

02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.




04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca a conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirecto financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

  
**Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.**



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## "Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

*Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

Jalpa de Méndez Tabasco a **miércoles, 14 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

Presupuesto Base con I.V.A.	\$	3,312,120.23
--------------------------------	----	--------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 14:08 hrs. del día Miercoles, 14 de Junio de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguiente empresas:

- 1.- MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
- 2.- MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO
- 3.- PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

**EMPRESAS ACEPTADAS**

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$2,785,321.80	40 Días Naturales
2.-	MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	\$2,843,569.40	40 Días Naturales
3.-	PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$2,811,304.96	40 Días Naturales

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas e cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Sabado, 17 de Junio de 2023. a las 12:00 hrs en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

**C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón**  
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Página 2 d

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. MARIA EL VIA DE LOS SANTOS CRUZ  
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

3. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO  
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO

C. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ  
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.

Por los Invitados

Firma

C. Adelfo Morales Palma  
Representante de la secretaría de la función Pública del Estado



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*  
No. De Licitación: MJM-INV-R33-006-23  
Descripción de la obra: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

Localidad: 0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES  
POR LOS LICITANTES**

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	<u>Maria Elvia de Los Santos Cruz</u>	
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	<u>Miguel Angel Felix Mañón</u>	
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	<u>Maria Guadalupe Pérez Castro</u>	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ			PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.			MARI GUADALUPE PÉREZ CASTRO		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
LET-OBRA	PREMIANABES Construcción de hierro alusivo a la obra; medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de pr de 2" galvanizado cal. 15, lamina negra, cal. 22 incluye: viti auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de profundidad; excavación hasta un metro de profundidad y 2" chazos de concreto f'c= 150 kg/cm², de 30 x 30 x 100 cm para empujar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1.0000	\$ 7,771.41	\$ 7,771.41	0.272%	0%	\$ 7,736.30	0.276%	\$ 7,998.23	3%	\$ 8,109.61	4%	0.285%
TRAZ-01	Trazo y nivelación en el área de trabajo; incluye: trazo y nivelación instalando bancos de nivel con equipo topográfico, estacado necesario, equipo, materiales y mano de obra.	m²	2,780.0000	\$ 7.53	\$ 20,833.40	0.793%	61%	\$ 33,693.80	1.210%	\$ 12.08	\$ 33,562.40	60%	\$ 10.56	1.195%
CCC-023	Corte de pavimento de concreto asfáltico con corador de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad.	m	5,600.0000	\$ 25.03	\$ 140,168.00	4.900%	77%	\$ 248,418.00	8.919%	\$ 43.01	\$ 240,856.00	72%	\$ 34.95	8.587%
1000 04	Ruptura y demolición de pavimento asfáltico, incluye: la remoción del material producto de la demolición, herramienta, mano de obra, carga, descarga y acarreo fuera de la obra.	M³	133.4400	\$ 355.09	\$ 47,375.20	1.659%	-38%	\$ 29,507.50	1.059%	\$ 206.82	\$ 27,571.37	-42%	\$ 197.45	0.981%
CCC-136	Saqueo para localización de instalaciones existentes: leña, postes, telégrafos, etc.; incluye: equipo, herramientas y mano de obra.	sondeo.	5.0000	\$ 937.89	\$ 4,689.45	0.164%	3%	\$ 4,831.10	0.173%	\$ 901.41	\$ 4,507.05	-4%	\$ 717.97	0.160%
1010 02	Excavación a mano para zanjas en material común, en seco hasta 2.00 m de profundidad.	M³	111.2000	\$ 148.81	\$ 16,547.87	0.590%	28%	\$ 20,767.71	0.748%	\$ 176.76	\$ 19,655.71	19%	\$ 116.83	0.699%
1100 02	Excavación con equipo para zanjas, en cualquier material, excepto roca en agua en Zona "B" de 0.00 a 6.00 mts de profundidad.	M³	1,000.8000	\$ 66.12	\$ 66,172.80	2.318%	22%	\$ 80,414.28	2.897%	\$ 74.03	\$ 74,089.22	12%	\$ 68.42	2.835%
P-1120 01	Planilla asonada con pizón de mano en zanjas con material producto de la excavación.	m³	111.2000	\$ 85.25	\$ 9,479.80	0.332%	37%	\$ 12,960.36	0.466%	\$ 110.47	\$ 12,264.26	30%	\$ 73.00	0.457%
1014	Relleno en zanjas compactado en capas de 20 cm. con material producto de banco.	M³	840.1200	\$ 409.42	\$ 343,861.93	12.047%	39%	\$ 458,366.27	16.457%	\$ 541.82	\$ 455,193.82	32%	\$ 543.25	16.192%
					\$ 458,366.27			\$ 458,366.27		\$ 541.82	\$ 455,193.82		\$ 543.25	16.050%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE V.				MARI GUADALUPE PÉREZ CASTRO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
GRAB-SLAB-1/2	Construcción de base hidráulica empleando material pedregoso triturado, material pedregoso triturado, grava de 38 mm (1 1/2") a fino; compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su p.v.m. con equipo mecánico (ballarina) sin control de laboratorio incluye: suministro y acarreo de los materiales, abarcamiento, tendido, nivelado, compactado, agua necesaria, alfiler, losas, herramienta y mano de obra.	m <sup>2</sup>	166.8000	\$ 1,417.77	\$ 236,484.04	8.282%	5%	249,247.57	8.949%	1,509.21	\$ 251,736.23	0%	8.954%	\$ 1,633.46	\$ 272,464.46	15%	9.582%	
CAM-CARP-FRIO	Reposición de mezcla asfáltica de 10 a 15 cms. De espesor en tramos aislados y dispersos (arena de río-emulsión escarificable) compactado al noventa y cinco por ciento (95%) por medios manuales, incluye: arena, emulsión para la fabricación de la mezcla, riego de liga con Emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65, riego de impregnación sobre base hidráulica con emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65.	m <sup>2</sup>	89.0000	\$ 3,282.10	\$ 292,106.90	10.250%	18%	344,598.43	12.372%	3,988.05	\$ 354,896.45	22%	12.625%	\$ 4,332.22	\$ 385,567.58	32%	13.659%	
CCC-448	Barrido de la superficie por tratar por medios manuales (cepillo de cerdas de raíz) para recibir riego de impregnación.	m <sup>2</sup>	1,112.0000	\$ 1.86	\$ 2,066.32	0.072%	26%	2,602.08	0.093%	2.20	\$ 2,446.40	19%	0.087%	\$ 1.45	\$ 1,612.40	-22%	0.057%	
CCC-227A	Emulsión asfáltica empleada de forma manual (renivelación), emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65).	L	1,112.0000	\$ 18.59	\$ 20,672.08	0.724%	-9%	19,903.92	0.675%	17.28	\$ 19,215.38	-7%	0.684%	\$ 18.12	\$ 20,149.44	-9%	0.709%	
CCC-157A	Suministro y aplicación de sello premezclado, incluye: emulsión asfáltica de rompimiento rápido modificada con polímero tipo I alta viscosidad para riego de liga, sello 3-A, premezclado con asfalto PG 64-22, tendido con equipo mecánico (retroexcavadora) y compactado con equipo de compactación PR-8.	m <sup>2</sup>	1,112.0000	\$ 56.45	\$ 62,772.40	2.198%	11%	69,360.56	2.490%	63.57	\$ 70,689.84	13%	2.514%	\$ 65.20	\$ 72,602.48	16%	2.553%	
1140 03	Bombas de achique con bomba autocebante propiedad del contratista de 4" Ø y 12 H.P., incluye: equipo y accesorios necesarios para su funcionamiento.	HR	50.0000	\$ 151.86	\$ 7,594.00	0.266%	10%	8,373.50	0.301%	157.81	\$ 7,880.50	4%	0.281%	\$ 122.91	\$ 6,146.50	-19%	0.216%	
ATAQUE-3	Construcción de atraque de concreto simple (C= 150 kg/cm <sup>2</sup> con agregado max. 3/4" para tuberías de 2' a 3' con dimensiones de 20 x 20 x 35 cm incluye: cobado, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa.	8.0000	\$ 143.65	\$ 1,149.20	0.040%	3%	1,181.44	0.042%	150.40	\$ 1,203.20	5%	0.045%	\$ 146.35	\$ 1,186.80	3%	0.042%	
C-MAT	Carga mecánica a camión volteo, de material producido de cortes, excavaciones y demoliciones.	m <sup>3</sup>	679.6400	\$ 46.74	\$ 31,766.37	1.113%	-24%	24,276.74	0.872%	32.92	\$ 22,373.75	-30%	0.796%	\$ 30.43	\$ 20,681.45	-35%	0.727%	

**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**  
 2021-2024  
**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: **MJM-INV-R33-006-23**  
 OBRA: **10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.**  
 UBICACIÓN: **0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).**

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ			PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE CV.			MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE
ACA-1-P	Acarreo de material producto de cortes, excavaciones y demoliciones al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m <sup>3</sup> /km.	679.6400	\$ 19.41	\$ 13,191.81	0.462%	-19%	\$ 10,853.85	0.390%	\$ 16.04	\$ 10,801.43	-17%	\$ 12,308.28	0.433%
CAJA 2	CAJA DE CONTROL DE AGUA POTABLE Construcción de caja para operación de válvulas tipo II de 1.00 x 0.90 x 1.07 m, para diámetros de 2" a 3", construida con planilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm <sup>2</sup> de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto f'c= 200 kg/cm <sup>2</sup> de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de tabicación sólido de 28 cm de espesor, abanado interior pulido con concreto ca-1.3 de 1 cm. de espesor, dala perimetral superior de concreto f'c= 250 kg/cm <sup>2</sup> de 15 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 10 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo libre, mano de obra, cimbrado, desmoldado, habilitado y armado de acero, elaboración en obra de concreto hidráulico, suministro e instalación de contramuro sencillo (4"), marco con tapa de fierro fundido de 50 x 50 cm, con peso de 134 kg, colado, desperdicios, limpieza de sobrantes, equipo y herramienta. No incluye: atracas para tubería.	pa.	3.0000	\$ 18,982.67	\$ 56,948.01	1.994%	17%	\$ 66,448.14	2.386%	\$ 22,747.00	\$ 68,241.00	20%	\$ 68,856.42	2.421%
CAJA 3	Construcción de caja para operación de válvulas tipo III de 1.40 x 1.00 x 1.07 m, para diámetros de 4" a 6", construida con planilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm <sup>2</sup> de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto f'c= 200 kg/cm <sup>2</sup> de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm de espesor.	pa.	6.0000	\$ 26,131.43	\$ 156,788.58	5.481%	-3%	\$ 152,477.82	5.474%	\$ 25,978.72	\$ 155,672.32	-1%	\$ 154,558.91	5.485%
P-8055 A AG-00A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRAULICA para agua potable, de EXTREMIDAD CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 101 mm (4") de Ø.	Pza.	2.0000	\$ 368.19	\$ 736.38	0.029%	108%	\$ 1,534.16	0.055%	\$ 796.82	\$ 1,593.24	116%	\$ 859.53	0.080%
3000 88 4	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRAULICA para agua potable, de EXTREMIDAD CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 101 mm (4") de Ø.	Pza.	4.0000	\$ 445.38	\$ 1,781.52	0.062%	89%	\$ 3,374.66	0.121%	\$ 873.82	\$ 3,465.28	98%	\$ 832.46	0.131%
P-8055 A AG-00A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRAULICA para agua potable, de EXTREMIDAD CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 152 mm (6") de Ø.	Pza.	2.0000	\$ 891.97	\$ 1,783.94	0.062%	108%	\$ 3,668.54	0.132%	\$ 1,892.27	\$ 3,784.54	112%	\$ 2,063.26	0.145%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				PROCONTRUC DEL SUPESTE, S.A. DE C.V.				MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
P-8055 A A7 004	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EXTREMIDAD ESPIGA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 76 mm (3") de Ø	Pza.	2.0000	\$ 336.59	\$ 673.09	0.024%	\$ 632.09	\$ 1,264.18	88%	0.045%	\$ 654.90	\$ 1,308.80	94%	\$ 699.98	\$ 1,399.92	108%	0.048%	
P-8055 A A4 12A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EXTREMIDAD ESPIGA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 101 mm (4") de Ø	Pza.	4.0000	\$ 415.46	\$ 1,661.92	0.068%	\$ 779.18	\$ 3,116.72	88%	0.112%	\$ 808.02	\$ 3,224.08	94%	\$ 856.12	\$ 3,424.48	108%	0.120%	
P-8055 A A7 006	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EXTREMIDAD ESPIGA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 152 mm (6") de Ø	Pza.	2.0000	\$ 915.27	\$ 1,830.54	0.057%	\$ 1,723.84	\$ 3,447.28	111%	0.124%	\$ 1,778.10	\$ 3,552.20	116%	\$ 1,932.47	\$ 3,864.94	137%	0.136%	
8020 00 03A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE: 76mm (3") de Ø	Pza.	4.0000	\$ 98.25	\$ 393.00	0.014%	\$ 55.85	\$ 222.60	-43%	0.008%	\$ 56.82	\$ 227.28	-42%	\$ 57.13	\$ 228.52	-42%	0.008%	
8020 00 04A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE: 101mm (4") de Ø	Pza.	4.0000	\$ 137.92	\$ 551.68	0.019%	\$ 87.36	\$ 346.44	-37%	0.013%	\$ 89.30	\$ 357.20	-35%	\$ 90.28	\$ 361.12	-35%	0.013%	
8020 00 05A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE: 152mm (6") de Ø	Pza.	6.0000	\$ 183.78	\$ 1,102.68	0.039%	\$ 108.89	\$ 641.34	-42%	0.023%	\$ 105.52	\$ 633.12	-43%	\$ 105.36	\$ 632.16	-43%	0.022%	
8013 00 05A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE: 152mm (6") de Ø	Pza.	4.0000	\$ 242.28	\$ 969.12	0.034%	\$ 192.22	\$ 768.88	-21%	0.028%	\$ 197.94	\$ 791.76	-18%	\$ 208.44	\$ 825.76	-15%	0.028%	
8013 00 05B	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE: 203mm (8") de Ø	Pza.	4.0000	\$ 417.78	\$ 1,671.12	0.059%	\$ 358.70	\$ 1,434.80	-14%	0.052%	\$ 370.20	\$ 1,480.80	-11%	\$ 389.42	\$ 1,557.68	-7%	0.055%	
8035 00 03A	Suministro e instalación de Válvulas de seccionamiento: COMPUERTA CON VASTAGO PLO, incluye: revisión, presentación, colocación, y mano de obra, de: 76 mm (3") de Ø.	Pza.	2.0000	\$ 5,972.20	\$ 13,944.40	0.488%	\$ 4,519.32	\$ 9,038.64	-35%	0.325%	\$ 4,667.90	\$ 9,335.38	-33%	\$ 4,926.57	\$ 9,853.14	-29%	0.347%	
2160 00 05A	Suministro e instalación de Válvulas de seccionamiento: COMPUERTA CON VASTAGO PLO, incluye: revisión, presentación, colocación, y mano de obra, de: 101 mm (4") de Ø.	Pza.	4.0000	\$ 9,002.80	\$ 36,011.20	1.281%	\$ 5,699.40	\$ 22,797.60	-37%	0.819%	\$ 5,887.44	\$ 23,549.76	-35%	\$ 6,217.70	\$ 24,870.80	-31%	0.875%	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: I0045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ			PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE V.			MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL
2160 00 06A	Suministro e instalación de Válvulas de seccionamiento: COMPUERTA CON VÁSTAGO; FIO, incluye: revisión, presentación, colocación y mano de obra; de: 152 mm (6") de Ø.	Pa.	3.0000	\$ 13,653.71	\$ 40,961.13	1.435%	-36%	\$ 20,303.04	0.844%	\$ 9,076.54	27,229.62	-34%	\$ 0,671.33	\$ 20,013.00	-29%	1.020%
2160 00 07	Suministro e instalación de Válvulas de seccionamiento: COMPUERTA CON VÁSTAGO; FIO, incluye: revisión, presentación, colocación y mano de obra; de: 200 mm (8") de Ø.	Pa.	1.0000	\$ 23,969.01	\$ 23,969.01	0.839%	-39%	\$ 14,600.93	0.524%	\$ 15,136.38	15,136.38	-37%	\$ 16,220.27	\$ 16,220.27	-32%	0.570%
P-8055 A A1 12A	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRAULICA para agua potable, de... TEE C/CAMPANA (sistema inglés) DE: 150 x 150 mm (6" x 6") de Ø	Pa.	2.0000	\$ 899.93	\$ 1,799.86	0.083%	40%	\$ 2,524.62	0.091%	\$ 1,306.20	2,618.40	46%	\$ 1,405.55	\$ 2,811.10	56%	0.098%
P-8055 A A1 12B	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRAULICA para agua potable, de... TEE C/CAMPANA (sistema inglés) DE: 100 x 100 mm (4" x 4") de Ø	Pa.	1.0000	\$ 684.13	\$ 684.13	0.024%	35%	\$ 921.20	0.033%	\$ 955.14	955.14	40%	\$ 1,024.00	\$ 1,024.00	50%	0.039%
P8015 A A2 09A	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. para agua potable, de... TEE DE Fo Fo CON BRIDAS SOLDADAS (6" x 6") de Ø.	Pa.	1.0000	\$ 7,854.87	\$ 7,854.87	0.275%	21%	\$ 9,515.11	0.342%	\$ 9,925.99	9,925.99	26%	\$ 10,901.40	\$ 10,901.40	39%	0.389%
P8015 A A2 09B	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. para agua potable, de... TEE DE Fo Fo CON BRIDAS SOLDADAS (8" x 3") de Ø.	Pa.	2.0000	\$ 12,600.93	\$ 25,201.86	0.683%	-52%	\$ 12,002.12	0.431%	\$ 6,236.22	12,472.44	-51%	\$ 6,747.42	\$ 13,494.84	-46%	0.475%
P8015 A A2 09C	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. para agua potable, de... ADAPTADOR BRIDADO DE Fo Fo (6") de Ø.	Pa.	4.0000	\$ 2,019.17	\$ 8,076.68	0.288%	13%	\$ 9,116.96	0.327%	\$ 2,360.85	9,443.40	17%	\$ 2,521.09	\$ 10,084.38	25%	0.355%
P8015 A A2 09D	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. para agua potable, de... ADAPTADOR BRIDADO DE Fo Fo (8") de Ø.	Pa.	4.0000	\$ 2,561.27	\$ 10,245.08	0.959%	6%	\$ 10,896.08	0.361%	\$ 2,812.20	11,249.19	10%	\$ 2,960.86	\$ 11,843.44	16%	0.416%
8018 00 01A	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. DE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA, DE: 5/8" x 3/4" Ø.	Pa.	56.0000	\$ 56.98	\$ 3,190.88	0.112%	-34%	\$ 2,119.60	0.076%	\$ 38.67	2,165.52	-32%	\$ 38.96	\$ 2,181.76	-32%	0.077%
8018 00 01B	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. DE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA, DE: 3/4" x 4" Ø.	Pa.	40.0000	\$ 84.54	\$ 3,381.60	0.116%	-13%	\$ 2,928.00	0.105%	\$ 74.92	2,996.80	-11%	\$ 76.14	\$ 3,045.90	-10%	0.107%
8018 00 01C	Suministro e instalación de piezas especiales de Fo. Fo. DE: TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL C/TUERCA, DE: 3/4" x 1/4" Ø.	Pa.	48.0000	\$ 117.31	\$ 5,630.88	0.177%	-27%	\$ 4,102.56	0.147%	\$ 87.31	4,190.88	-26%	\$ 88.06	\$ 4,228.88	-25%	0.149%
	TOMAS DOMICILIARIAS															



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021. Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: I0045 - Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ			PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE CV.			MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	
PE101-03A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE 4" Ø. INCLUYE: ABRAZADERA (HIDROTOMA) DE PVC DE 4" CON SALIDA DE 1/2", CONECTOR DE COBRE DE 1/2" Ø, 2 ABRAZADERAS SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" Y 5 MTS POLIDUCTO NEGRO CED. 80 DE 1/2" DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	toma	30.0000	\$ 370.85	\$ 11,125.50	0.3600%	6%	\$ 11,763.70	0.4233%	\$ 396.33	7%	\$ 11,869.90	0.4233%	\$ 377.75	2%	\$ 11,332.50	0.3899%
PE101-03B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA EN TUBERÍA DE 6" Ø. INCLUYE: ABRAZADERA (HIDROTOMA) DE PVC DE 6" CON SALIDA DE 1", MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	toma	5.0000	\$ 280.80	\$ 1,404.00	0.048%	1%	\$ 1,424.70	0.051%	\$ 288.47	3%	\$ 1,442.95	0.051%	\$ 270.10	-1%	\$ 1,385.50	0.049%
PE101-03C	REPARACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA. INCLUYE: ABRAZADERA, CONECTOR DE COBRE DE 1/2" Ø, 2 ABRAZADERA SIN FIN DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" Y 2 MTS POLIDUCTO NEGRO CED. 80 DE 1/2" DE Ø, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	Pa.	60.0000	\$ 326.94	\$ 19,616.40	0.687%	-3%	\$ 18,972.60	0.881%	\$ 318.23	-3%	\$ 19,093.80	0.679%	\$ 299.56	-8%	\$ 17,973.60	0.832%
CCC-270C	LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. RD-26, según precios de lista... De 150 mm. (6") de Ø. Incl. Materiales puestos en obra, lijado, grasa vegetal, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	2,780.0000	\$ 359.33	\$ 998,937.40	34.986%	-34%	\$ 662,916.80	23.800%	\$ 248.09	-32%	\$ 684,130.20	24.335%	\$ 256.82	-28%	\$ 719,516.60	25.303%
CCC-270	Suministro e instalación de tubería hidráulica de P.V.C. RD-26, según precios de lista... De 101 mm. (4") de Ø. Incl. Materiales puestos en obra, lijado, grasa vegetal, maniobras, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	24.0000	\$ 165.67	\$ 3,976.08	0.130%	6%	\$ 4,197.36	0.151%	\$ 180.41	6%	\$ 4,329.84	0.154%	\$ 186.46	14%	\$ 4,547.04	0.160%
CCC-270AA	REPARACIÓN DE TUBERÍA RD-26 PVC HIDRÁULICO SERIE INGLESA DE 4" DE Ø. CON UNA LONGITUD DE 4.00 MTS. INCLUYE: 2.0 PZA COPLE DE REPARACIÓN DE PVC CON UGAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. PIEZAS ESPECIALES.	Pza.	4.0000	\$ 1,472.63	\$ 5,890.52	0.206%	-7%	\$ 5,475.24	0.197%	\$ 1,396.61	-5%	\$ 5,504.44	0.109%	\$ 1,410.23	-4%	\$ 5,640.92	0.186%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024  
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE V.				MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %		
P-8055 A A1 12C	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... CODOS DE 22" C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 150 mm (6") de Ø.	Pza.	10.0000	\$ 615.23	\$ 6,152.30	0.215%	49%	\$ 917.08	\$ 9,170.80	0.329%	54%	\$ 946.77	\$ 9,467.70	0.337%	82%	\$ 9,974.70	0.351%	
P-8055 A A1 12D	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... CODOS DE 45" C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 150 mm (6") de Ø.	Pza.	5.0000	\$ 684.13	\$ 3,420.65	0.120%	217%	\$ 2,169.51	\$ 10,847.55	0.389%	231%	\$ 2,281.71	\$ 11,308.55	0.402%	265%	\$ 12,390.15	0.438%	
P-8055 A A1 12E	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... CODOS DE 90" C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 150 mm (6") de Ø.	Pza.	4.0000	\$ 915.53	\$ 3,662.12	0.128%	53%	\$ 1,399.45	\$ 5,597.80	0.201%	59%	\$ 1,463.23	\$ 5,812.92	0.207%	71%	\$ 6,270.82	0.221%	
P-8055 A A1 12F	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... REDUCCIÓN CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés) DE: 150 x 100 mm (6" x 4") de Ø	Pza.	1.0000	\$ 546.33	\$ 546.33	0.019%	138%	\$ 1,297.65	\$ 1,297.65	0.047%	146%	\$ 1,346.37	\$ 1,346.37	0.048%	166%	\$ 1,447.39	0.051%	
P-8055 A A1 12G	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... TAPÓN CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 101 mm (4") de Ø.	Pza.	4.0000	\$ 334.43	\$ 1,337.72	0.047%	4%	\$ 346.32	\$ 1,385.28	0.050%	5%	\$ 351.57	\$ 1,408.28	0.050%	3%	\$ 1,377.76	0.048%	
P-8055 A A1 12H	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... TAPÓN CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE: 150 mm (6") de Ø.	Pza.	5.0000	\$ 591.83	\$ 2,959.15	0.104%	58%	\$ 836.87	\$ 4,879.35	0.108%	63%	\$ 966.52	\$ 4,832.60	0.172%	72%	\$ 5,089.65	0.179%	
P-8055 A A1 12I	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... COPLE DE REPARACIÓN (sistema inglés), DE: 101 mm (4") de Ø.	Pza.	4.0000	\$ 298.63	\$ 1,194.52	0.042%	12%	\$ 334.79	\$ 1,339.16	0.048%	14%	\$ 338.47	\$ 1,357.88	0.048%	11%	\$ 1,323.32	0.047%	
P-8055 A A1 12J	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... COPLE DE REPARACIÓN (sistema inglés), DE: 76 mm (3") de Ø.	Pza.	3.0000	\$ 394.86	\$ 1,184.58	0.020%	30%	\$ 254.08	\$ 782.24	0.027%	35%	\$ 257.12	\$ 771.36	0.027%	27%	\$ 745.17	0.028%	
P-8055 A A1 12K	Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de... COPLE DE REPARACIÓN (sistema inglés), DE: 152 mm (6") de Ø.	Pza.	10.0000	\$ 554.13	\$ 5,541.30	0.184%	22%	\$ 675.88	\$ 6,758.80	0.243%	25%	\$ 693.54	\$ 6,935.40	0.247%	29%	\$ 7,123.70	0.251%	
P-8055 A A1 12LK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NIPLE DE 60" A 80 CMs. DE PLOMB. CON ROSCA EXTERIOR DE: 1" DE Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRAY HERRAMIENTA.	PZA	5.0000	\$ 818.55	\$ 4,092.75	0.149%	-46%	\$ 444.64	\$ 2,223.20	0.080%	-45%	\$ 450.77	\$ 2,253.85	0.080%	-46%	\$ 2,195.15	0.077%	

**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**  
 2021-2024  
**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
 "2021. Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.  
 UBICACIÓN: 0029.- Rta. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.				MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
2160 00 07B	VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE CAÍDE COMBINADA DE 25 MM (1") DE Ø. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN Y PRUEBAS.		5.0000	\$ 3,478.71	\$ 17,393.55	0.609%	-49%	\$ 8,814.40	0.316%	\$ 1,812.33	\$ 9,061.05	-48%	0.322%	\$ 1,876.07	\$ 9,380.35	-46%	0.330%	
81-PASAJE DE AGUA DE 8" a base de fabricación de PP/HDPE de 8" a base de tubería de acero al carbono. ced. 40 de 150 mm. (6") de Ø y 5.16 mm. de espesor y codos hechos de 45" y 2 BIDAS SOLDABLES DE FOF. DE 150 mm (50") de Ø.	Pza.	1.0000	\$ 20,584.86	\$ 20,584.86	0.721%	15%	\$ 23,291.10	0.839%	\$ 24,184.78	\$ 24,184.78	17%	0.860%	\$ 25,285.84	\$ 25,285.84	23%	0.889%		
P-8055 A A6 EXTREMIDAD CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE 152 mm (6") de Ø	Pza.	1.0000	\$ 851.57	\$ 851.57	0.031%	108%	\$ 1,834.27	0.066%	\$ 1,892.27	\$ 1,892.27	112%	0.067%	\$ 2,083.26	\$ 2,083.26	131%	0.073%		
P-8055 A A7 Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EXTREMIDAD CAMPANA C/CAMPANA (sistema inglés), DE 152 mm (6") de Ø	Pza.	1.0000	\$ 815.27	\$ 815.27	0.029%	111%	\$ 1,723.64	0.062%	\$ 1,776.10	\$ 1,776.10	118%	0.063%	\$ 1,932.47	\$ 1,932.47	137%	0.068%		
8020 00 05A Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE NEOPRENO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE 152mm (6") de Ø	Pza.	2.0000	\$ 183.78	\$ 367.56	0.013%	-42%	\$ 213.78	0.008%	\$ 105.52	\$ 211.04	-43%	0.008%	\$ 105.36	\$ 210.72	-43%	0.007%		
8018 00 01D Suministro e instalación de tornillos de cabeza hexagonal fuerza de 5/8" x 2 1/2" Ø. Incl: material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	16.0000	\$ 47.40	\$ 758.40	0.027%	-31%	\$ 525.92	0.019%	\$ 33.45	\$ 535.20	-29%	0.019%	\$ 35.09	\$ 529.44	-30%	0.019%		
2160 00 07A VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE COMBINADA DE 51 MM (2") DE Ø. CON BRIDA DE FOF. INCLUYE: SUMINISTRO DE EMPAQUE DE PLOMO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS.	Pza.	1.0000	\$ 4,724.50	\$ 4,724.50	0.165%	-18%	\$ 3,873.38	0.139%	\$ 4,018.47	\$ 4,018.47	-15%	0.149%	\$ 4,318.91	\$ 4,318.91	-9%	0.152%		
8035 00 01A Suministro e instalación de Válvulas de seccionamiento: COMPLETA CON TABAGOS FIJO, incluye: revisión, presentación, colocación y mano de obra; de: 51 mm (2") de Ø.	Pza.	1.0000	\$ 4,951.10	\$ 4,951.10	0.174%	-32%	\$ 3,388.07	0.122%	\$ 3,492.85	\$ 3,492.85	-30%	0.124%	\$ 3,658.59	\$ 3,658.59	-26%	0.128%		
8013 00 05C Suministro e instalación de piezas especiales de PVC HIDRÁULICA para agua potable, de EMPAQUE DE PLOMO PARA PIEZAS ESPECIALES, DE 51mm (2") de Ø	Pza.	2.0000	\$ 99.52	\$ 199.04	0.007%	-14%	\$ 171.28	0.006%	\$ 87.77	\$ 175.54	-12%	0.008%	\$ 89.71	\$ 179.42	-10%	0.006%		
8006-C1-02A Suministro e instalación de tubería de ACERO al carbono. ced. 40 de 51 mm. (2") de Ø y 5.16 mm. de espesor.	ml.	1.0000	\$ 915.64	\$ 915.64	0.032%	-27%	\$ 671.23	0.024%	\$ 687.31	\$ 687.31	-25%	0.024%	\$ 643.06	\$ 643.06	-30%	0.023%		

**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO**  
 2021-2024  
**CÓMITE DE OBRA PÚBLICA**  
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-006-23

OBRA: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.

UBICACIÓN: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ			PROCONTRUC DEL SURESTE S.A. DE V.			MARI GUADALUPE PEREZ CASTRO						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	P.U.	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	IMPORTE	P.U.	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL			
8018 00 01E	Suministro e instalación de piezas especiales de Po.fo. DE TORNILLOS DE CIBEZA HEXAGONAL C/TUERCA, DE 3/8" x 3 1/2" Ø.	Pza.	8.0000	\$ 84.54	\$ 676.32	0.024%	-52%	\$ 41.00	\$ 328.00	0.012%	\$ 41.75	\$ 334.00	-51%	0.012%	\$ 41.55	\$ 332.40	-51%	0.012%

SUB-TOTAL: \$ 2,855,276.08  
 IVA: \$ 458,944.17  
 TOTAL: \$ 3,314,220.25

\$ 2,785,321.80  
 \$ 458,944.17  
 \$ 3,244,265.97

\$ 2,811,304.08  
 \$ 449,803.78  
 \$ 3,261,107.86

\$ 2,843,568.40  
 \$ 454,971.10  
 \$ 3,298,540.50

ELABORO

*[Handwritten Signature]*  
 ING. ANGEL MARIO HERNANDEZ BOLON  
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## "Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 17 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0045.- Construcción de Red de Agua Entubada.		
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	2,855,276.06

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

### I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA \$ 2,855,276.06

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo \$2,843,569.40

B).- Monto Mínimo \$2,785,321.80

Página 1 de

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL RECONQUISTADO DEL PUEBLO

Diferencia (A - B): \$ 58,247.60  
 De donde: 1 X \$ 2,843,569.40 ÷ 10 : \$ 284,356.94  
 De donde: \$ 58,247.60 Menor que < \$ 284,356.94

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$ 2,785,321.80	Se considera solvente
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	\$ 2,843,569.40	Se considera solvente
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 2,811,304.96	Se considera solvente

I.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	lunes, 29 de mayo de 2023
Vísita de Obra	sábado, 3 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	lunes, 5 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	miércoles, 14 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$ 2,785,321.80
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO	\$ 2,843,569.40
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	\$ 2,811,304.96

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.

- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplirlas obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

**Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:**

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, Representada Legalmente por: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.


**V.- Lugar y fecha de elaboración.**

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

sábado, 17 de junio de 2023

**Elaboro**  
**C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón**  
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

**Firma**



Página 3 de 3

**Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.**



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## "Acta de Fallo y Adjudicación"

*Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 17 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.
Localidad:	0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-006-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 12:00 hrs. del día Sabado, 17 de Junio de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 12:00 hrs. DEL Sabado, 17 de Junio de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-INV-R33-006-23 RELATIVO AL PROYECTO: 10045.- Construcción de Red de Agua Entubada. LOCALIDAD: 0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Página 1 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	40 Días Naturales	\$ 2,785,321.80 (Dos Millones Setecientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veintinueve Pesos 80/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:  
**MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ**

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Contrato No.:	<b>CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023</b>
Descripción de la obra:	<b>10045.- Construcción de Red de Agua Entubada.</b>
Localidad:	<b>0030.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).</b>

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ PARA EL Martes, 20 de Junio de 2023. A LAS 12:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

6. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Martes, 20 de Junio de 2023. A LAS 14:40 HRS. EN EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOTS.M. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 12:32 hrs. DEL DÍA Sabado, 17 de Junio de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

Firma

**C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Página 3 de 4



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**C. Mtro. Cristian David Coronel Santos**  
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

**C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón**  
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Licitantes / Representante

Firmas

**C. MARIA EL VIA DE LOS SANTOS CRUZ**  
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

**C. MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO**  
MARÍA GUADALUPE PÉREZ CASTRO

**C. MIGUEL ÁNGEL FELIX MUÑOZ**  
PROCONTRUC DEL SURESTE, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**I0045.- Construcción de Red de Agua Entubada.**

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K002.- Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable.

LA PRESENTE OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON EL TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, SONDEO DE LINEAS, EXCAVACION EN ZANJAS CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON EQUIPO MECANICO DONDE SE REQUIERA, PLANTILLA DE ARENA, TUBERIAS DE PVC DE 6" Y 4" DE DIAM, TOMAS DOMICILIARIAS REPOSICION DE PAVIMENTOS CON MEZCLA ASFALTICA E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE A LA RED PUBLICA.

0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de mayo de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03-may-23**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Construcción de Red de Agua Entubada., a ejecutarse en: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0045	Construcción de Red de Agua Entubada.	0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).	2780 ML.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 3,312,120.23

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



C.C.P. Archivo



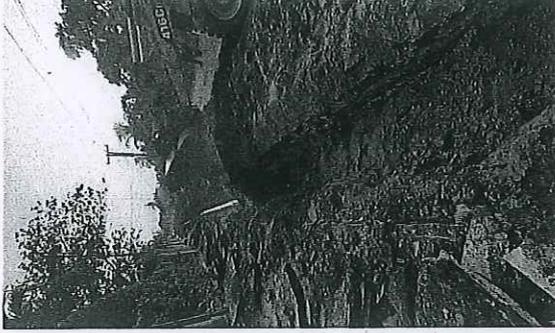
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ  
 RFC: SACH-780111J19 CURP: SACE780111-MITCNRL06  
 IMSS: H371162510  
 CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y  
 MATERIALES DE OBRA CIVIL  
 Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo:  
 mary\_santos\_01@hotmail.com

# ALBUM FOTOGRAFICO


**OBRA:** 10045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA  
**ESTIMACION:** 4 (CUATRO) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES  
**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS** RAMO 33 FONDO III  
**CONTRATO:** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023  
**LOCALIDAD:** 0030.- RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

<b>CLAVE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PERIODO:</b>	<b>FECHA:</b>	<b>07 DE AGOSTO DE 2023</b>
--------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------------------

1100 02 EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS, EN CUALQUIER MATERIAL, EXCEPTO ROCA, EN AGUA EN ZONA "B" DE 0.00 A 6.00 MTS DE PROFUNDIDAD.



ING. ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

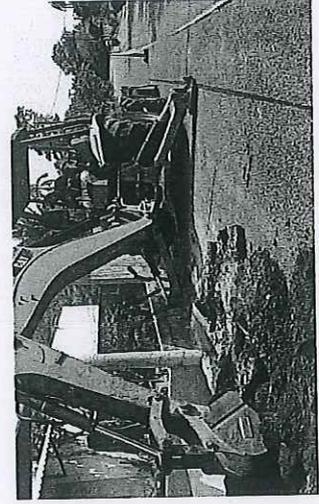


ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

# ALBUM FOTOGRAFICO

 <p>MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ                  RFC: SACE7801111J19 CURP: SACE780111-MTCNRL06                  IMSS: H371162510                  CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y                  MATERIALES DE OBRA CIVIL                  Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo:                  mary_santos_01@hotmail.com</p>		OBRA:	10045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA	
		ESTIMACION:	4 (CUATRO) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES	
		PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	RAMO 33 FONDO III	
		CONTRATO:	C.TO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023	
		LOCALIDAD:	10030.- RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)	
		PERIODO:	DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023	FECHA: 07 DE AGOSTO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO
1000 04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, INCLUYE: LA REMOCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CARGA, DESCARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA.



ING. ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ  
RESIDENTE DE OBRA

# ALBUM FOTOGRAFICO

**OBRA:** I0045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA

**ESTIMACION:** 4 (CUATRO) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES

**PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS**  
RAMO 33 FONDO III

**CONTRATO:** CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

**LOCALIDAD:** 0030.- RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)

**PERIODO:** DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023

**FECHA:** 07 DE AGOSTO DE 2023

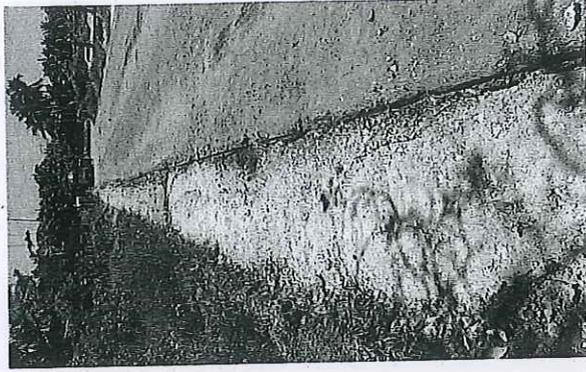


**MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ**  
 RFC: SACW-780111119 CURP: SACW780111-MTCNRL06  
 IMSS: H371162510  
 CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y  
 MATERIALES DE OBRA CIVIL  
 Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo:  
 mary\_santos\_01@hotmail.com

**CONCEPTO**

GRAV-SLAB-1  
1/2

CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA EMPLEANDO MATERIAL PÉTREO TRITURADO, MATERIAL PÉTREO TRITURADO, GRAVA DE 38 MM (1 1/2") A FINOS, COMPACTADO AL NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) DE SU P.V.S.M. CON EQUIPO MECÁNICO (BALARINA), SIN CONTROL DE LABORATORIO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, ABUNDAMIENTO, TENDIDO, NIVELADO, COMPACTADO, AGUA NECESARIA, AFINE, INSUMOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.



ING. SIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE RICARDO FERRAS HERNANDEZ  
RESIDENTE DE OBRA

# ALBUM FOTOGRAFICO



MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ  
 RPC: SACU-78011119 CURP: SACE780111-MTCNRL06  
 IMSS: H371162510  
 CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y  
 MATERIALES DE OBRA CIVIL  
 Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo:  
 maria\_santos\_01@hotmail.com

<b>OBRA:</b>	10045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA
<b>ESTIMACION:</b>	4 (CUATRO) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES
<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	RAMO 33 FONDO III
<b>CONTRATO:</b>	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023
<b>LOCALIDAD:</b>	0030.- RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
<b>PERIODO:</b>	DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023
<b>FECHA:</b>	07 DE AGOSTO DE 2023

## CONCEPTO

- C-A-MAT CARGA MECÁNICA A CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.
- ACA-1-P ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES AL PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINOS PAVIMENTADOS, TARIFA DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE TABASCO.



ING. ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

# ALBUM FOTOGRAFICO



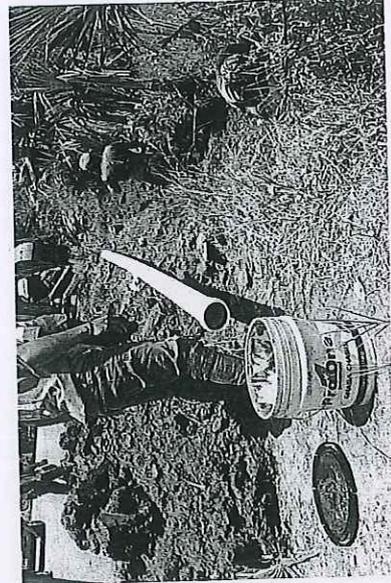
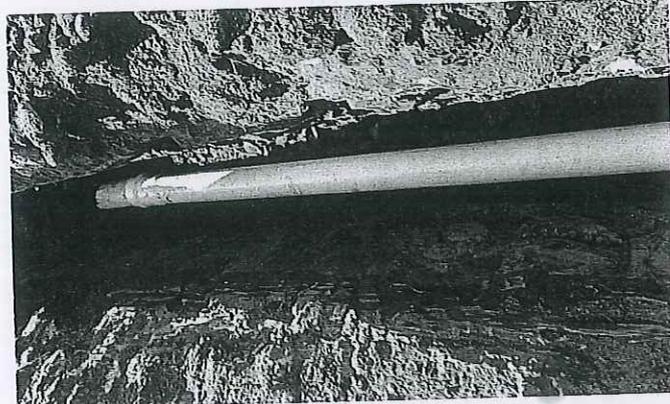
MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ  
 RUC: SAC07780111419 CURP: SAC0780111-NTCNRL06  
 INSS: H971162510  
 CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y  
 MATERIALES DE OBRA CIVIL  
 Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo:  
 maria\_santos\_01@hotmail.com

<b>OBRA:</b>	10045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA
<b>ESTIMACION:</b>	4 (CUATRO) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES
<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	RAMO 33 FONDO III
<b>CONTRATO:</b>	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023
<b>LOCALIDAD:</b>	0030.- RA. REFORMA 2DA. SECCION (SANTA MARIA)
<b>PERIODO:</b>	DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2023
<b>FECHA:</b>	07 DE AGOSTO DE 2023

**CLAVE**

**CONCEPTO**

CCC-270 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE P.V.C. RD-26, SEGUN PRECIOS DE LISTA... DE 101 MM. (4") DE Ø. INCL. MATERIALES PUESTOS EN OBRA, LUADO, GRASA VEGETAL, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.



ING. ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ  
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ  
 RESIDENTE DE OBRA

OBRA: T0045. - CONSTRUCCION DE RED DE OBRAS ENTUBADA

CONTROL: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-018-2023


NOTA: No. 2

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, DE IGUAL FORMA SE REALIZAN LOS SONDEOS PARA LOCALIZAR LINEAS DE TUBERIA EXISTENTES, UNA VEZ LOCALIZADA LA LINEA PRINCIPAL DE TUBERIA DE PVC. DE 4" Ø, SE PROCEDE A LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO ENCONTRANDO QUE EXISTEN VARIOS CAPOS DE CARPETA ASFALTICA, LO QUE GENERARA CANTIDADES ADICIONALES A LAS PROGRAMADAS EN PROYECTO. PROSIGUIENDO A LA EXCAVACION DE ZONJAS CON EQUIPO MECANICO, ASI COMO CON HERRAMIENTA MANUAL PARA OFINE, CONTINUANDO CON LA CONSTRUCCION DE PLANTILLO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES APISONADA CON OBRAS Y HTO MANUAL, POSTERIORMENTE SE INTRODUCEN TUBERIA DE PVC. RD-26 HTO. DE 6" Ø, REALIZANDO EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (ARENILLA) PARA EL RELLENO DE ZONJAS EN CAPAS DE 20 CM, ESP. CON BOLDRINO, ADICIONANDOLE OBRAS PARA SU COMPACTACION...

EQUIPO: 1 MAQUINA CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE.  
1 RETROEXCAVADORA.  
1 COMION VOLTEO DE 7 M<sup>3</sup>.  
1 MAQUINA BOLDRINO.



ING. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.



ING. JOSE RICARDO FRIAS HDEZ.  
RESIDENTE DE OBRAS.

OBRA: TCO45. CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA.

CONTRATO: CTO-OP-MJSL-DOOTSM-018-2023

NOTA No. 9

ACTIVIDADES DEL DIA: SE OBSERVA QUE SE TIENE AVANCE EN EL SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE BASE HIDRAULICA CON MATERIAL PISTON DE 1 1/2" A FINOS

SE OBSERVO QUE EXISTEN CANTIDADES ADICIONALES DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

1000 04.- RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO 284.23 M<sup>2</sup>  
 1100 02.- EXCAVACION CON EQUIPO PARA 20 U/M = 168.67 M<sup>3</sup>  
 04 Δ.- RELENO COMPACTADO EN COPAS = 363.23 M<sup>3</sup>  
 GRAV-SCAB-1 CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA 0.26 M<sup>2</sup>  
 ATROQUE 2-Δ.- CONSTRUCCION DE ATROQUE = 2 PZAS.  
 C-Δ-INST.- CARRO MECANICA A CAMION VOLTEO = 728.82 M<sup>3</sup>  
 LCA-1-P = ACORREO DE MATERIAL PROD. DE. = 728.82 M<sup>3</sup>/K  
 CAIS-2.- CONST. DE CAJA PARA OPERACION. 1.00 PZAS.  
 8020-00 04 Δ.- SUM. E INST. DE PZAS. + SP. DE PIE. HID. DE EMPAQUE DE NEOPRENO. PZAS. 2.0  
 CCC-270.- SUM. E INST. DE TUBERIA HID. 4" 25.20 ML.

POR LO QUE SE SOLICITA A LA RESIDENCIA DE OBRA SU AUTORIZACION PARA LA EJECUCION DE TALEZ CONCEPTOS.

EQUIPO: COMPACTADOR PZAS  
 CAMION VOLTEO 7 U/M.

INS

INS. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
 SUPERINTENDENTE DE CONST.

INS. JOSE RUIZ FRIAS HDEZ.  
 RESIDENTE DE OBRA.

OBRA: I0045 - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA.

CONTRATO: CTC-OP-MJBL-DOOTSM-018-2023

NOTA No. 10


SE CONTINUA CON EL PROYECTO EJECUTANDO LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:

- SE CONTINUA CON LAS EXCAVACIONES CON EQUIPO MECANIZADO Y DE FONDO MANUAL, POSTERIORMENTE SE CONSTRUYE PLANTILLA ARMADA Y SE INSTALA LA TUBERIA DE PVC-RD-26 DE 6" PARA SUMINISTRAR EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. SE SUMINISTRA MATERIAL PETRERO DE 1/2" O FINOS COMPACTADO CON EQUIPO PR-8.

SE CUENTA CON LA VISITA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA EICCSA PARA TOMAS DE MUESTRAS DE COMPACTACION DEL RELLENO TRAMO KM 1+200 AL 2+100 Y DE COMPACTACION DE GRASA DE REESTRUCTURACION EN BOTE HIDRÁULICO TRAMO KM 0+000 - 030.50 Y KM. 681.30 AL KM 1+200

EQUIPO: 1 RETROEXCAVADORA  
1 COMPAÑIA VORTED 7 MW  
1 COMPACTADOR PR-8  
1 BAILARINA

  
ING. ISIDRO HERNANDEZ, HDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CON ST.

  
ING. JOSE RICARDO FRIOS HDEZ  
RESIDENTE DE OBRA

NOTA No. 11

07/07/23

CON LA PRESENTE NOTA SE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA EJECUCION DE LAS CANTIDADES ADICIONALES SEÑALADAS EN NOTA No. 9 DE FECHA 5/07/23

  
ING. ISIDRO HDEZ HDEZ  
SUPERINT. DE OBRAS

  
ING. JOSE RICARDO FRIOS HDEZ  
RESIDENTE DE OBRA

OBRA: TOCAS... CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA.

CONTRATO: CTO - CP - MJAL - DOCTISM - 018 - 2023

NOTA No. 18

EL CONTRATISTA OBSERVA QUE EXISTEN CANTIDADES ADICIONALES POR EJECUTAR POR LO QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACION A LA RESIDENCIA DE LA OBRA PARA LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

ccc-148.- BARRIDO DE LA SUPERFICIE TRATAR... 798.34 M<sup>2</sup>  
3000884.- SUM. E INST. DE PIERAS ESPECIALES DE PVC. HIP. PARA AGUA POT. EXTREMIDAD COMPANA 1 PZA.  
8055404ZA.- SUM. E INST. DE PZAS ESP. 1 PZA.  
Caja 2. CONST. DE CAJA DE OPERACIONES 1 PZA.

ASI TAMBIEN SE OCUPA EN LA CONSTRUCCION DE LO SIGUIENTE.

CONSTRUCCION DE CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO II EN ENTRONQUE A SON GREGORIO POR SER IMPRESINDIBLE SU CONSTRUCCION

80200004A.- SUM. E INST. DE PZAS. (EMPAQUE DE NIPERNO 4") (2 pzas)  
80180001A.- SUM. E INST. DE PZAS ESP. (TORNILLOS 5/8 x 3 1/2") = (8 pzas)  
21600007D.- VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE (2 pzas)  
80350001K.- SUM. Y E INST. DE VALVULO DE SECCIONAMIENTO COMPLETO DE 2" (2 pzas)  
80130005C.- SUM. E INST. DE PZAS ESPECIALES DE PVC EMPAQUE DE PLOMO. 2" Ø. (4 pzas)  
ccc-1570.- SUM. Y APLIC. DE SENO PREMOLLADE. (798.34 M<sup>2</sup>)

  
ING. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

  
ING. JOSE RICARDO FRIAS HDEZ.  
RESIDENTE DE OBRA.

NOTA No. 19

24/07/23.

ESTA RESIDENCIA AUTORIZA AL CONTRATISTA LA EJECUCION DE LAS CANTIDADES ADICIONALES SOLICITADAS Y LA CONSTRUCCION DE ACTIVIDADES IMPRESINDIBLES, INDICADAS EN NOTA NO. 18 DE FECHA 24/07/23.

  
ING. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.

  
ING. JOSE RICARDO FRIAS HDEZ.  
RESIDENTE DE OBRA.

OBRA: O04S. - CONSTRUCCION DE PISO DE DADO ENTUBIDO.

CONTRATO: CTO-OP-MUAL-DOOTSM-018-2023


NOTA No. 25

SE PRESENTO PERSONAL DE LA EMPRESA EICCSA PARA LOS TOMOS DE MUESTRAS DE COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA.

- SE CONCLUYE CON LA APLICACION DE SELLO PREMEXCLADO TIPO 3-A. COMPACTADO CON EQUIPO PR-8.

- SE CONSTRUYE EL ULTIMO REGISTRO PARA VOLUMENES DE EXPULSION DE AIRE.

  
ING. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.


  
ING. JOSE RICARDO FRIA H.  
RESIDENTE DE OBRAS.

OBRA: I0045. - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA  
CONTROL: CTO - OP - MIAL - P00TSM - 018 - 2023

NOTA: NO. 26

EL DIA DE HOY SE APLICÓ PINTURA VINILICA A LOS  
REGISTROS DE VOLVULAS, ASI TAMBIEN SE DETALLA  
CON PINTURA EQUIVALENTE LA TUBERIA DE ACERO AL  
CARBON EN BY PASS.  
REALIZANDO LA LIMPIEZA GENERAL DE LO OBRO  
Y RETIRO DE DESECHOS.

POR LO QUE CON ESTAS ACTIVIDADES SE DA POR CON-  
CLUIDA LA OBRA CONTANDO CON UN AVANSE FISICO  
DEL 100% Y LA CONCLUSION DE NOTAS DE OBRA  
FISICA.



ING. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
SUPERINTENDENTE DE CONST.


JOSE RICARDO FRIAS HDEZ.  
RESIDENTE DE OBRA

OBRA #0045. - CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA.  
CONTRATO. - CTO-OP-MJAL-DOOTSM-018-2023

NOTA No. 27

CON ESTO FECHO SE ENTREGA LA ESTIMACION No. 4  
DE CANTIDADES ADICIONALES PARA SU REVISION, Y/O  
AUTORIZACION, ASI COMO LA ESTIMACION No 5 (FINI-  
QUITO DE CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PRE-  
VISTOS.

  
ING. ISIDRO HERNANDEZ HDEZ.  
SUPER INTENDENTE DE CONST.

  
ING. JOSE RICARDO FRIAS HDEZ.  
RESIDENTE DE OBRAS

OBRA: I0045.- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA.  
CONTRATO: CTO-OP-MUL-DOOTSM-018-2023

NOTA No. 28

CON LA PRESENTE NOTA SE AUTORIZA LA ESTIMACION  
No. 4 (CUATRO) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES.  
PARA TRAMITE DE PAGO.

  
ING. JOSE RICARDO FRIOS HDEZ.  
RESIDENTE DE OBRAS
