



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0081.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0003.- Pob. Avapa.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0081
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0081	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0003	Ayapa, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	508	Hombres	250	Mujeres	258	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
70.00		PIEZAS			70.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio		07/08/2023		Administracion					
Término		12/08/2023							
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00	
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00		

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				437,293.68	
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00		
Marzo	0.00	Junio	437,293.68	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	437,293.68	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00		

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	437,293.68	0.00	437,293.68

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10081	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	437,293.68
Total Capitulo		437,293.68
Global		437,293.68

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0003.- Pob. Ayapa., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10081	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0003.- Pob. Ayapa.	70 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 437,293.68

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



C.C.P. Archivo



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

10081.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0003.- Pob. Ayapa.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 13 DE AGOSTO DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10081 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 003.-POB. AYAPA

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 437,293.68

META PROGRAMADA: 70.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 7-ago-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 12-ago-2023

POBLACION BENEFICIADA: 508 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	53.00	\$ 4,615.34	\$ 244,613.02
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	150.00	\$ 402.50	\$ 60,375.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	81.00	\$ 108.00	\$ 8,748.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	200.00	\$ 32.02	\$ 6,404.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	104.00	\$ 20.30	\$ 2,111.20
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	80.00	\$ 30.44	\$ 2,435.20
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
BRASUB1.2X2BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2M DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZ	3.00	\$ 720.36	\$ 2,161.08
SUBTOTAL					\$ 327,336.16
16% IVA					\$ 52,373.79
TOTAL					\$ 379,709.95

META ALCANZADA: 203.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 7-ago-2023

TERMINO REAL: 12-ago-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 379,709.95 SALDO POR CANCELAR: \$ 57,583.73

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha 18-may-2023 Inversión (\$) \$ 437,293.68

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Año del Bicentenario de Francisco Villa

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. JESUS VELAZQUEZ MENDEZ DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

Secretario

C. GUADALUPE VELAZQUEZ JIMENEZ

C. CRISTINA VELAZQUEZ MONTEJO

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. YGNACIO SEGOVIA MONTEJO

C. MARQUEZA SEGOVIA JIMENEZ

3ER. Vocal

C. MARIA JESUS VELAZQUEZ SEGOVIA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VIAL

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23
PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL
ADM-001		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias 53.00	53.00	
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes 150.00	150.00	
FOTCAU		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos 81.00	81.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 200.00	200.00	
CABTHW C12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.56 ML X LUMNARIA 1.90 53.00	100.70	
				0.60 ml x conector 0.50 200.00	100.00	
				Total	200.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.36 ML X CONECTOR 0.40 200.00	80.00	
CINAIS33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00	
SOQMOI A		SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REMPPLAZO DE SOQUES EN CARCAZAZ DAÑADOS 5.00	5.00	
BRASUB 1.2X2BR A		SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2M DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZ	EMPLAZO DE BRAZOS DAÑADOC 3.00	3.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitacora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: 10081

Descripción: Rehabilitación del alumbrado Público.

Localidad: 003.- Pob. AYAPA

Meta Programada: 70 Pza.


Meta Alcanzada: 203 Pza

Inversión Programada: 437,293.68

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 07/08/2023

Fecha de Terminación: 12 Agosto/2023

Residente: Ing. Anyela Vázquez Jiménez  C.I.D. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referente al Proyecto 10081. - Rehabilitación del alumbrado público en la localidad del Pob. Ayapa del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco.

Comenzamos las actividades con la entrega del material eléctrico al delegado y al Comité del ramo 33

Se inician los trabajos de rehabilitación de alumbrado Público con el desmantelamiento de 16 luminarias led dañadas en el parque central del Pob. Ayapa, posteriormente sustituimos las luminarias led dañadas por 16 luminarias Tipo Led Luma 1M, 60W Led 120-227 5,000K 11 Larga con sus respectivas fotoceldas (16 Pza)

Posteriormente a la rehabilitación del alumbrado del parque central, se desmantelaron 10 Pza de lámpara Led dañadas ubicadas en las partes de las calles que colindan con el parque e Iglesia central, para su sustitución por 10 Pza de lámparas Tipo led Luma 1M, 60W Led 120-227 5,000°K 11 Larga con sus respectivas - Fotoceldas (10 Pza)

Cabe aclarar que para la instalación de las luminarias tipo led Luma 1M, 60W Led se utilizaron 24 mts de cable con aislamiento THW cal. 12.

Para la instalación de las luminarias tipo led Luma 1M, 60W Led 120-227 5,000°K 11 Larga se utilizaron 20 Pza de Conectores con 8 mts de cable THW cal. 12 y 8 mts de cable de aluminio #1 cal. 6.

Mano de obra

4 Oficiales Electricistas
4 Ayudantes Electricistas

Herramientas

8 Pinzas eléctricas
8 Desarmadores de Cruz y Planos
4 Cuchillas para cables
4 llaves perico No 10
4 Juegos de llaves Hallen
4 merros de 2 libras.

Residente: Ing. Anxelo Vazquez Jimenez Ccd. 336390C

Nota: 02

Con esta fecha continuamos con la rehabilitación del alumbrado público en las diferentes calles del Pob. Ayapa.

En este día iniciamos los trabajos de rehabilitación del alumbrado público con el desmantelamiento de 27 luminarias Led dañadas ubicadas en las calles principales del Pob. Ayapa. Proseguimos con la instalación de 27 Luminarias tipo Led Luma FM, 60W Led 120-277 5,000K 11 Larga con sus Fotoceldas para sustituir las 27 Luminarias Led dañadas en las calles principales del Pob. Ayapa.

Cabe aclarar que para la instalación de las luminarias tipo Led Luma FM, 60W Led se utilizaron 36 conectores con 14.4 mts de cable THW cal. 12 x 14.4 mts de cable de aluminio 1+1 cal. 6.


Se Sustituyeron 3 Pza de brazo para luminarias de 1.2 m x 2" de diam que se encontraban deterioradas por oxidación.

Mazo de obra

- 4 Oficiales Electricistas
- 4 Ayudantes Electricistas

Herramientas

- 8 Pinzas Electricas
- 8 Desarmadores de cruz x Planos
- 4 Cuchillas Pela cables
- 4 llaves Perica No 10.
- 4 Juegos de llave Hallen
- 4 Marros de 2 Libras

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jimenez  Ceed. 3363902

Nota: 03

Con esta fecha continuamos con la rehabilitación del alumbrado Público en las diferentes calles del Poblado Ayape.

En este día continuamos con los trabajos de rehabilitación del alumbrado público con el retiro y sustitución de 38 Focos Led de 70W con fotoceldas (HPZA) y 36 conectores.

Cabe aclarar que para la sustitución de los 38 Focos Led de 70W se utilizarán 36 Conectores de 14.4 mts de cable TAW cal. 12 y 14.4 mts de cable de aluminio 1/1 Cal 6.

Se sustituyeron 3 Soguz de porcelano mugul en 3 luminarios suburbanos.

Mano de obra

3 Oficiales Electricistas
3 Ayudantes Electricistas

Herramienta

6 Pizarras Electricas
6 Desarmadores de cruz y plano
3 Cuchillas Pila Cables.
3 llaves perica No. 10
3 Juegos de llave Hallen
3 Marros de 2 libras.

Residente: Ing. Axel Vázquez Jiménez / ced. 33639

Nota: 04

Con esta fecha continuamos con la rehabilitación del alumbrado público en las diferentes calles del Poblado Ayapa.

En este día continuamos los trabajos de rehabilitación de alumbrado público con el retiro y reemplazo de 38 Focos Led de 70W con Foto celdas (11 Pza) y 36 conectores.

Cabe aclarar que para el reemplazo de los 38 Focos Led de 70W se utilizaron 36 conectores con 14.4 mts de cable THW cal. 12 y 14.4 mts de cable de aluminio 1/1 cal. 6.

Se sustituyeron 3 soguet de peracelana mogul en 2 luminarios suburbanos.

Mano de obra

3 oficiales Electricistas
3 Ayudantes Electricistas

Herramienta

6 Pinzas Electricas
6 Desarmadores planos y de cruz
3 Cuchillas Para Cables
3 llaves Perico No 10,
3 Juegos de llave Hallen
3 Marros de 2 Libras.

Residente Ing. Antelo Vazquez Jimenez / ced. 3363900

Nota: 05

Con esta fecha continuamos con la rehabilitación del alumbrado Público en las diferentes Calles del Poblado Ayapa.

En este día continuamos los trabajos con el retiro y sustitución de 37 Focos Led de 70W con foto. celdas (6 Pza) y 36 Conectores.


Cabe aclarar que para la sustitución de los 37 Focos Led de 70W se utilizaron 36 Conectores con 14.4 mts de cable THW cal. 12 y 14.4 mts de cable de aluminio 11 cal. 6.

Mano de obra.

3 Oficiales Electricistas
3 Ayudantes Electricos

Herramienta.

6 Pinzas Electricas
6 Desarmadores planos y de cruz.
3 Cuchillos Pasa Cables.
3 llaves Perico No. 10
3 Juegos de llave Hallen
3 Marcos de 2 Libras.

Residente: Ing. Anxelo Vazquez Jimenez  C.C. 3363900

Nota: 06

Con esta fecha concluimos con la rehabilitación del alumbrado Público en las diferentes calles del Pub. Ayapac.

Se realiza el retiro y Sustitución de 37 Focos Led de 70W con fotoceldas y 36 conectores.

Cabe aclarar que se utilizaron 36 conectores con 14.4 mts de cable THW cal. 12 y 14.4 mts de cable de aluminio 1th cal. 6 en la sustitución de los 37 Focos Led de 70W.

Con 2 Pza de cinta aislante Super 33 se realizó el encintado de las uniones en los cables de Cobre.


Mano de obra

- 3 Oficiales Electricistas
- 3 Ayudantes Electricistas

Herramienta

- 6 Pza Plazas Electricas
- 6 Desarmadores Planos y de cruz.
- 3 Cuchillas para Cables
- 3 llaves perico No 10
- 3 Martillos de 2 libras.

Con esta fecha se da por concluida la presente Bitácora de obra.

Residente Ing. Anyela Vaizquez Jiménez  ced 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

EL BIENESTAR EMPEZANDO EN EL MUNICIPIO

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO MÁS GRANDE

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO



LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

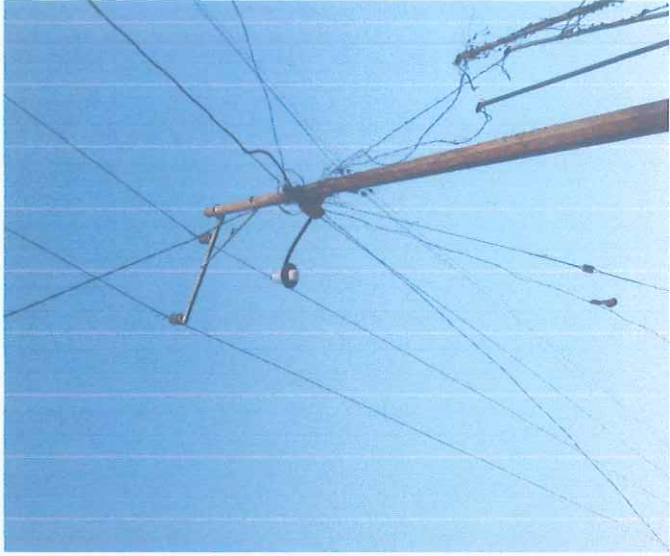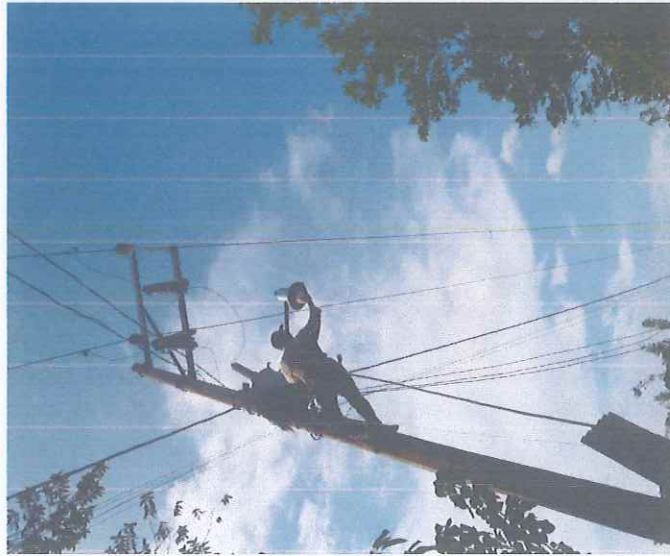

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

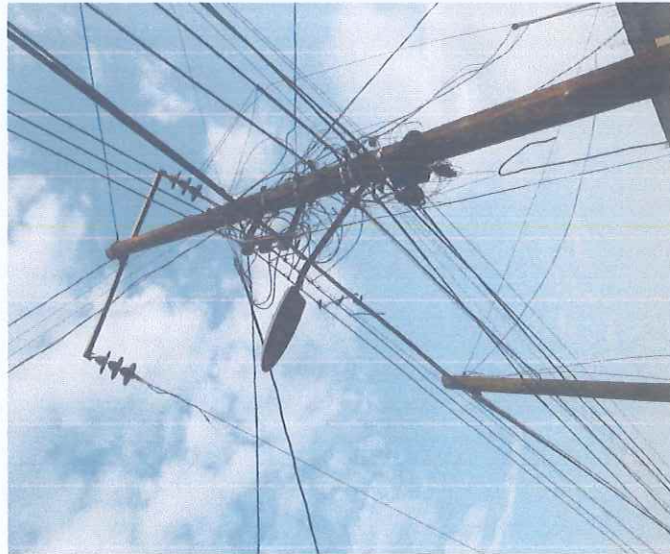

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DEL
Francisco
VILLA
EL BICENTENARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.-. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO

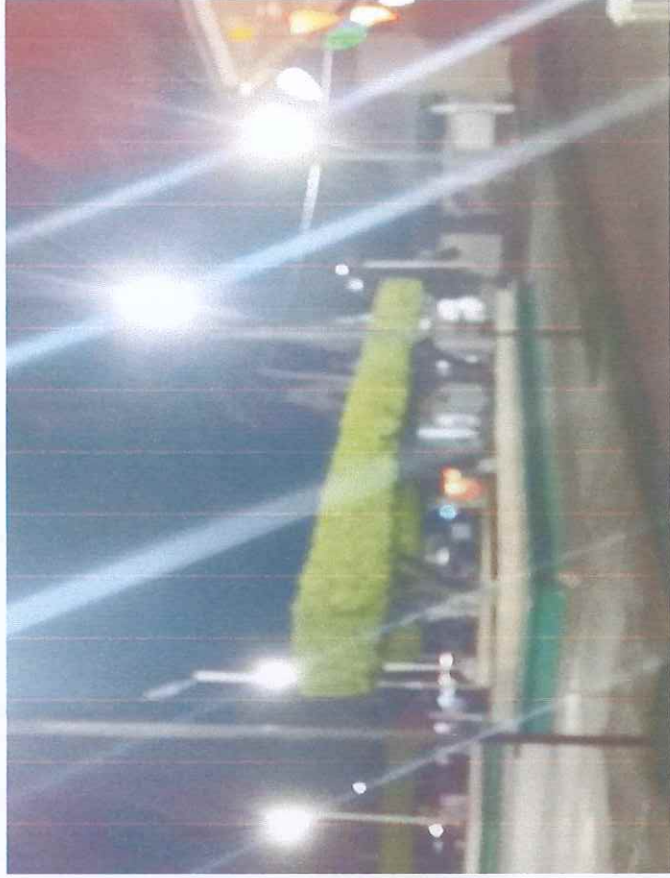

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL EMPULSADOR DEL PAIS

FECHA DE INICIO 07-ago-23

PROYECTO: I0081.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:003.-POB. AYAPA

FECHA DE TERMINACION 12-ago-23

PLAZO DE EJECUCION 6 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
