



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61301.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0111
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: CONVENIO FISE (FAIS)
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. DE LICITACION	: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023
FECHA	: 22 DE JUNIO DE 2023
OBRA	: I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.
LOCALIDAD	: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 115.00 ML.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 45 DÍAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 09 DE AGOSTO 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 330,761.63 **(TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 325,304.07 **(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 0.00 **(CERO PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/239/2023.
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2023.

CONTRATISTA	: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
DOMICILIO	: CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.: 86900
REG. FED. DE CAUSANTES	: PACW780518FR6
REG. I. M. S. S.	: E8112671109
REG. INFONAVIT	: E8112671109
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-04475



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, REPRESENTADA POR EL C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO EN SU CARÁCTER DE PERSONA FISICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- I.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K002.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE., PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

- I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
- I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO **CONVENIO FISE (FAIS)**; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL **C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO**. ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. **PACW780518FR6** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. **PRCRWL78051827H200**. MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: **CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO, TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.: 86900. CORREO: empresawp07@gmail.com** MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

3/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA. UBICADO EN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 325,304.07 *(TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 07/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 45 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2023 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 09 DE AGOSTO 2023.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2023.

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE "EL CONTRATISTA" PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ "EL AYUNTAMIENTO" SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO "EL AYUNTAMIENTO" TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

"EL AYUNTAMIENTO" OTORGARÁ A "EL CONTRATISTA" UN ANTICIPO DEL 00.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 0.00 **** (CERO PESOS 00/100 M.N.)****, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE "EL CONTRATISTA" REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A "EL CONTRATISTA" EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A "EL CONTRATISTA" CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO

5/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015,

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 014790655089586856

TIPO DE CUENTA: SANTANDER PYME

SUCURSAL: 5022 **NOMBRE DE LA SUCURSAL:** AMERICAS

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

8/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

10/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA”, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

“EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

- I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL AYUNTAMIENTO”.
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.
- VIII. SI “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR “EL CONTRATISTA” LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI “EL AYUNTAMIENTO” OPTA POR LA RESCISIÓN, “EL CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS **DIEZ (10) DÍAS NATURALES** CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A “EL CONTRATISTA” LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS

14/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL “CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL AYUNTAMIENTO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE “EL AYUNTAMIENTO” DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUENCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, A 22 DE JUNIO DE 2023.

FIRMAS

POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR "EL CONTRATISTA"
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PERSONA FISICA

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORLENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023, DE LA OBRA: I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/396/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO DEPARTAMENTO 8 COL.
TENOSIQUE CENTRO C.P.: 86900 TENOSIQUE, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	11:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	45 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	240 Líneas y redes de agua potable		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	0.00% Cero por Ciento (Sin Anticipo)		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 2

*Recabido
30 mayo 2023*
Williams
Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 2 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/397/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA

EDIFICIO No. 12 DEPTO. 201 COL. FOVISSSTE II C.P.:
86170 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

*Recibi invitación
30-05-23
[Signature]*

**AT'N. ING. CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA
REPRESENTANTE LEGAL**

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	11:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	45 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	240 Líneas y redes de agua potable		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	0.00% Cero por Ciento (Sin Anticipo)		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 2 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/398/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

EDIFICIO 12 DEPTO.: 201 COLONIA FOVISSSTE II C.P.:
86170 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	5 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	6 de junio de 2023	11:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	45 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	26 de junio de 2023
Especialidad requerida	240 Líneas y redes de agua potable		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
Anticipos	0.00% Cero por Ciento (Sin Anticipo)		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 7 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 2

Reab.
31-Mayo-23
Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL ANIVERSARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 2 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6



JALPA DE MÉNDEZ, TAB. A 03 DE JUNIO DE 2023.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN

C. MTRO RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO COMSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO



P R E S E N T E:


POR MEDIO DE LA PRESENTE Y EN RESPUESTA AL OFICIO DE INVITACION: COPM/DLyPU/396/2023 DE FECHA 30 DE MAYO DE 2023, MANIFIESTO QUE MI EMPRESA ACEPTA A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No° MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23 RELATIVO A LA OBRA: I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez. EL CUAL TIENE UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 45 DÍAS NATURALES

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED QUEDANDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACALARACION AL RESPECTO.

ATENTAMENTE


C. WILLIAMS PARDO CORNELIO
ADMINISTRADOR ÚNICO

C.C.P.- Archivo



**CONSTRUCTORA FUMA
S.A. DE C.V.**

R.F.C. CFU-120418983
EDIFICIO 12. DEPTO. 201 COLONIA FOVISSSTE II,
VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO, C.P. 86170
Correo Electrónico: fuma.09@hotmail.com

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 30 DE MAYO DEL 2023.

**C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:**



POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN ATENSIÓN A SU OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 30 DE MAYO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NO. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23 REFERENTE A: I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA. LOCALIDAD: 0053.- EL PÚLPITO. ASI MISMO CONFIRMO NUESTRA ACEPTACION PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION, COMPROMETIENDONOS A ENTREGAR NUESTRA OFERTA EN TIEMPO Y FORMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLE ORDENES

CONCURSO NO.: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23

OBRA: I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

UBICACIÓN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

ATENTAMENTE


C. ING. FREDY ULISES MÉNDOZA AYALA
ADMINISTRADOR UNICO



CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA
R.F.C.: CAMC9208207P3
Edificio 12 Depto. 201 Colonia Fovissste II, Villahermosa,
Centro Tabasco C.P. 86170 TEL: 913-331-04-67
E-mail: Cf92casanova@gmail.com

JALPA DE MENDEZ, TABASCO. A 30 DE MAYO DE 2023.

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA
PRESENTE:



ASUNTO: OFICIO DE ACEPTACION.

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO REFERENCIA AL NUMERO DE OFICIO DE INVITACIÓN NO. COPM/DLYPLU/397/2023., DE FECHA 30 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, CON EL FIN DE DAR A CONOCER NUESTRA TOTAL ACEPTACIÓN EN PRESENTAR NUESTRA PROPUESTA EN EL PROCEDIMIENTO NO. MJM-ADJ-R33-009-23 DE LA OBRA 10111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO A SUS ÓRDENES.

A T E N T A M E N T E

C. ING. CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

OFICIO No. COPM/DLyPU/393/2023.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTE:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 750.00 ** (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL AREA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

OFICIO No. COPM/DLyPU/394/2023.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTE:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 750.00 ** (SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL ÁREA

C.c.p.- Archivo.


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

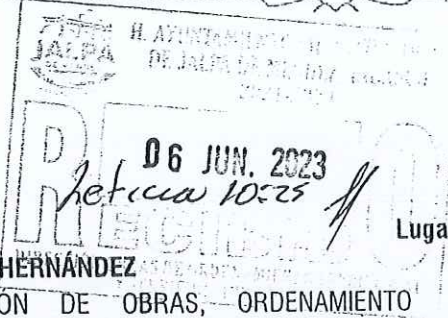

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/406/2023. ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Table with 4 columns: EVENTO, FECHA, HORA, LUGAR. Row 1: Acto de presentación y apertura de proposiciones, 13 de junio de 2023, 13:00 hrs., Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/405/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PLANO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/404/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ

SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. Mtro. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/402/2023. ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Stamp: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Date: 06 JUN 2023. Time: 10:39 AM. C.c.p.- Archivo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/403/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

C.c.p. - Archivo



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/400/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

10:50 en D^o Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA

PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO
CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO
2000. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REINOLUCIDADO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/401/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIÁS MORA

SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA (TABASCO)

AV. PASEO TABADCONO. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.

86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
OFICINA DE SERVICIOS
RECIBIDO
08 JUN 2023
HORA: 10:16
ANEXO: 0192
NOMBRE: S/A

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE BIENESTAR,
SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

RECIBIDO
08 JUN 2023
11:13
JMS

DESPACHO DEL C. SECRETARIO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/367/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 30 de Mayo de 2023.

C. LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO
SECRETARIO DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO (TABASCO). PASEO DE LA SIERRA No. 425 COL. REFORMA, C.P. 86080 VHSA., TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	13 de junio de 2023	13:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia; me despido de usted enviándole un afectuoso saludo

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 5 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 10:30 hrs. a.m. del día **lunes, 5 de junio de 2023** los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales serviran para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	
CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA C. CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. C. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ	





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VIAL
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23

Descripción de la obra: I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
-------------	---------------	-------

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO
CORNELIO

CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA

Carlós Francisco Casanova
Mendoza

CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

Fredy Ulises Mendoza Ayala



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 6 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 11:00 hrs. del día martes, 6 de junio de 2023 hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones.

Página 1 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

Al no habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las **11:46 hrs.** del día **Martes 06 de Junio de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	
CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA C. CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. C. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	



Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.

02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadrada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 13 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)

Presupuesto Base con I.V.A.	\$ 330,761.63
--------------------------------	---------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 13:00 hrs. del día Martes, 13 de Junio de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1.- WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
- 2.- CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.
- 3.- CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

Página 1 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	\$280,434.54	45 Días Naturales
2.-	CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	\$284,512.03	45 Días Naturales
3.-	CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	\$282,202.40	45 Días Naturales

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Lunes, 19 de Junio de 2023. a las 11:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Por los Invitados

Firma

C. Adelfo Morales Palma
Representante de la secretaría de la función Pública del Estado

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

C. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

C. CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA
CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA

[Handwritten signature]





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23

Descripción de la obra: I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
POR LOS LICITANTES**

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
---------------------	---------------	-------

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

WILLIAMS ALEJANDRO
CORNELIO

[Firma manuscrita]

CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA

Carlós Francisco Casanova
Mendoza

[Firma manuscrita]

CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

Fredy Ulises Mendoza Ayala

[Firma manuscrita]



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACIÓN No: MUM-INV-FISE (FAIS)-003-

OBRA: 010111.- 050000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO				CONSTRUCTORA PUMA, S.A. DE C.V.				CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
LET-000A	preliminares Construcción de lettero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de pdr de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pndencia, excavación hasta un metro de profundidad y 21 tubos de concreto f'c= 150 kg/cm² de 30 x 30 x 100 cm para empujar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo ácido y acabado semalte a dos manos en estructura y lamina, herramientas y mano de obra	pta.	1,0000	\$ 7,296.29	\$ 7,296.29	2.555%	\$ 7,803.66	7%	2.783%	\$ 7,902.81	6%	2.778%	\$ 7,899.50	8%	2.766%			
CCC-093	Agua potable Trazo y nivelación en canchinos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m²	522.5000	\$ 7.64	\$ 3,991.00	1.400%	\$ 3,981.45	0%	1.420%	\$ 7.72	1%	1.418%	\$ 4,028.48	1%	1.428%			
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con contadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	m.	1,045.0000	\$ 27.07	\$ 28,288.15	9.821%	\$ 26,186.85	3%	10.405%	\$ 28.28	4%	10.387%	\$ 20,542.15	4%	10.488%			
CCC-103	flujo y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: aplicación del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m²	62.7000	\$ 221.99	\$ 13,918.77	4.891%	\$ 13,282.93	-5%	4.729%	\$ 214.21	-4%	4.721%	\$ 12,874.82	-8%	4.502%			
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cegas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m³	282.1500	\$ 39.08	\$ 11,026.42	3.867%	\$ 10,693.49	-3%	3.813%	\$ 38.38	-2%	3.808%	\$ 10,820.10	-2%	3.838%			
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alajar tuberías hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (ballarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m³	31.3500	\$ 382.56	\$ 11,308.26	3.988%	\$ 11,037.08	-3%	3.939%	\$ 356.52	-2%	3.928%	\$ 10,187.81	-10%	3.610%			
CCC-370	Suministro e instalación de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 300 mm (4") de diámetro con campana y anillo de hule	m	115.0000	\$ 371.08	\$ 18,674.20	6.900%	\$ 19,182.45	-3%	6.833%	\$ 168.75	-1%	6.821%	\$ 18,397.05	-1%	6.879%			
CCC-052	relleno y compactado de equipo (ballarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m³	125.4000	\$ 317.92	\$ 39,807.17	13.982%	\$ 38,774.93	-3%	13.827%	\$ 317.30	0%	13.885%	\$ 39,262.71	-2%	13.909%			

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-003-

OBRA: 01111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELO			CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.			CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
TOMA 4X1/2	Suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable a base de 1 hidrónoma de 103.4 mm (4" x 1/2") de diámetro, 5 m de longitud hidrónico C66 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga rosca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 niple espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 abrazaderas-sinfin de 13 mm (1/2")	piez.	75.0000	\$ 548.76	\$ 41,157.00	14.434%	\$ 527.41	-4%	39,555.75	14.105%	\$ 534.09	\$ 40,066.75	-3%	14.079%	\$ 40,041.75	-3%	14.185%
CCC-709A	Suministro e instalación de junta Gibault de hierro fundido de 100 mm (4") de diámetro	Pieza	3.0000	\$ 597.43	\$ 1,792.29	0.029%	\$ 1,861.53	6%	0.674%	\$ 638.25	\$ 1,915.47	7%	0.673%	\$ 1,014.75	7%	0.670%	
CCOD0214	Suministro e instalación de codo de PVC hidrónico RD-26 de 100 mm (4" x 21") de diámetro con anillo de hule	Pieza	3.0000	\$ 389.26	\$ 1,167.78	0.410%	\$ 1,217.31	4%	0.434%	\$ 410.76	\$ 1,232.76	6%	0.433%	\$ 1,232.28	6%	0.437%	
CCC-399	Suministro e instalación de tee de PVC hidrónico RD-26 de 101 (4") x 75 mm (3") de diámetro con anillo de hule	Pieza	6.0000	\$ 457.85	\$ 2,747.10	0.965%	\$ 2,916.06	6%	1.040%	\$ 492.33	\$ 2,953.08	8%	1.038%	\$ 2,952.84	7%	1.046%	
CCC-263	Suministro e instalación de tee de PVC hidrónico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule	Pieza	5.0000	\$ 452.53	\$ 2,262.65	0.704%	\$ 2,440.40	8%	0.870%	\$ 494.20	\$ 2,471.30	9%	0.860%	\$ 2,470.35	9%	0.875%	
CCC-471	Suministro e instalación de tapón campana de PVC hidrónico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule	Pieza	4.0000	\$ 408.49	\$ 1,633.96	0.573%	\$ 1,850.32	13%	0.680%	\$ 488.43	\$ 1,873.72	15%	0.659%	\$ 1,873.00	15%	0.684%	
CCC-471A	Suministro e instalación de tapón espiga de PVC hidrónico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule	Pieza	4.0000	\$ 375.66	\$ 1,502.64	0.627%	\$ 1,640.84	10%	0.588%	\$ 417.67	\$ 1,670.68	11%	0.587%	\$ 1,670.08	11%	0.592%	
CAMA.2	Construcción de caja para operación de válvulas tipo ll de 1.00 x 0.90 x 1.07 m, para diámetros de 2" a 3", construida con planilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm ² de 10 cm de espesor, lea de piso de concreto f'c= 200 kg/cm ² de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de tabicación sólido de 28 cm de espesor, acabado interior pulido con mortero f'c= 13 de 1 cms. de espesor, dala perimetral superior de concreto f'c= 250 kg/cm ² de 15 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 10 cm, incluye: suministro de materiales, acero libre, mano de obra, enbarrado, desmoldado, habilitado y armado de acero, elaboración en obra de concreto hidrónico, suministro e instalación de contramarca sencillo, o doble de: sencillo de 1.40 mt. con canal de 100 mm (4"), marco con tapa de hierro fundido de 50 x 50 cm. con peso de 134 kg, colado, desperdicios, limpieza de sobrantes, equipo y herramienta. No incluye: atarques para tubería.	piez.	3.0000	\$ 19,773.62	\$ 59,320.86	20.804%	\$ 57,790.62	-3%	20.809%	\$ 19,507.66	\$ 58,522.08	-1%	20.570%	\$ 58,500.33	-1%	20.730%	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FISE (FAIS)-003-

OBRA: 10111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO				CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.				CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %			
CCC-556	Suministro e instalación de válvula del conector de hierro fundido, interiores del bronce, extremos bridados, estándar tipo de 100 mm (4") de diámetro, Clase 125, modelo W719F, marca Welworth o similar, con 16 tornillos de 16 x 76 mm (5/8" x 3") con tuerca hexagonal y 16 arandelas de 16 x 76 mm (5/8" x 3")	Pieza	3.0000	\$ 6,051.62	\$ 18,154.86	6.387%	1%	18,292.08	6.523%	\$ 6,097.39	\$ 18,292.08	2%	6.511%	\$ 6,174.84	\$ 18,523.92	2%	6.511%	\$ 6,128.52	\$ 18,379.56	1%	6.513%
CCC-358	Suministro e instalación de empaque de espiga bridada de PVC hidráulico (10-26 de 100 mm (4") de diámetro)	Pieza	3.0000	\$ 341.71	\$ 1,025.22	0.380%	11%	1,135.65	0.405%	\$ 378.55	\$ 1,135.65	11%	0.405%	\$ 383.35	\$ 1,150.05	12%	0.404%	\$ 383.20	\$ 1,149.80	12%	0.407%
CCC-356	Suministro e instalación de extremidad campana bridada de PVC hidráulico RD-36 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule	Pieza	3.0000	\$ 803.37	\$ 2,407.11	0.844%	0%	2,409.45	0.859%	\$ 803.15	\$ 2,409.45	0%	0.859%	\$ 813.32	\$ 2,439.96	1%	0.859%	\$ 813.02	\$ 2,439.06	1%	0.864%
CCC-382	Suministro e instalación de empaque de neopreno para brida de 100 mm (4") de diámetro	Pieza	31.0000	\$ 55.02	\$ 1,705.62	0.508%	1%	1,718.84	0.613%	\$ 55.44	\$ 1,718.84	1%	0.613%	\$ 56.15	\$ 1,740.65	2%	0.612%	\$ 56.12	\$ 1,739.72	2%	0.618%
CCC-536	Suministro e instalación de empaque de neopreno para brida de 75 mm (3") de diámetro	Pieza	6.0000	\$ 45.31	\$ 271.86	0.005%	0%	272.28	0.007%	\$ 45.38	\$ 272.28	0%	0.007%	\$ 45.65	\$ 275.70	1%	0.007%	\$ 45.94	\$ 275.64	1%	0.068%
CCC-552A	Suministro e instalación de tornillo galvanizado de cabeza hexagonal con tuerca y arandela de 16 x 76 mm (5/8" x 3")	Pieza	224.0000	\$ 45.27	\$ 11,098.48	3.871%	-10%	9,887.36	3.526%	\$ 44.14	\$ 9,887.36	-10%	3.520%	\$ 44.71	\$ 10,015.04	-9%	3.520%	\$ 44.68	\$ 10,008.32	-9%	3.547%
S/C06	Construcción de anillo de concreto (FC=150g/cm2 de sección 0.20x0.20x0.60 m de alto, incluye cámara, decimara y encajón)	Pza	25.0000	\$ 140.99	\$ 3,524.75	1.206%	-1%	3,503.50	1.249%	\$ 140.14	\$ 3,503.50	-1%	1.247%	\$ 141.90	\$ 3,547.50	1%	1.247%	\$ 141.86	\$ 3,546.80	1%	1.257%
			SUB-TOTAL	\$	285,139.34		\$	280,434.54		\$	280,434.54		\$	282,202.40			\$	282,202.40			
			IVA	\$	45,672.29		\$	44,889.53		\$	44,889.53		\$	45,531.82			\$	45,152.38			
			TOTAL	\$	330,811.63		\$	325,324.07		\$	325,324.07		\$	327,734.22			\$	327,354.78			

ENCARGADO
ING. ANDRÉS GONZÁLEZ BUSTOS
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



AÑO DE
Francisco
VITA
EL BRUJERÍA DEL TABASCO

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 19 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	10111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23		
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	285,139.34

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$ 285,139.34
Rango de Evaluación	
A).- Monto Máximo	\$284,512.03
B).- Monto Mínimo	\$280,434.54



Diferencia (A - B): \$ 4,077.49
De donde: 1 X \$ 284,512.03 ÷ 10 : \$ 28,451.20
De donde: \$ 4,077.49 Menor que < \$ 28,451.20

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	\$280,434.54	Se considera solvente
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	\$ 284,512.03	Se considera solvente
CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	\$ 282,202.40	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	martes, 30 de mayo de 2023
Visita de Obra	lunes, 5 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 6 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	martes, 13 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	\$ 280,434.54
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	\$ 284,512.03
CARLOS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA	\$ 282,202.40

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.



03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplirlas obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y al antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, Representada Legalmente por: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

lunes, 19 de junio de 2023

Firma

Elaboro
C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a lunes, 19 de junio de 2023

Descripción de la obra:	I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	
No. De Licitación:	MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23	
Origen de los Recursos	CONVENIO FISE (FAIS)	

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 11:00 hrs. del día Lunes, 19 de Junio de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 11:00 hrs. DEL Lunes, 19 de Junio de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-FISE (FAIS)-003-23 RELATIVO AL PROYECTO: I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO	45 Días Naturales	\$ 280,434.54 (Doscientos Ochenta Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro Pesos 54/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023
Descripción de la obra:	10111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 0.00 %. (CERO POR CIENTO).

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO PARA EL Martes, 22 de Junio de 2023. A LAS 12:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

6. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Martes, 22 de Junio de 2023. A LAS 14:40 HRS. EN EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DDOOTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 11:35 hrs. DEL DÍA Lunes, 19 de Junio de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. Mtro. Cristian David Coronel Santos
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

C. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

C. CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA
CARLÓS FRANCISCO CASANOVA MENDOZA





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0111.- 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K002.- Mejoramiento para la Infraestructura de Agua Potable.

LA PRESENTE OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE CON EL TRAZO Y CORTE DEL PAVIMENTO, DEMOLICION DE CONCRETO, SONDEO DE LINEAS, EXCAVACION EN ZANJAS CON HERRAMIENTA MANUAL Y CON EQUIPO MECANICO DONDE SE REQUIERA, PLANTILLA DE ARENA, TUBERIAS DE PVC DE 4" DE DIAM, CAJA DE OPERACION DE VALVULAS E INTERCONEXION A LA LINEA EXISTENTE A LA RED PUBLICA.

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 7 de abril de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **07-abr-23**

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra 05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0111	05000512.- Construcción de red de agua potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, ciudad de Jalpa de Méndez, barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	115 ML.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 330,761.63

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ TABASCO Y SIENDO LAS 09:10 HRS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2023 SE ENCUENTRAN EL ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; LA C.WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO (PERSONA FISICA): PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripción de los Trabajos	Unidad	Cantidad
	Agua potable		
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos	m ² .	376.53
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	1,045.00
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ³ .	62.70
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	282.15
CCC-651	Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bailarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	25.82
CCC-270	Suministro e instalación de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con campana y anillo de hule	m	115.00
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³ .	125.40
TOMA 4X1/2	Suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable a base de 1 hidrotoma de 101 x 13 mm (4" x 1/2") de diámetro, 5 m de poliducto hidráulico Ced 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga rosca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 niple espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 abrazaderas sinfin de 13 mm (1/2")	pza.	49.00
CODO 22 4	Suministro e instalación de codo de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4" x 22°) de diámetro con anillo de hule	Pieza	1.00
CCC-263	Suministro e instalación de tee de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule	Pieza	5.00
CCC-471	Suministro e instalación de tapón campana de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule	Pieza	1.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

CANTIDADES ADICIONALES			
CCC-022	Corte de concreto hidráulico con cortadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	30.80
CCC-103	Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.	m ³ .	28.93
CCC-032	Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad	m ³	108.38
CCC-270	Suministro e instalación de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con campana y anillo de hule	m	422.90
CCC-052	Relleno y compactado con equipo (bailarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³ .	149.4935

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	9 DE AGOSTO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION :	45 DIAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 330,761.63
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 325,304.07
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	
FIANZAS	
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2443387-0000
EMPRESA AFIANZADORA:	Liberty Fianza
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	22 DE JUNIO DE 2023
No. DE FIANZA DE ANTICIPO:	XX
EMPRESA AFIANZADORA:	XX
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	XX
No. DE FIANZA DE DE ENDOSO POR AMPLIACION:	XX
EMPRESA AFIANZADORA:	XX
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	XX
No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:	2452999-0000
EMPRESA AFIANZADORA:	Liberty Fianza
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	
PERIODO DE EJECUCION	14 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION:	9 DE AGOSTO DE 2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADO	\$ 77,287.80	\$ 466.39
2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADO	\$ 48,507.58	\$ 292.71
3 (TRES) PARCIAL CANTIDADES ADICIONALES	\$ 31,136.35	\$ 187.89
4 (CUATRO) FINIQUITO, TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES	\$ 168,372.34	\$ 1,016.04
	\$ 325,304.07	\$ 1,963.03

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 14 DE AGOSTO DE 2023

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
CONTRATISTA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C.WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO (ADMINISTRADOR UNICO).

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023
FECHA DE FORMALIZACION:	22 DE JUNIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO:	I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.
MONTO AUTORIZADO:	\$ 330,761.63
MONTO CONTRATADO:	\$ 325,304.07
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ -
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	45 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	26 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	9 DE AGOSTO DE 2023

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO	
1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADO	21/07/2023	DEL	26 DE JUNIO DE 2023	AL	15 DE JULIO DE 2023	\$ 77,287.80	\$ 77,287.80
2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADO	05/08/2023	DEL	16 DE JULIO DE 2023	AL	31 DE JULIO DE 2023	\$ 48,507.58	\$ 125,795.38
3 (TRES) PARCIAL CANTIDADES ADICIONALES	05/08/2023	DEL	16 DE JULIO DE 2023	AL	31 DE JULIO DE 2023	\$ 31,136.35	\$ 156,931.73
4 (CUATRO) FINIQUITO, TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES	15/08/2023	DEL	01 DE AGOSTO DE 2023	AL	09 DE AGOSTO DE 2023	\$ 168,372.34	\$ 325,304.07

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE			MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD


DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO. 2452999-0000 EXPEDIDA POR AFIANZADORA, ASEGURADORA LYBERTY FIANZAS PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.


CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 11:10 HORAS DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ


ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.



ING. JOSÉ RICARDO FRIAS HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


C. WILLIAMS ALEJANDRO PARDO
CORNELIO ADMINISTRADOR ÚNICO

<p>DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.</p> <p>PROYECTO : I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.</p> <p>LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ</p> <p>TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)</p> <p>CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023</p>		<p>ALBUM FOTOGRAFICO</p> <p>WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO PACW780518FR6</p> <p>CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO R.F.C. : PACW780518FR6 R.U.C.T. : SFP-RUC-04475 LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:</p>	
<p>MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023</p>			

<p>RED DE AGUA POTABLE</p>	
<p>ALBUM FOTOGRAFICO FINAL</p>	
CCC-093	Trazo y nivelación en caminos o vialidades existentes con aparatos topográficos
	m².

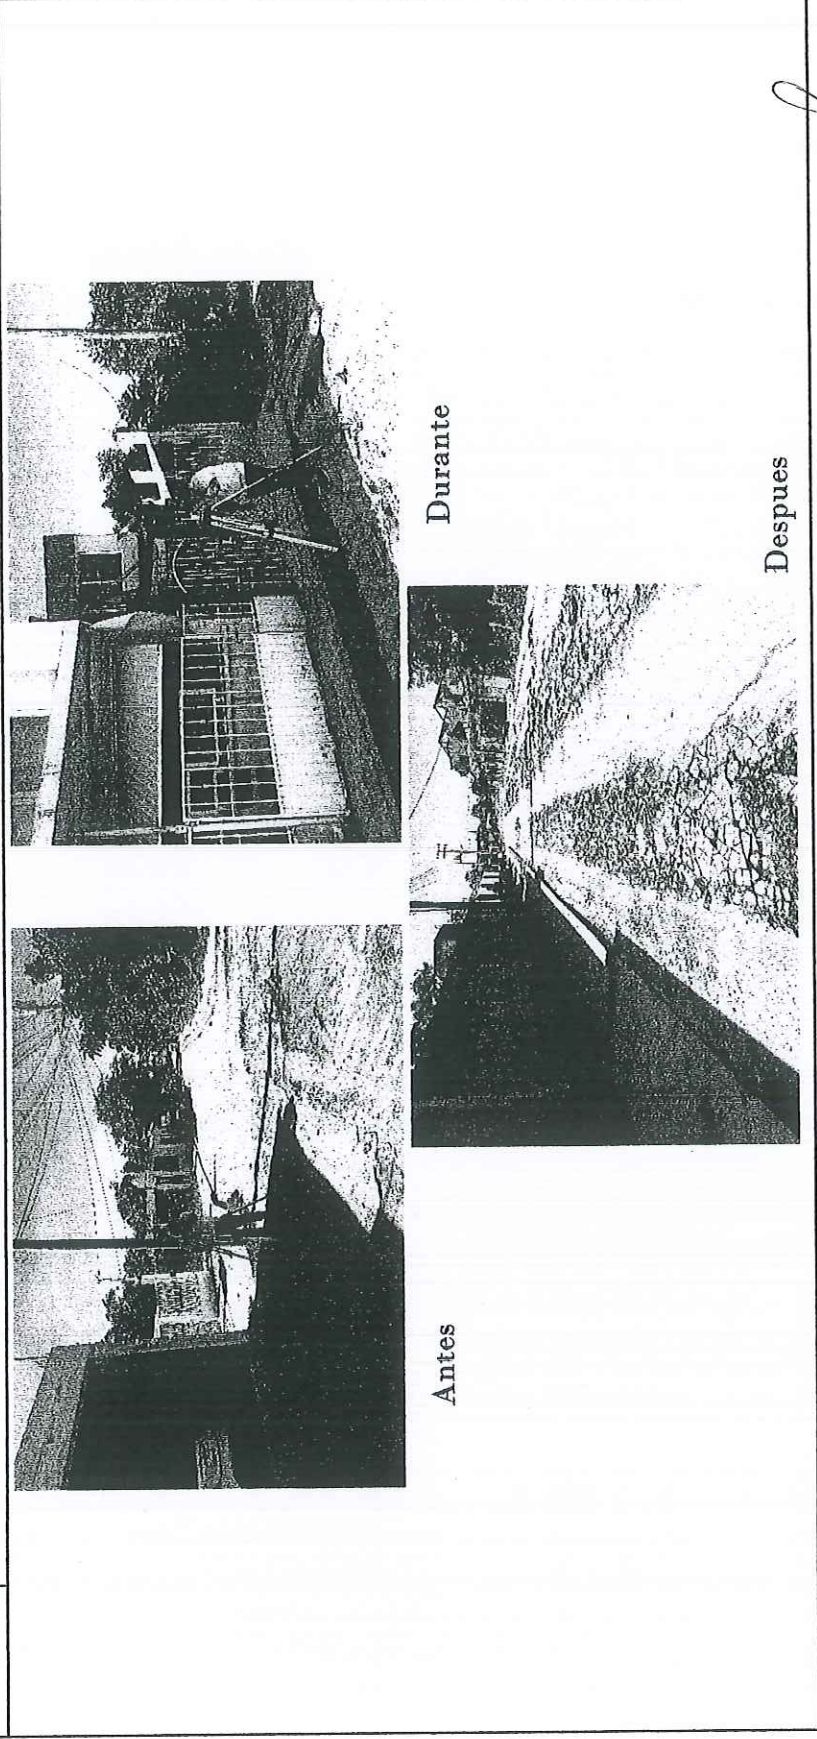

FORMULADO
ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISADO:
ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

1 DE 10

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: GTO-OP-IMJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6

CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C. : PACW780518FR6
R.U.C.T. : SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:

RED DE AGUA POTABLE


ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-022 Corte de concreto hidráulico con contadora de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad

m².



Antes

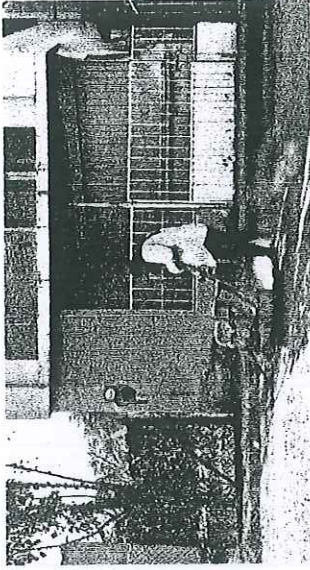

Durante



Despues

FORMULA

ING. FORNELI VIBIOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

2 DE 10

REVISO:
ING. JOSE RICARDO VILLAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6

CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C. : PACW780518FR6
R.U.C.T. : SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:


RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-103

Ruptura y demolición de pavimento hidráulico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra.


m2

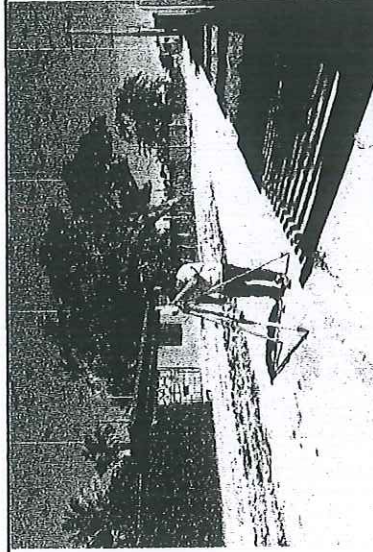

Antes

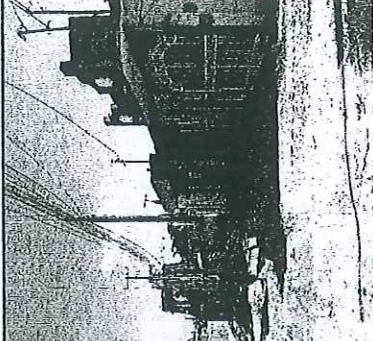

Durante

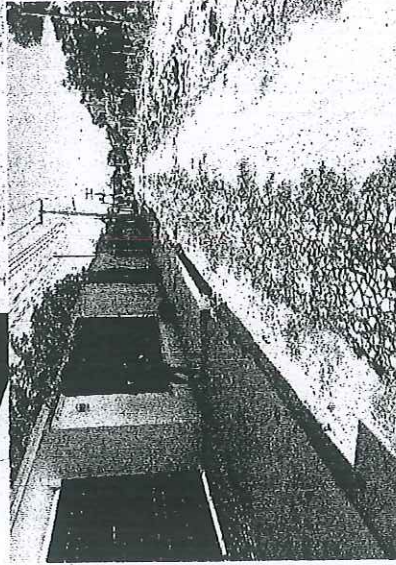

Despues

FORMULO
ING. JORGE RAMOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
~~ING. JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ~~
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

ALBUM FOTOGRAFICO

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6

CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

R.F.C.: PACW780518FR6

R.U.C.T.: SFP-RUC-04475

LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO

MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:


RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-032

Excavación con equipo mecánico (retroexcavadora) en cepas en material tipo "B" de 0.00 a 2.00 m de profundidad

ml.

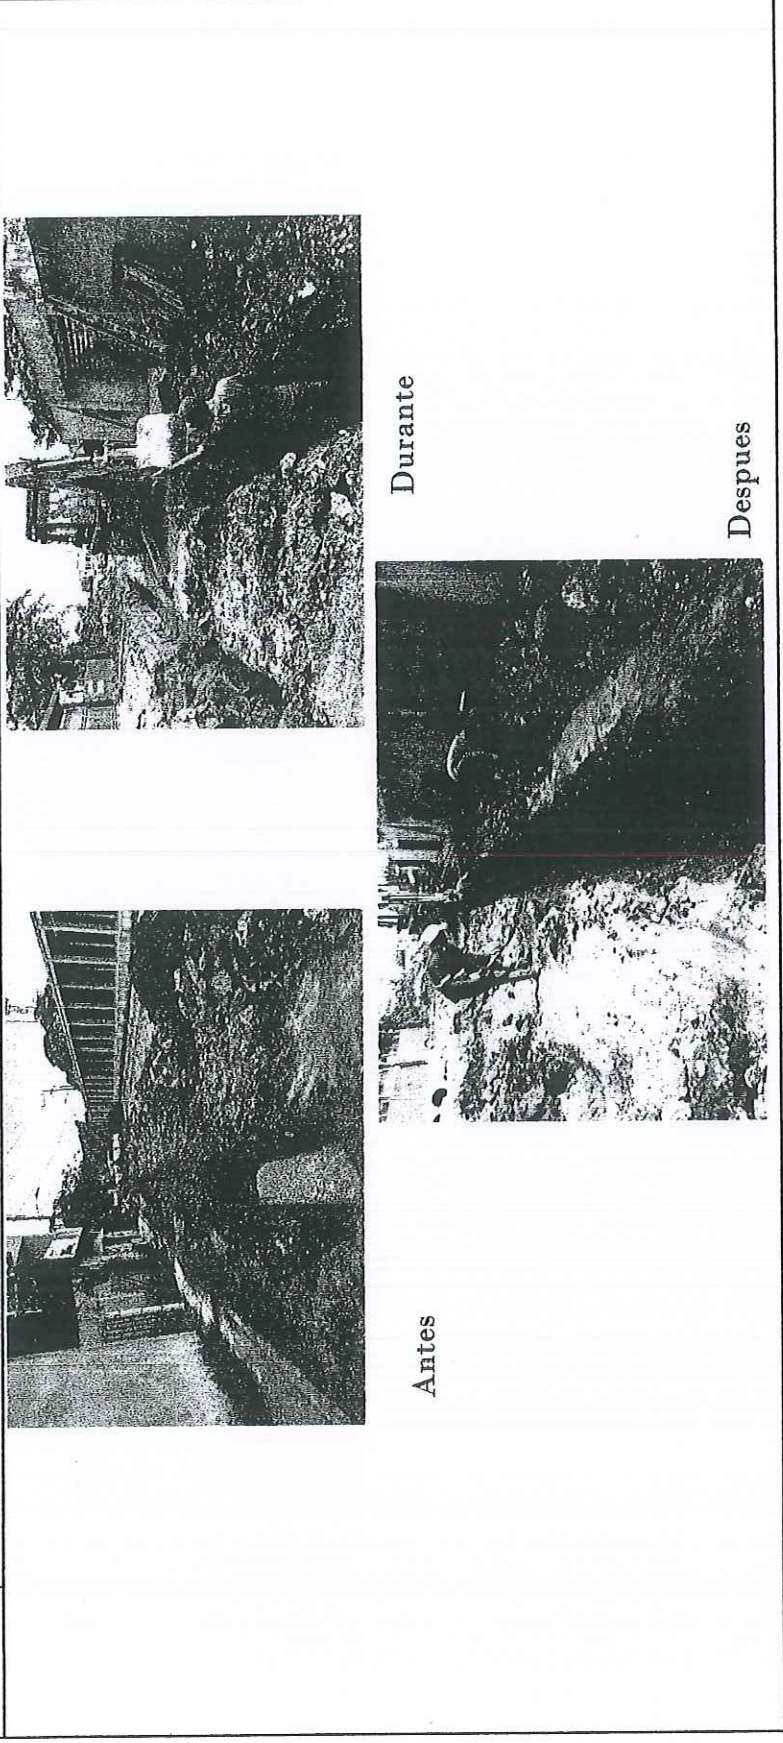

FORMULO

ING. JORGE CAMPOS AVALOS
SUPERVISOR DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

4 DE 10

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 05000612.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR5



CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C. : PACW780518FR6
R.U.C.T. : SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P. :


RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-651

Suministro y tendido manual de arena para cama en excavaciones para alojar tubería hidráulica o sanitaria, compactado con equipo (bailarina) al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.


pza.

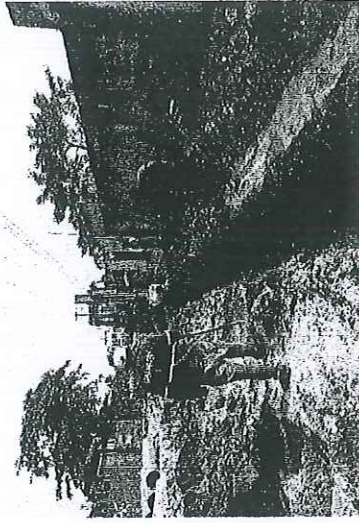

Antes

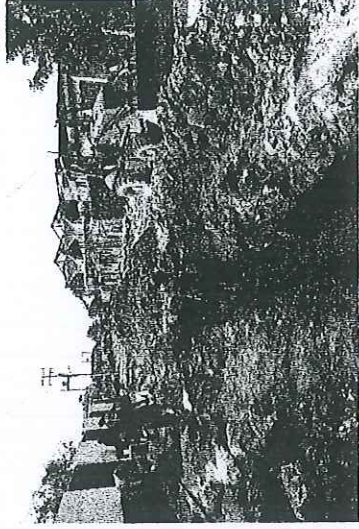

Durante

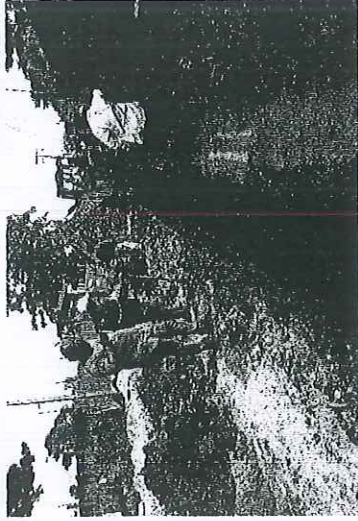

Despues

FORMULO:

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10111.- 050000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6

CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO

R.F.C. : PACW780518FR6

R.U.C.T. : SFP-RUC-04475

LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO

MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:





RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

CCC-270

Suministro e instalación de tubo de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4") de diámetro con campana y anillo de hule pza.

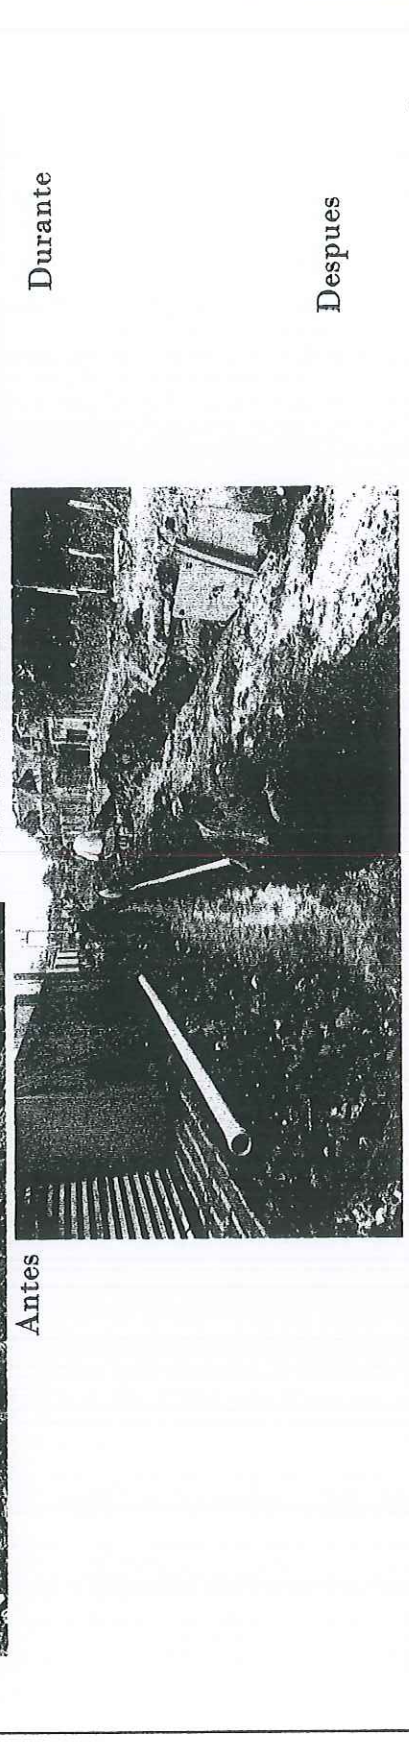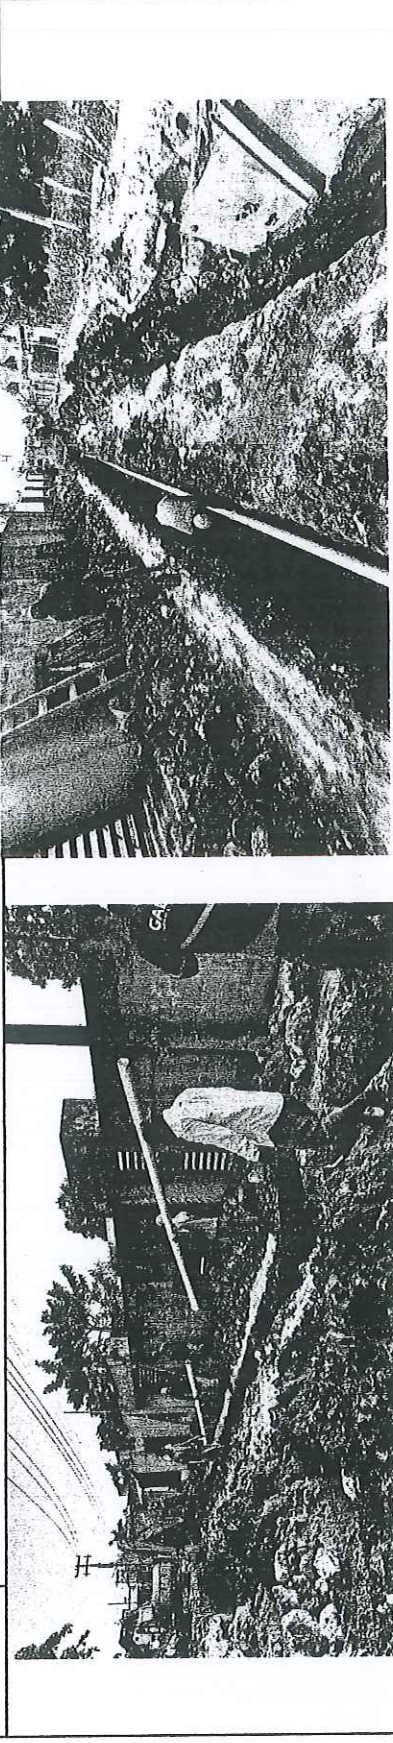

Durante

Antes

Despues

REVISO:

~~ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ~~

SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

FORMULADO:

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ

SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6




CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C. : PACW780518FR6
R.U.C.T. : SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:


RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-052 Relleno y compactado con equipo (baliarina) con material de banco (arena), en capas de 20 cm, compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M. M3

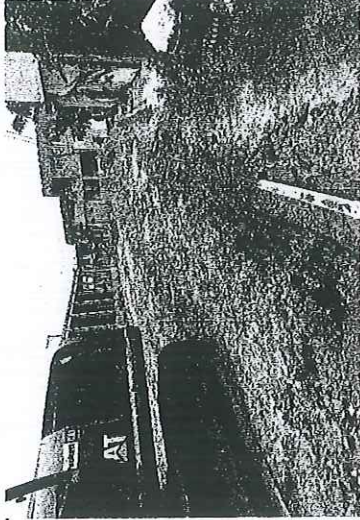

Antes

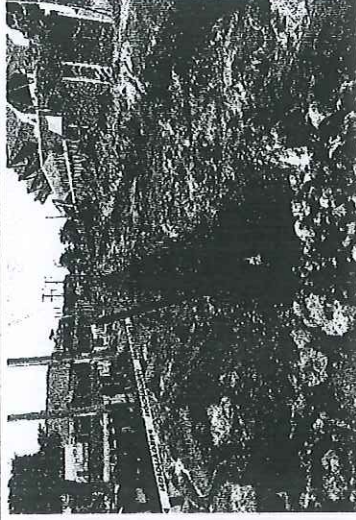

Durante

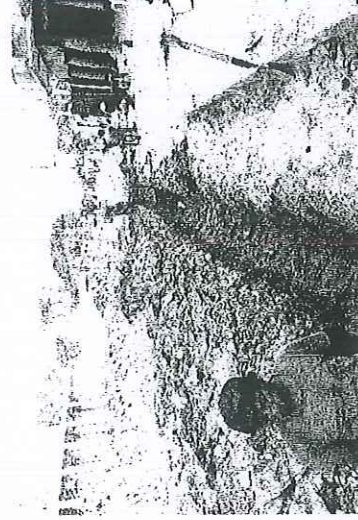

Despues

FORMULO:

ING. JUAN CAMPOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE RICARDO MARIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 06000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO




WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6

CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C. : PACW780518FR6
R.U.C.T. : SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:

RED DE AGUA POTABLE	
ALBUM FOTOGRAFICO FINAL	
TOMA 4X1/2	ml.

Suministro e instalación de toma domiciliaria de agua potable a base de 1 hidrótoma de 101 x 13 mm (4" x 1/2") de diámetro, 5 m de poliducto hidráulico Ced 80 de 13 mm (1/2"), 1 adaptador espiga rosca interior de bronce de 13 mm (1/2"), 1 niple espiga de bronce de 13 mm (1/2"), 2 abrazaderas sinfin de 13 mm (1/2")

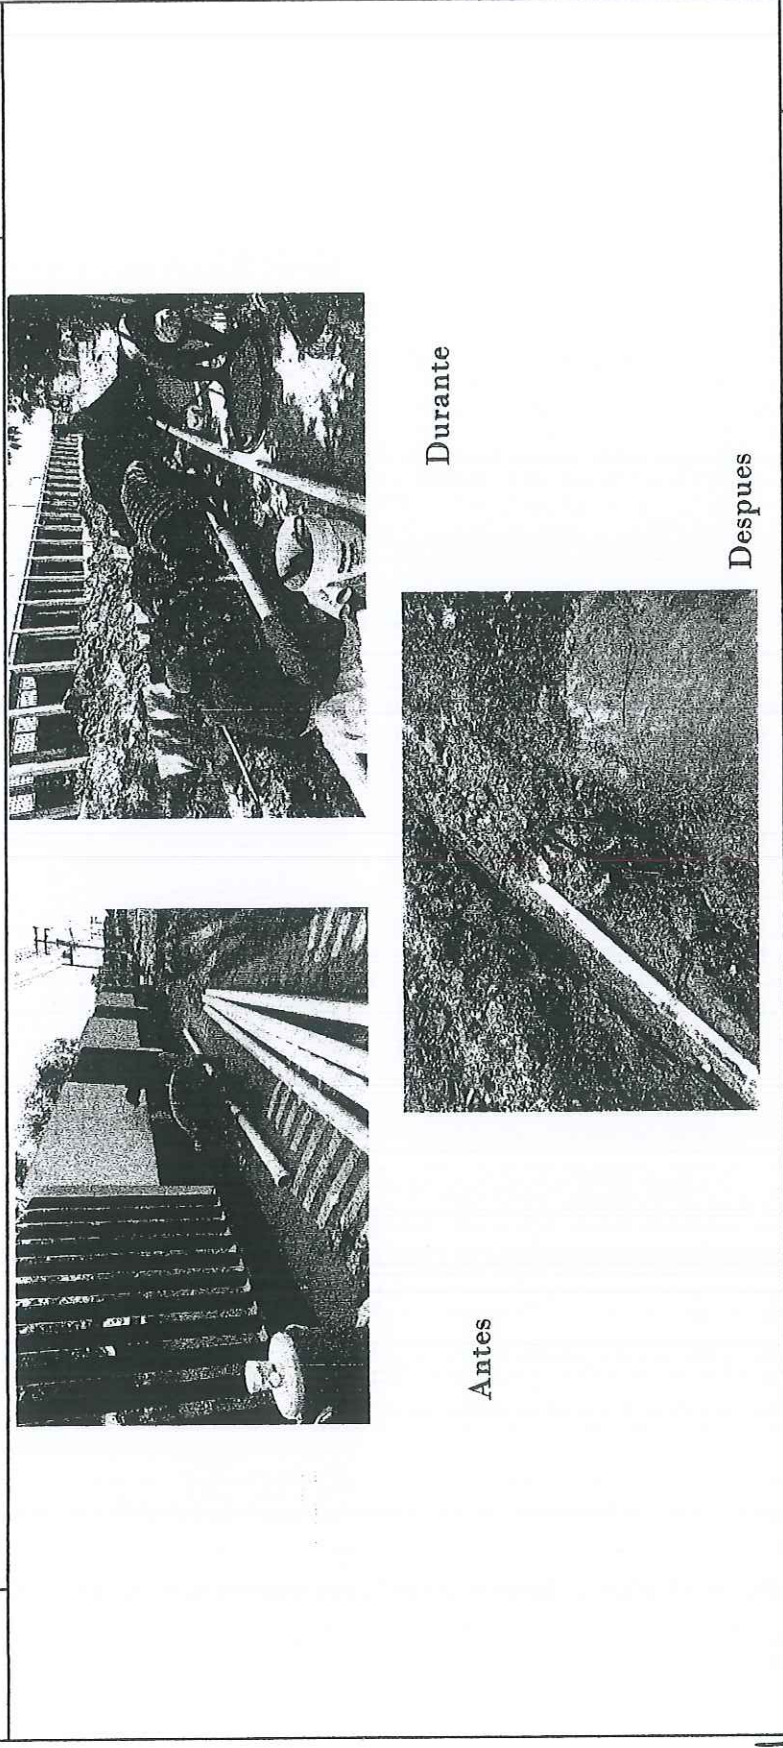

Antes

Durante

Despues

FORMULA
ING. JORGE RAMOS AVALOS
SUPERVISOR INDEPENDIENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:
ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : I0111.- 05000512.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO

WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
 PACW780518FR6

CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C.: PACW780518FR6
R.U.C.T.: SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
 DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P.:



RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CODO 22 4 Suministro e instalación de codo de PVC hidráulico RD-26 de 100 mm (4" x 22") de diámetro con anillo de hule ml.



Antes



Durante

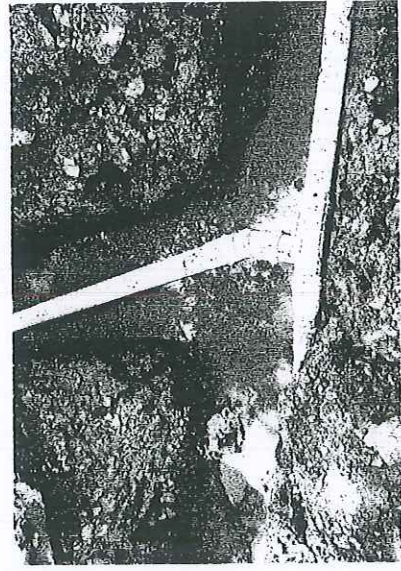

Despues

FORMULA:

ING. FORCIBRAMPOS AVALOS
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

REVISO:

ING. JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO : 10111.- 05000612.- CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, BARRIO SAN LUIS, CALLE EMILIANO ZAPATA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ
TIPO DE RECURSO: CONVENIO FISE (FAIS)
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
DE FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

ALBUM FOTOGRAFICO



WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
PACW780518FR6



CONTRATISTA : WILLIAMS ALEJANDRO PARDO CORNELIO
R.F.C. : PACW780518FR6
R.U.C.T. : SFP-RUC-04475
LOCALIDAD : CALLE 22 ALTOS SIN NUMERO
DEPARTAMENTO 8 COL. TENOSIQUE CENTRO
MUNICIPIO : TENOSIQUE DE PINO SUAREZ, TABASCO C.P. :


RED DE AGUA POTABLE

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL


CCC-263 Suministro e instalación de tee de PVC hidráulico RD-28 de 100 mm (4") de diámetro con anillo de hule pza.



Antes

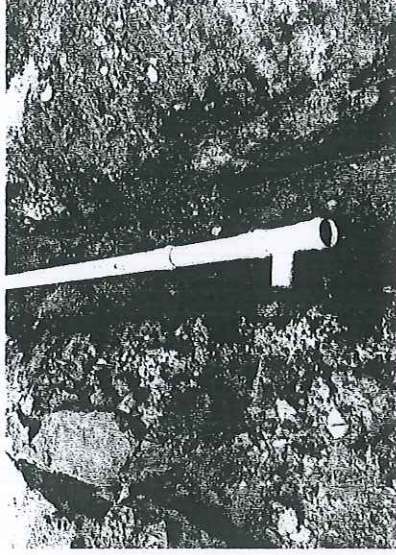

Durante

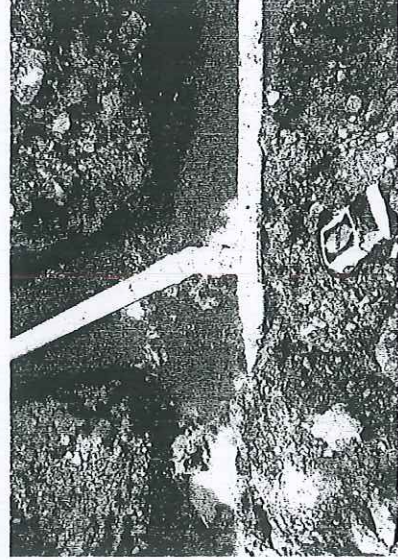

Despues

FORMADO
ING. JORGE LUIS POSAVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

10 DE 10

REVISO:
ING. JOSE RICARDO GONZALEZ HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM

Con esta fecha y en cumplimiento al art. 95 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las mismas del estado de Tabasco, se abre la presente bitacora de obra referente a los trabajos T.O.111.-05000512.- Construcción de Red de Agua Potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata. con número de contrato CTO-OP-MJAL-000512-025-2023

= Datos Generales de Proyecto =

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez
 Obra: T.O.111.-05000512 Construcción de Red de Agua Potable, en el municipio de Jalpa de Méndez, Ciudad de Jalpa de Méndez, Barrio San Luis, Calle Emiliano Zapata.
 Proyecto Numero: T.O.111
 No De Contrato: CTO-OP-MJAL-000512-025-2023.
 Orden de los Recursos: Convenio Fide (Foid).
 Programa: K002
 Fecha De Inicio: 26 de Junio de 2023
 Fecha De Terminación: 9 de Agosto de 2023.
 Plazo De Ejecución: 45 Días Naturales.
 Procedimiento de Contratación: Invitación a mundo, menos tres.
 Monto Contratado: \$ 330,761.63 (Trecientos Treinta mil setecientos sesenta y uno pesos 63/100 M.N).
 Importe Del Anticipo: \$ 0.00
 Meta: 115.00 ml.

= Datos Del Contratista =

Contratista: Williams Alejandro Pardo Cornelio
 Domicilio: Calle 22 Altos, J.M. Depto 8 Col. Tenosique, Municipio de Tenosique, Tabasco C.P. 86900.
 Reg. Fed. de Comercio: PACW780518FR
 Reg. Unos: E8112671109
 Reg. Infonavit: E8112671109
 Reg. Patron de Contratista: SFP-RUC-04475
 Nombre de la Afianzadora:
 No. Póliza de la fianza de Cumplimiento:
 No. Póliza de la fianza de Anticipo:
 No. De Teléfono:

= Datos Del Superintendente De Construcción =

Nombre: JORGE CAMPOS AVAJO
 Profesión: ING. CIVIL
 Dirección: REGULO TORPEY ANDRADE S V MACULTEPEC CCUTAD TABASCO
 Cédula: 5941366
 No De celular: 01 933 3518673, 9932675751
 Correo electrónico: Campos@AVAJO.hotmail.com

= Datos del Residente de la Doptsm =
Nombre: José Ricardo Frios Hernandez
Profesion: Ing. Civil
Direccion: Ejido Amoro Nacaluxa, Tab.
Cedula:
No De Celular: 99 32 34 04 88
Correo Electronico: Jr 02 @ live.com.mx

= Nota De Validacion =

Esta bitacora de obra sera el medio de comunicacion entre los Partes que forman el contrato No. CTO-OP-MJAL-DOPTSM-025-2023.

1. Se registraron por ambos Partes todos los asuntos y cuentas importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

2. La siguiente bitacora queda bajo el resguardo de la Residencia de la Obra de la contratante y el horario para conducir y asentar las notas de bitacora sera de las 8:00 a las 16:00 horas.

3. Las Firmas y el reconocimiento de los mismos, deberan ser con un plazo no mayor de tres dias, acordando que, en caso de vencer el plazo para la firma de la nota se dara por aceptada la o las notas referidas, las notas podran ser retiradas hasta que esten completas y firmadas o en caso de vencer el plazo de la firma, se enfatiza la prohibicion de modificar las notas firmadas.

4. Los plazos para la revision y autorizacion de estimaciones y numero generadores, se horan conforme a lo establecido en la clausula decima del contrato "Forma de Pago" debiendo el contratista presentar la estimacion dentro de los 6 (seis) dias posteriores a la fecha de corte establecido en el contrato, en cumplimiento al Art. 54 de la ley de Obras Publicas y servicios relacionados con las mismas.

5. La contratista solo podra ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo Original de contrato durante la ejecucion de los trabajos.

6. El contratista debe aceptar lo relacionado a las normas de seguridad e higiene y proteccion ambiental.

NOTA No. 1

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

CON FECHA 26 JULIO DE 2023 SE DA INICIO A LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA ANTES MENCIONADO.

ESTANDO PRESENTE EL ING. JORGE CAMPOS AVALOS SUPERINTENDENTE DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, EL ING. JOSE RICARDO FILLAS HERNANDEZ POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDOZ TABASCO, SE REALIZA UN RECORRIDO POR LA OBRA, PARA VALORAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL AREA DE PROYECTO Y VERIFICAR EL INICIO DE LOS TRABAJOS.

SE REALIZA EL TRAZO Y NIVELACION CON APARATO TORUSMATIC

SE INICIA CON EL CORTE, CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL CONCRETO (HIDRAULICO-ASFALTICO), PRESENTANDO DOS CAPAS, LA INTERIOR DE CONCRETO HIDRAULICO, LA SUPERIOR A BASE DE MEZCLA ASFALTICA, EL CUAL AUMENTA EL PENALTE A ROMPER Y DEMOLER.

SE INICIA CON LOS SONDOS PARA LOCALIZAR INSTALACIONES EXISTENTES, QUE INTERFIEREN EN EL TRAZO DE LA OBRA.

MAQUINARIA DE CORTE DE DISCO DIAMANTE
 PETROEXCAVADORA CON MANTILLO NEUMATICO.

ING. ~~JORGE CAMPOS AVALOS~~
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ~~JOSE RICARDO FILLAS HERNANDEZ~~
 SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM.

NOTA No 2

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE INICIA LAS ACTIVIDADES, CON LA CARGA Y ACARREO DE MATERIA PRODUCTO DE LA DEMOLICION, SE INICIA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, DEBIDO AL MAL ESTADO DEL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EL MATERIAL NO ES APTO PARA SER REUTILIZADO EN LA EXCAVACION, SE CONTINUA CON EL TENDIDO DE LA CAMA DE ARENA, PARA POSTERIONMENTE SIGUIA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA RD-26 DE 4" DE DIAMETRO, SE INICIA CON LA COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS (ABRAZADERAS 4" DE DIAMETROS, INSERTO DE BRONCE DE 1/2", TUBO CONDUCTO HIDRAULICO CEDULA 80 DE 1/2", NIPLES DE 1/2" Y ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2") SE CONTINUA CON EL RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

Equipo

1. RETROEXCAVADORA

2. CAMION VOLTEO

Ing. ~~Jorge Campos Avalos~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Ing. ~~Jose Ricardo Filas Hernaldez~~
RESIDENTE DE OBRA DEL DOOTSM

NOTA No 3

FECHA: 28 / 06 / 2023

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES EN LA RED DE AGUA POTABLE, CONTINUAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE LA TUBERIA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE LAS HIDROTOMAS, ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA Y RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ARENA.

Equipo

1. RETROEXCAVADORA

1. CAMION VOLTEO

Ing. ~~Jorge Campos Avalos~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

Ing. ~~Jose Ricardo Filas Hernaldez~~
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 4

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON EL CORTE DEL PAVIMENTO HIDRAULICO-ASTALTICO, SE CONTINUA CON LA RUTURA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARRE DEL MATERIA PRODUCTO DE LA DEMOLICION.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, CONTINUAMOS CON LA COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

EQUIPO

- 1 RETRO EXCAVADORA
- 1 CAMION VOLTEO
- 1 MAQUINA DE CORTE DE DISCO DIAMANTE
- 1 RETRO EXCAVADORA CON MANTILLO NEUMATICO

ING. ~~JOSÉ CAMPOS AVALOS~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ~~JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ~~
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 5

FECHA: 30/06/2023

CONTRATO: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023

EL DIA DE HOY UNICA LABORES CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CONTINUAMOS CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SEGUIMOS CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE AGUA TD-26 DE 4" DE DIAMETRO, SE COLOCAN LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL ACOSTIZAMIENTO DE LA TUBERIA Y RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

EQUIPO

- 1 RETRO EXCAVADORA
- 1 CAMION VOLTEO

ING. ~~JOSÉ CAMPOS AVALOS~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ~~JOSE RICARDO FRIAS HERNANDEZ~~
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 6

CONTRATO: CTO-OP-HJAL-DOOTSM-025-2023

SE CONTINUA CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CON LA CARGA Y ACARDEO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION,

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARDEO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION; COLOCACION DE CAMA CON MATERIAL DE BANCO ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 9" RD-26, INSTALACION DE LAS HIDROTOMAS Y ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

EQUIPO

1 RETROEXCAVADORA

1 CAMION VOLTEO

1 MAQUINA DE CONTE DE DISCO DIAMANTE

1 RETROEXCAVADORA CON MARTILLO NEUMATICO.

~~ING. JORGE CARLOS AVALOS~~~~SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION~~~~ING. JOSE RICARDO TRIAS HERNANDEZ~~~~RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM~~

NOTA No 7

FECHA 03/07/2023

CONTRATO: CTO-OP-HJAL-DOOTSM-025-2023

SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SE INSTALA LA TUBERIA DE AGUA RD-26 DE 9" DE DIAMETRO, SE COLCAN LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

EQUIPO

1 RETROEXCAVADORA

1 CAMION VOLTEO


~~ING. JORGE CARLOS AVALOS~~
~~SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION~~~~ING. JOSE RICARDO TRIAS HERNANDEZ~~
~~RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM~~

NOTA N. 8

CONTRATO : CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO HIDRAULICO-ASTALTICO, SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCIDO DE LA DEMOLICION.

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTADO EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR.


ING. JORGE CAMPOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. JOSE RICARDO ERIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM


NOTA No 9

FECHA: 07/07/2023

CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SE INSTALA LA TUBERIA DE AGUA POTABLE RD-26 DE 4" DE DIAMETRO, SE COLOCAN LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA Y RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION.


ING. JORGE CAMPOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ING. JOSE RICARDO ERIAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA DE LA DOOTSM.

NOTA No 10

CONTRATO No: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE OBRA, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO RD-26, COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS Y ACOSTILLAMIENTO DE LA TUBERIA, RELLENO TOTAL DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO A RENA. SE LE COMUNICA, @ CONTRAFITO DE DEBERA PRESENTAR LA INTRODUCCION Y FORMAL TRABAJOS REALIZADOS COMO RESULTADO DEL PERIODO DEL 26/06/2023

1. RETROEXCAVADORA
1 CAMION VOLTERO

ING. ~~JORGE CAMPOS~~ AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ~~JOSE RICARDO FLORES~~ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA No 11

FECHA: 12/07/2023

CONTRATO No: CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA PRESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON EL CORTE DEL PAVIMENTO HIDRAULICO-ASFALTICO, SE CONTINUA CON LA P.V.P. TUBIA Y DEMOLICION DEL MISMO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y EL ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION

SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LAS HIDROTOMAS, SE CONTINUA CON EL RELLENO DE ARENA COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR

ING. ~~JORGE CAMPOS~~ AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. ~~JOSE RICARDO FLORES~~ HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA 12

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA RD-26 DE 4" DE DIAMETRO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SE INSTALA LA TUBERIA DE AGUA RD-26 DE 4" DE DIAMETRO, SE COLOCAN LAS HIDROTOMAS, SE ACOSTILLA CON EL MIENTRO DE LA TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES EN EL CONCEPTO CCC-270 - SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 10 MM (4") DE DIAMETRO.

ING. JORGE CAMPOS AVALOS

ING. JOSE RICARDO FARIAS HERNANDEZ

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION NADEZ

RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA 13

FECHA 15/07/2023

CONTRATO : CTO-OP-MJAL-DOOTSM -025-2023

SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO, SE CONTINUA CON LA CARGA Y EL ACARreo DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL LUGAR INDICADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA, SE INSTALA LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO RD-26, SE INSTALA LAS HIDROTOMAS, SE ACOSTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA, Y SE RELLENA LA EXCAVACION TOTAL CON ARENA PROVENIENTES DE BANCO. CON LO ANTERIOR SE AUTORIZA LA EJECUCION DE LA CANTIDAD ADICIONAL EN LA NOTA 12.

EQUIPO

1. RETROEXCAVADORA

1. MAQUINA DE CONTE DE DISCO DIAMANTE

1. RETROEXCAVADORA CON MARTILLO PNEUMATICO.

ING. JORGE CAMPOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIONING. JOSE RICARDO FARIAS HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA DE LA DOOTSM

NOTA 14
CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-023-2023

SE INICIA LOS TRABAJOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE DEJA LA PREPARACION, PARA LA COEXION ENTRE LA TUBERIA PROVENIENTE DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO Y LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SE INSTALA UNA TEE, UNA REDUCCION DE 4" A 3" Y UN TAPON CAMPANA DE 3", PARA LA CONTINUACION DE LA TUBERIA DE 4" SE COLOCA UN CODO DE 22°. SE INSTALA LA TUBERIA COLOCANDELE LA CAMA DE ARENA, SE ACOSTILLA CON MATERIAL DE BANCO ARENA, SE RELLENA EL TOTAL DE LA EXCAVACION CON ARENA.

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA A LA RESIDENCIAS DE OBRAS DE LA DOOTSM, LA APROBACION PARA LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES, EJECUTADOS EN LOS TRABAJOS DE ESTE PROYECTO:

(CC-022 REllENO Y COMPACTADO CON EQUIPO (BALLARINA) CON MATERIAL DE BANCO (ARENA), EN CAPAS DE 20 CM, COMPACTADO AL OCHENTA Y CINCO POR CIENTO DE SU P.V.S.M.

Con esta misma nota se autoriza la ejecucion de la cantidad adicional todo esto para el buen funcionamiento de la obra.


Ing. José Ricardo Flores Hernández
Residente de la Obra.


Ing. Jorge ~~Carroll~~ Avalos
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA 15

CONTRATO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-025-2023

SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE SE CONTINUA CON LA RUPTURA Y DEMOLICION DEL PAVIMENTO-HIDRAULICO ASFALTICO, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA CAMA DE ARENA A LO ANCHO DE LA EXCAVACION, SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SE RELLENA CON MATERIAL DE BANCO ARENA.


Ing. José Manuel Fico Hernández
Residente de la Dootsm.


Ing. Jorge Campos Añalos
Residente de la Contratista.

NOTA 16

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS, EN LA RED DE AGUA POTABLE, EL DIA DE HOY INICIAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE RD 26 DE 4" DE DIAMETRO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.


M. José Fernando Higuera
Supervisor de la Dootsm.


Jorge Carlos Avalos
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.

NOTA 17

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON EL TENDIDO DE CAMA DE ARENA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA, COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.


Ing. José Ricardo Flores Alvarado
SUPERVISOR DE LA DOOTSM


ING. Jorge Campos Aguilar
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA N. 18

CONTRATO: CTO-OP-MJAZ-DOOTSM-023-2023

SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MEUDEZ, QUE SE CONTINUA CON LA DEMOLICION Y RUPTURA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO-ASFALTICO, SE CONTINUA CON EL ACARREO PRODUCTO DE LA DEMOLICION Y EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA CAMA DE ARENA, SE CONTINUA CON LA INTALACION DE LA TUBERIA DE 4" DE DIAMETRO, SE CONTINUA CON EL RELLENO EN LA TOTALIDAD DE LA EXCAVACION CON MATERIAL DE BALCO, ARENA.

Con esta nota se le informa al contratista que debese entre por la asignacion 02, Porcentaje de trabajos ejecutados correspondiente al periodo de 14 de Julio al 31 de Julio.

Ing. José Andrés Torres Hernández
SUPERVISOR de la Dootsm.

Ing. JOSÉ CARLOS RUALES
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA N° 19

CONTRATO : CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO, INICIAMOS CON LA EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA PARA SENTAR LA TUBERIA, INSTALACION DE TUBERIA DE 4" RD-26, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO DE ARENA, DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO-ASFALTICO, ACARREO DE MATERIAL PRODUCO DE DEMOLICION Y EXCAVACION

CON ESTA NOTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE LA DOOTSM QUE SE PRESENTARA ESTIMACION OZ(LDOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS Y 03 (TRES) CANTIDADES ADICIONALES.

[Handwritten Signature]
SUPERVISOR DE LA OBRA

[Handwritten Signature]
ING. JORGE CAMPOS AVALOS
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA 20


CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-025-2023


CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRAS DE LA DOOTSM, QUE SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, SE CONTINUA CON LA CAMA DE ARENA, COLOCACION DE TUBERIA DE 4" RD-26, INSTALACION DE LAS HIDROTOMAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO CARGUA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.

TAMBIEN SE LE INFORMA, QUE SE REALIZA LAS CONEXIONES DE PIEZAS EN EL NUDO 3 (TEE DE 4" Ø RD-26, REDUCCION DE 4" A 3" DE Ø RD-26, COPLE DE REPARACION DE 3" RD-26

POR ESTE MEDIO SE LE SOLICITA AMPLIACION DE MONTO, DEBIDO A QUE SE AMPLIO LA LONGITUD DE LA TUBERIA RD-26 DE 115 ML EN CATALOGO DE OBRA A 595.30 MI INSTALADOS REALMENTE, YA QUE LA TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO, EL CUAL COLAPSARA EN POCO TIEMPO, ES NECESARIO EL CAMBIO DE TUBERIA, YA QUE ESTA CALLE SERA PAVIMENTADA CON CONCRETO HIDRAULICO. ESTA SITUACION HA PROVOCADO QUE SE GENEREN CANTIDADES ADICIONALES.

En respuesta al oficio, y nota donde solicita ampliacion de monto por conceptos de cantidades adicionales, se autoriza la ampliacion esto para el buen funcionamiento de la obra ya que es indispensable el vital liquido (Agua Potable).


ING. José Ricardo Prieto Hdez
Residente de la Dootsm


ING. Jorge Campos Aguas
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA 21

CONTRATO: CTO-OP-MIAL - DOOTSM - 023 - 2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA, QUE SE INICIAN LOS TRABAJOS CON EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TOBERNA DE 4" ϕ RD-26, ACOSTILLAMIENTO Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO ARENA.

SE INFORMA, QUE SE REALIZAN LA COLOCACION DE PIERNAS EN LOS NODOS 4 Y 5 (TEE 4" ϕ , TAPON CAMPANA 4" ϕ).

Con esta fecha se firma el documento tecnico del convenio de ampliacion de monto al contrato ya mencionado.

CON ESTA FECHA SE LE SOLICITA, A LA SUPERVISION DE OBRA DE LA DOOTSM, LA APROVACION PARA LA EJECUCION DE LOS CONCEPTOS CANTIDADES ADICIONALES: CCC-022 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO, CCC-032 EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, CCC-103 RUPTORA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.

Una vez revisado la solvencia de la elevacion de la cantidad autorizada queda autorizada para el buen funcionamiento de la obra.


Ing. Jorge Carras Aguas
Residen de la Ebotom


ING. JORGE CARRAS AGUAS
SUPERINTENDENTE DE CONSTANCIA

NOTA: 22

CONTRATO: CIO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE LA DOOTSM QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, COLOCACION DE CAMA DE ARENA, INSTALACION DE TUBERIA PD-26 4", COLOCACION DE HIDROTOMAS, RELEVO EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA, COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR.


Ing. José Puerto por Hoz
Residente de la DOOTSM


Ing. Jorge Campos Avalos
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA 23

CONTRATO CTO-OP-MIAL-DOOTSM-023-2023

CON ESTA FECHA SE INFORMA A LA RESIDENCIA, DE LA DOOTSM QUE SE INICIAN, LOS TRABAJOS CON: EXCAVACION CON EQUIPO MECANICO, INSTALACION DE TUBERIA DE 4" ϕ RD-26, SONDEO PARA INSTALACIONES EXISTENTE (LUZ ELECTRICA), SUBTERRANEA, COLOCACION DE HIDROTOMAS, ACOSTILLAMIENTO Y RELLENO EN EXCAVACION CON MATERIAL DE BANCO ARENA COMPACTANDO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR.

TAMBIEN SE LE INFORMA LA CONEXIONES DE PIEZAS EN EL NUDO N. 6 (Tee DE 4" ϕ) RD-26 Y COPLE DE REPARACION DE 4" ϕ RD-26.

TAMBIEN SE LE INFORMA QUE CON ESTA FECHA SE TERMINAN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS AL 100%, DEL PRESENTE CONTRATO, DANDO POR FINALIZADA ESTA OBRA, FINALIZANDO TODAS LAS ACTIVIDADES.

En relacion a la solicitud de ampliacion de monto que se encuentra por en espera de recursos.

~~Ing. Jose Ricardo San Hdez~~
Residente de la Dootsm

~~Ing. Jorge Carras Alajo~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

CTO-OP-MJAL-000TSM-025-2023

NOTA: 24

El día 21 Agosto se recibe la estimación 02 y 03 por el trabajo ejecutado y confidenciales adicionales. y se reusa.

El día 24 Agosto se autoriza y se tramita para pago la estimación 02 y 03.

~~Int. José Puerto Forts Hdez~~
Residente de la Obra

~~Int. Jorge Luis~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

CTO-OP-MJAL-000TSM-025-2023

04 / Oct / 2023

NOTA: 25

En esta fecha se recibe la estimación 04 finiquito de confidenciales adicionales con todo sus documentos anexos.

A si mismo se autoriza para pago la estimación 04 finiquito de confidenciales adicionales.

~~Int. José Puerto Forts Hdez~~
Residente de la Obra

~~Int. Jorge Luis~~
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION
