



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/270/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
CALLE PRINCIPAL KM. 5.5 SIN NUMERO RA. ANACLETO
CANABAL 2DA. SECCIÓN. CENTRO, TABASCO. C.P.: 86280

PRESENTE:

Recibi invitacion
29 Mayo 2023
Maria Gabriela Pardo Cornelio
AT'N. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	3 de junio de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	90 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	23 de junio de 2023
Especialidad requerida	220 Terracerías y vialidades		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	martes, 6 de junio de 2023		



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRC. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/271/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.
EDIFICIO 12 DEPTO.: 201 COLONIA FOVISSSTE II C.P.:
86170 VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	3 de junio de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	90 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	23 de junio de 2023
Especialidad requerida	220 Terracerías y vialidades		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	martes, 6 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VELA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PÚLPITO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/272/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ

BERTINO MADRIGAL CAMELO No. 9 FRACC. INFONAVIT
COL. ATASTA DE SERRA C.P.: 86100 VILLAHERMOSA,
CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	3 de junio de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	5 de junio de 2023	09:00 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	90 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	23 de junio de 2023
Especialidad requerida	220 Terracerías y vialidades		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	martes, 6 de junio de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

CALLE PRINCIPAL K.M. 5.5 S/N., RCHIA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECC.,
CENTRO, TABASCO. C.P. 86280.

CORREO: costabasco@hotmail.com **R.F.C. COS14032026A**

Villahermosa, Tabasco; a 29 de mayo de 2023.

Asunto: Se acepta invitación.

C.Mtro. Rafael Ramón Morales.
Presidente del Comité de Obra.
Presente.



En atención a su invitación en el oficio No.: COPM/DLyPU/270/2023 de fecha 29 de mayo de 2023, para participar en el procedimiento de Contratación Bajo la Modalidad por: "Adjudicación Directa, de la siguiente obra:

Descripción de la Obra: I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.

Localidad: 005.- El Púlpito.

No. De Licitación: MJM-ADJ-R33-013-23

De la manera más atenta notifico a usted que me comprometo a la participación en dicha invitación, por lo que presentaré mi propuesta de acuerdo a las bases emitidas de la convocatoria correspondiente.

A t e n t a m e n t e

CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO S.A. DE C.V.

C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

ING. JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ

DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA No.: 779

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 29 DE MAYO DEL 2023

C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:

CARTA DE ACEPTACIÓN




EN RELACIÓN A LA INVITACIÓN DE FECHA: 29 DE MAYO DEL 2023, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. MJM-ADJ-R33-013-23, OBRA: I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero. DE LA LOCALIDAD: 0053.- El Púlpito., CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE: 90 DÍAS NATURALES.

POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUE EL: C. ING. JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ REPRESENTANTE LEGAL, DE LA EMPRESA JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ, ACEPTO PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE INVITACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA DE CARÁCTER ESTATAL, ASÍ MISMO ME COMPROMETO A PRESENTAR EL PAQUETE DE LICITACIÓN EL DIA SEÑALADO EN LA INVITACIÓN.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN LA JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL 2023.

SIN MÁS QUE AGREGAR, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



**CONSTRUCTORA FUMA
S.A. DE C.V.**

R.F.C. CFU-120418983

EDIFICIO 12, DEPTO. 201 COLONIA FOVISSSTE II,
VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO, C.P. 86170
Correo Electrónico: fuma.09@hotmail.com

JALPA DE MENDEZ, TABASCO A 29 DE MAYO DEL 2023.

C. MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA DEL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
PRESENTE:



POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN ATENSIÓN A SU OFICIO DE INVITACIÓN DE FECHA 29 DE MAYO DEL 2023 PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO NO. MJM-ADJ-R33-013-23 REFERENTE A: 10043.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO. LOCALIDAD: 0053.- EL PÚLPITO. ASÍ MISMO CONFIRMO NUESTRA ACEPTACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN, COMPROMETIÉNDONOS A ENTREGAR NUESTRA OFERTA EN TIEMPO Y FORMA.


SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS APRECIABLE ORDENES

CONCURSO NO.: MJM-ADJ-R33-013-23

OBRA: 10043.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

UBICACIÓN: 0053.- EL PÚLPITO.

ATENTAMENTE


C. ING. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RENACIMIENTO DEL PAÍS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/277/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
01:21 pm
08 JUN. 2023
REGISTRADO

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/276/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA

13.204

08 JUN. 2023

SECRETARÍA DE FINANZAS

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/279/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/278/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ
SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:


Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/280/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE


C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/274/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA
PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO
CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO
JOO. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLyPU/275/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 29 de Mayo de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (TABASCO)
AV. PASEO TABASCO No. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.
3035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14 de junio de 2023	10:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 3 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.
Localidad:	0053.- El Púlpito.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 10:00 hrs. a.m. del día sábado, 3 de junio de 2023 los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales serviran para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V. C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO	
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. C. FREDY ULISES MENDOZA AYALA	
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ C. JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	
SUPERVISOR DE OBRA C. ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PÚLPITO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-R33-013-23

Descripción de la obra: I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.

Localidad: 0053.- El Púlpito.

**LISTA DE ASISTENCIA DE VISITA DE OBRA
POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	<u>Maria Gabriela Pardo Cornelio</u>	
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	<u>Fredy Ulises Mendoza Ayala</u>	
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	<u>José Eduardo Cabrera Martínez</u>	



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a **lunes, 5 de junio de 2023**

Descripción de la obra:	I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.
Localidad:	0053.- El Púlpito.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 09:00 hrs. del día **lunes, 5 de junio de 2023** hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

No habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las 09:44 hrs. del día **Lunes 05 de Junio de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V. C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO	
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V. C. FREDY ULISES MENDOZA AYALA	
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ C. JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	
SUPERVISOR DE OBRA C. ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Depatamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	



Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-ADJ-R33-013-23

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.

02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadrada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: *Adjudicación Directa.*

Jalpa de Méndez Tabasco a miércoles, 14 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.
Localidad:	0053.- El Púlpito.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

Presupuesto Base con I.V.A.	\$	2,259,892.22
--------------------------------	----	--------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 10:30 hrs. del día Miercoles, 14 de Junio de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1.- CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
- 2.- JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ
- 3.- CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios", continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS

No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	\$1,909,608.90	90 Días Naturales
2.-	JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	\$1,938,636.84	90 Días Naturales
3.-	CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	\$1,920,323.48	90 Días Naturales

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Sabado, 17 de Junio de 2023. a las 10:00 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Página 2 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ

C. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.

Por los Invitados

Firma

C. Adelfo Morales Palma
Representante de la secretaría de la función Pública del Estado



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Modalidad: Adjudicación Directa.

No. De Licitación: MJM-ADJ-R33-013-23

Descripción de la obra: 10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.

Localidad: 0053.- El Púlpito.

**LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
POR LOS LICITANTES**

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	<u>Maria Gabriela Pardo Cornelio</u>	<u></u>
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	<u>Fredy Ulises Mendoza Ayala</u>	<u></u>
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	<u>Jose Eduardo Cabrera Martinez</u>	<u></u>



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"

LICITACION No: MJM-ADJ-R33-013-23

OBRA: 10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.

UBICACIÓN: 0053.- Ejido el Púlpito.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.				JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ				CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ULT-008A	LENERO Construcción de Muro de Retención y Ladrillos de 2.04 m x 1.22 m a base de estructura metálica con varillas y hormigón de prt de 2" (planchado cal. 15 lomo negro) cal. 23 ladrillos con auto albañilería con diseño, diseño de leyenda que incluye de pendientes excavación hasta un metro de profundidad y 1) capas de concreto (en 150 kg/m ³ de 30 x 80 x 100 cm para empalar malla metálica, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario, colado y acabado embudo a los muros en estructura y loma, hormigonada y mano de obra	m ²	1.0000	\$ 7,743.88	\$ 7,743.88	0.397%	\$ 7,106.84	\$ 7,106.84	-8%	0.372%	\$ 6,245.00	\$ 6,245.00	0%	0.4224%	\$ 6,702.19	\$ 6,702.19	-13%	0.346%
CCC-0271	PRELIMINARES Escribitorio en ambos sentidos del camino por medio mecánicos para un ancho promedio desplazando el material fuera de los hombros	km	0.5300	\$ 3,769.59	\$ 1,996.29	0.101%	\$ 4,356.66	\$ 2,628.78	34%	0.138%	\$ 3,797.81	\$ 2,012.64	2%	0.104%	\$ 3,494.58	\$ 1,952.13	-4%	0.046%
CCC-083	TERMINACIONES Excavación en cortes y adyacencias, abaje de la subestructura de los taludes, en relieves de la corona y/o de terraplenes reducidos	m ³	21.0000	\$ 66.48	\$ 1,396.08	0.072%	\$ 63.40	\$ 1,331.40	-5%	0.070%	\$ 706.514.77	\$ 1,024.28	-27%	0.055%	\$ 44.50	\$ 339.18	-53%	0.042%
CCC-012	Corte mecánica y excavación de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	25.7000	\$ 33.31	\$ 841.18	0.043%	\$ 37.58	\$ 947.02	15%	0.050%	\$ 28.86	\$ 727.27	-14%	0.038%	\$ 26.43	\$ 668.04	-21%	0.035%
CCC-004	Acero de malla para protección de taludes y cortes al primer taludante sobre caminos pavimentados, según sea la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m ² /km	25.7000	\$ 16.17	\$ 407.46	0.021%	\$ 18.50	\$ 400.20	14%	0.024%	\$ 19.24	\$ 484.85	19%	0.025%	\$ 19.10	\$ 483.50	19%	0.025%
CCC-013	Compactación de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavación adicional con equipo mecánico al novena por ciento (90%) M.V.S.M.	m ³	4.5000	\$ 29.11	\$ 134.15	0.007%	\$ 38.84	\$ 175.23	31%	0.009%	\$ 36.02	\$ 137.79	3%	0.007%	\$ 28.15	\$ 126.68	-6%	0.007%
CCC-019	Excavación, dragado y acondicionamiento con maquinaria (motobombardador, por aca) de la capa superior de la subestructura existente en cortes y terraplenes con estado con sustentabilidad y su posterior tendido y compactación al novena por ciento (90%) de su M.V.S.M.	m ³	277.6000	\$ 71.20	\$ 22,007.40	1.131%	\$ 50.89	\$ 10,530.83	-24%	0.882%	\$ 45.47	\$ 12,310.59	-41%	0.666%	\$ 39.00	\$ 11,869.12	-66%	0.618%
CCC-288	Formación y compactación de terraplenes de relleno para formar la subestructura con material de banco (arena), en las cortes en que se haya ordenado excavación adicional al novena por ciento (90%) de su M.V.S.M.	m ³	221.7300	\$ 266.09	\$ 59,445.03	3.257%	\$ 287.81	\$ 63,533.38	1%	3.543%	\$ 252.79	\$ 62,719.99	-1%	3.255%	\$ 275.11	\$ 61,082.02	-3%	3.212%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-013-23

OBRA: 10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.

UBICACIÓN: 0053.- Ejido el Púlpito.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.				JOSE EDUARDO CABRERA MARTINEZ				CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.			
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
CCC-016	m ³	450.0000	\$ 1,189.68	\$ 535,356.00	27.480%	\$ 1,305.17	\$ 614,326.50	15%	32.170%	\$ 1,403.36	\$ 631,512.00	18%	32.575%	\$ 1,596.04	\$ 626,218.05	17%	32.714%
CCC-010	ha	0.3100	\$ 3,962.32	\$ 1,228.28	0.080%	\$ 3,634.01	\$ 1,095.62	-11%	0.027%	\$ 2,083.76	\$ 645.97	-77%	0.033%	\$ 1,751.40	\$ 538.28	-50%	0.028%
CCC-028	L	4,812.5000	\$ 17.00	\$ 78,412.50	0.029%	\$ 14.51	\$ 66,927.36	-15%	3.565%	\$ 14.03	\$ 68,403.38	-13%	3.528%	\$ 14.72	\$ 67,660.00	-13%	3.535%
CCC-083A	m ²	24.0000	\$ 371.74	\$ 9,021.76	0.458%	\$ 475.32	\$ 11,410.08	28%	0.508%	\$ 427.97	\$ 10,271.26	15%	0.540%	\$ 407.07	\$ 9,709.05	10%	0.509%
CCC-019	ha	0.3000	\$ 3,952.22	\$ 1,185.76	0.061%	\$ 3,534.91	\$ 1,060.47	-11%	0.056%	\$ 2,083.78	\$ 625.13	-47%	0.032%	\$ 1,790.45	\$ 530.92	-35%	0.027%
CCC-030	L	3,600.0000	\$ 17.00	\$ 61,200.00	3.141%	\$ 14.51	\$ 52,296.00	-15%	3.735%	\$ 14.60	\$ 52,776.00	-14%	3.722%	\$ 14.51	\$ 52,356.00	-15%	3.720%
CCC-014.1	m ³	180.0000	\$ 4,952.38	\$ 893,330.40	45.955%	\$ 4,400.66	\$ 793,700.40	-11%	41.566%	\$ 4,545.39	\$ 816,170.20	-8%	42.203%	\$ 4,574.04	\$ 814,327.20	-9%	42.406%
CCC-118	ha	0.3000	\$ 3,952.32	\$ 1,185.76	0.081%	\$ 3,534.91	\$ 1,060.47	-11%	0.056%	\$ 2,719.51	\$ 815.88	-31%	0.042%	\$ 2,481.50	\$ 744.45	-37%	0.036%
CCC-030	L	3,600.0000	\$ 17.00	\$ 61,200.00	3.141%	\$ 14.51	\$ 52,296.00	-15%	2.735%	\$ 14.06	\$ 52,776.00	-14%	2.722%	\$ 14.51	\$ 52,356.00	-15%	2.720%
CCC-157	m ³	3,000.0000	\$ 38.28	\$ 114,840.00	8.975%	\$ 64.89	\$ 194,670.00	11%	10.184%	\$ 63.12	\$ 189,360.00	8%	9.708%	\$ 61.86	\$ 185,560.00	6%	9.004%
CCC-056	m	1,000.0000	\$ 21.94	\$ 21,640.00	1.120%	\$ 19.31	\$ 19,310.00	-17%	0.030%	\$ 16.60	\$ 16,600.00	-24%	0.005%	\$ 15.96	\$ 15,900.00	-27%	0.031%



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 17 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.		
Localidad:	0053.- El Púlpito.		
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	1,948,182.95

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$	1,948,182.95
Rango de Evaluación		
A).- Monto Máximo		\$1,938,636.84
B).- Monto Mínimo		\$1,909,608.90



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Diferencia (A - B): \$ 29,027.94
De donde: 1 X \$ 1,938,636.84 ÷ 10 : \$ 193,863.68
De donde: \$ 29,027.94 Menor que < \$ 193,863.68

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	\$ 1,909,608.90	Se considera solvente
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	\$ 1,938,636.84	Se considera solvente
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,920,323.48	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	lunes, 29 de mayo de 2023
Visita de Obra	sábado, 3 de junio de 2023
Junta de Aclaraciones	lunes, 5 de junio de 2023
Apertura de Propuestas	miércoles, 14 de junio de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

LICITANTE(S)	MOTIVO

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	\$ 1,909,608.90
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ	\$ 1,938,636.84
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.	\$ 1,920,323.48

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y al antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., Representada Legalmente por: MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.


Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

08.- **Lugar y fecha de elaboración.**

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

sábado, 17 de junio de 2023

Firma



Elaboro

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón

Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Página 3 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 17 de junio de 2023

Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.
Localidad:	0053.- El Púlpito.
No. De Licitación:	MJM-ADJ-R33-013-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 10:00 hrs. del día Sabado, 17 de Junio de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 10:00 hrs. DEL Sabado, 17 de Junio de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-ADJ-R33-013-23 RELATIVO AL PROYECTO: 10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero. LOCALIDAD: 0053.- El Púlpito.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Página 1 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.	90 Días Naturales	\$ 1'909,608.90 (Un Millón Novecientos Nueve Mil Seiscientos Ocho Pesos 90/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023
Descripción de la obra:	10043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.
Localidad:	0053.- El Púlpito.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

[Handwritten signatures and initials]

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V. PARA EL Martes, 20 de Junio de 2023. A LAS 10:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

6. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Martes, 20 de Junio de 2023. A LAS 14:40 HRS. EN EL AREA JURIDICA DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DDOOTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 10:43 hrs. DEL DÍA Sabado, 17 de Junio de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales

Página 3 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

C. Mtro. Cristian David Coronel Santos
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ
JOSÉ EDUARDO CABRERA MARTÍNEZ

C. FREDY ULISES MENDOZA AYALA
CONSTRUCTORA FUMA, S.A. DE C.V.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0043.- Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RED CARRETERA DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO, PARA LO CUAL SE LLEVARÁN ACABO LAS SIGUIENTES ACCIONES. DESORILLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, EXCÁVACION EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, BASE HIDRÁULICA, BARRIDO DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACION, RENIVELACIÓN ASFÁLTICA, TENDIDO DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO Y SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO Premezclado TIPO 3-A.

0053.- Ejido el Púlpito.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 20 de febrero de 2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **20-feb-23**

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero., a ejecutarse en: 0053.- Ejido el Púlpito., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo, presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10043	Construcción de camino con Mezcla Asfáltica en Tramo el Púlpito a Vicente Guerrero.	0053.- Ejido el Púlpito.	0.5 KM.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 2,259,892.22

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61501.- CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE	: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PROYECTO No.	: I0043
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: RAMO 33 FONDO III
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: ADJUDICACIÓN DIRECTA
No. DE LICITACION	: MJM-ADJ-R33-013-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023
FECHA	: 20 DE JUNIO DE 2023
OBRA	: I0043.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.
LOCALIDAD	: 0053.- EL PÚLPITO.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 0.50 KM.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 90 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 23 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 2'259,892.22 **(DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 22/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 2'215,146.32 **(DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 664,543.90 **(SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/238/2023.
FECHA	: 29 DE MAYO DE 2023.

CONTRATISTA	: CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
DOMICILIO	: CALLE PRINCIPAL KM. 5.5 SIN NUMERO RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. CENTRO, TABASCO. C.P.: 86280
REG. FED. DE CAUSANTES	: COS14032026A
REG. I. M. S. S.	: E7560646100
REG. INFONAVIT	: E7560646100
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-03938



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, “EL AYUNTAMIENTO”; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- I.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

SOCIAL., PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.

I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 FONDO III; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- EL C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 11,630, VOLUMEN (270) (DOSCIENTOS SETENTA), DE FECHA 08 DE ENERO DEL 2015, OTORGADA ANTE LA FE PÚBLICA DEL LICENCIADO LETICIA DEL CARMEN GUTIERREZ RUIZ, NOTARIO PUBLICO A LA NOTARIA PUBLICA NÚMERO 26 (VEINTISEIS) Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CETRO, ESTADO DE TABASCO. Y AL RESPECTO MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHO PODER NO LE HA SIDO REVOCADO NI MODIFICADO A LA FECHA. EL ADMINISTRADOR UNICO SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR (IFE) CON CLAVE DE ELECTOR NÚMERO PRCRGB92082627M600.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: CALLE PRINCIPAL KM. 5.5 SIN NUMERO RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. CENTRO, TABASCO. C.P.: 86280. CORREO: costabasco@hotmail.com MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

III.- LAS PARTES DECLARAN:



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR “EL CONTRATISTA”, LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: 10043.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO, UBICADO EN: 0053.- EL PÚLPITO. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2'215,146.32 **** (DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) ** INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).**

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 90 DIAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2023 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO MJM-ADJ-R33-013-23; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2023.

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ “EL

Handwritten marks: a large '9', an 'X', and a signature.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 30.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 664,543.90 **** (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.)****, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10%

5/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, “EL CONTRATISTA” SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 014790655047974277

TIPO DE CUENTA: CHEQUES

SUCURSAL: 0300 **NOMBRE DE LA SUCURSAL:** TABASCO 2000

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

“EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE “EL AYUNTAMIENTO” NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL CONTRATISTA” SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVEÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE “EL CONTRATISTA” DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE “EL AYUNTAMIENTO” EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO “EL CONTRATISTA” NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

9/17

Plaza.Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO”, PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUCTENTE; “EL CONTRATISTA” SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y “EL AYUNTAMIENTO” DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “EL AYUNTAMIENTO”, JUNTO CON “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

[Handwritten signatures and initials: G, Z, Q]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A “EL CONTRATISTA”, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

“EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI “EL CONTRATISTA” CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO". NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE "EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE "EL AYUNTAMIENTO" Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARA LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA", POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

- I. SI "EL CONTRATISTA", POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR "EL AYUNTAMIENTO".
- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS

14/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

[Handwritten signatures and initials]



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”.

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL “CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, “EL AYUNTAMIENTO” ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFACTORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

“EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE “EL AYUNTAMIENTO” DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA “EL CONTRATISTA” SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”, ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL AYUNTAMIENTO” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

“EL CONTRATISTA” DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

“EL CONTRATISTA” TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL AYUNTAMIENTO”.

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

“EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 20 DE JUNIO DE 2023.

FIRMAS

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”
C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO

C. CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO,
S.A. DE C.V.
ADMINISTRADOR UNICO

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023, DE LA OBRA: 10043.- CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO. LOCALIDAD: 0053.- EL PÚLPITO., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO. CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



CONTRATISTA CAMINOS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE CV
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

1 DE 2

OBRA:

10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:


CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023



ANTES


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE CV
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

2 DE 2

OBRA:

10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:


CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023



ANTES


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: COS14032026A

OBRA:

10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023



DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

2 DE 12

OBRA:


10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

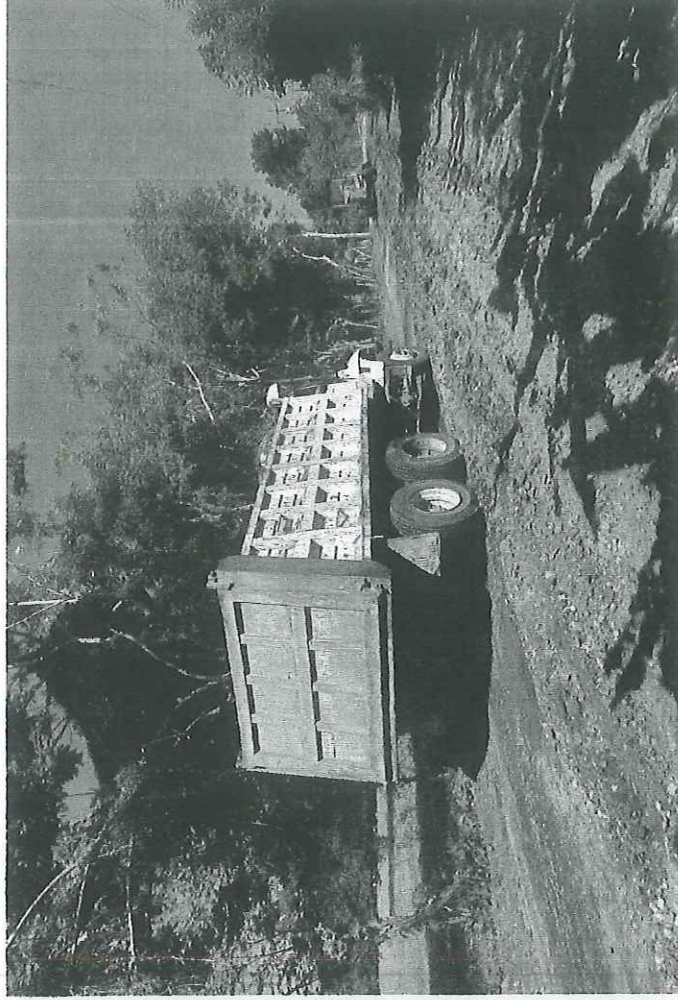

DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

3 DE 12

OBRA:

10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023



DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIMÉ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE
C.V.
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

5 DE 12

OBRA:



10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

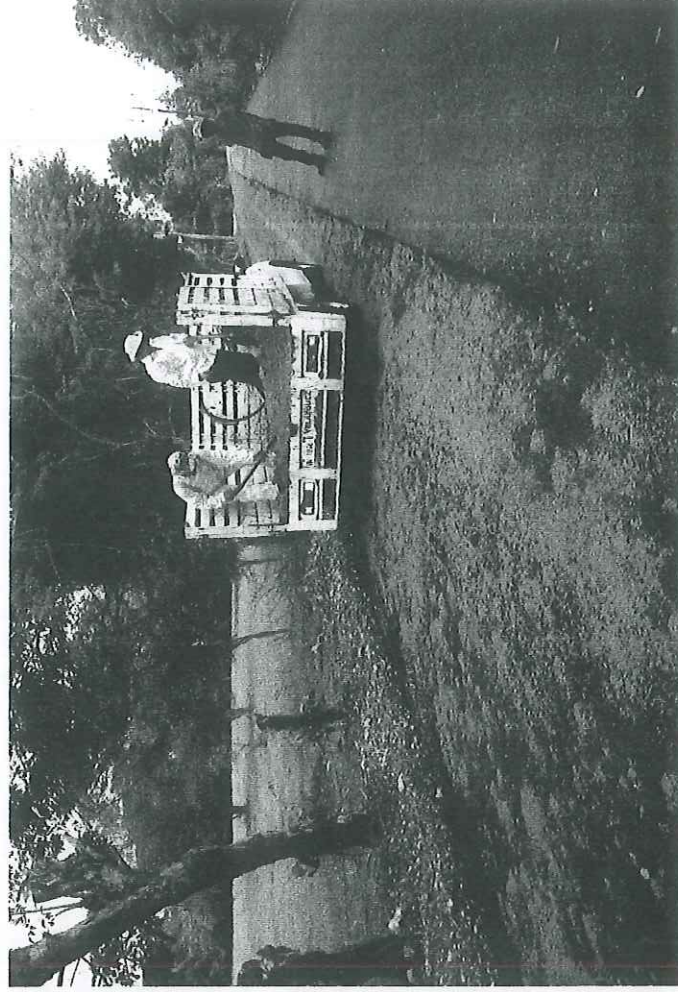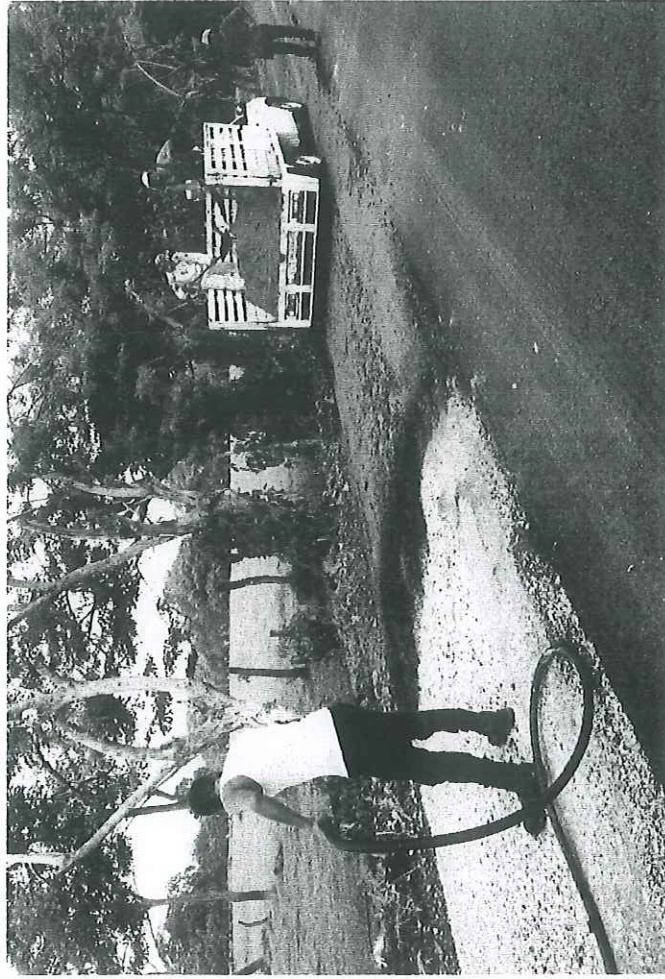

DURANTE



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

7 DE 12

OBRA:


10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

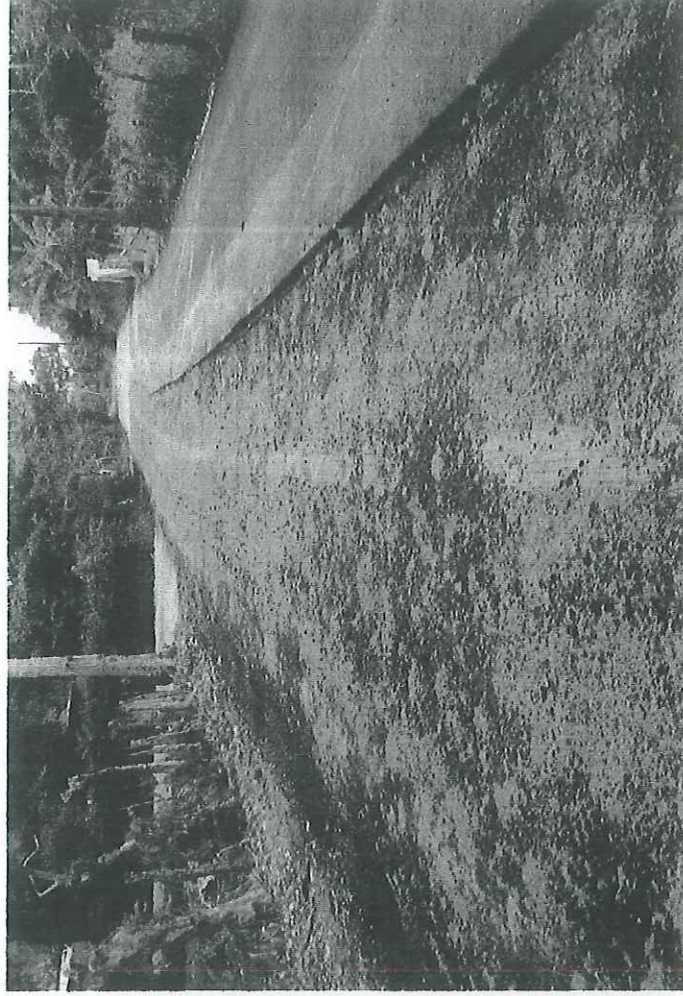

DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

9 DE 12



OBRA:

10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO: DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

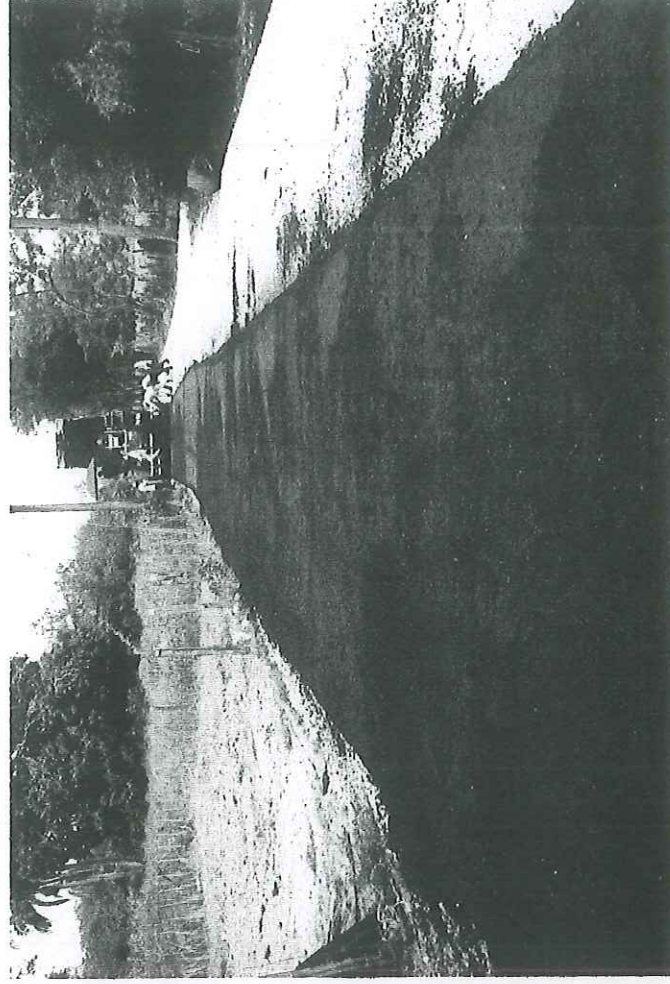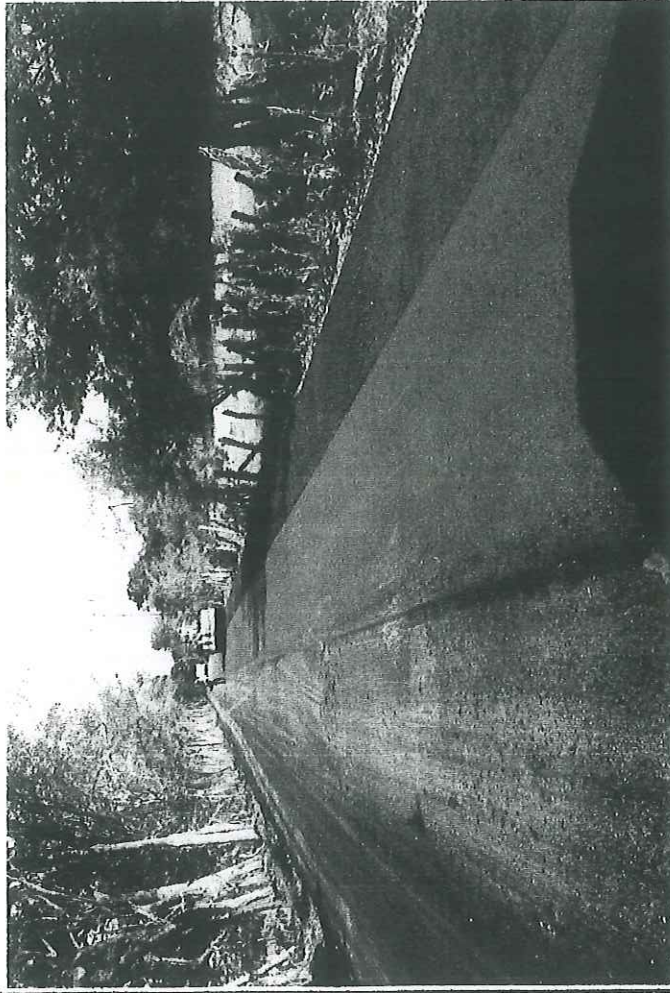

DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

10 DE 12

OBRA:



10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

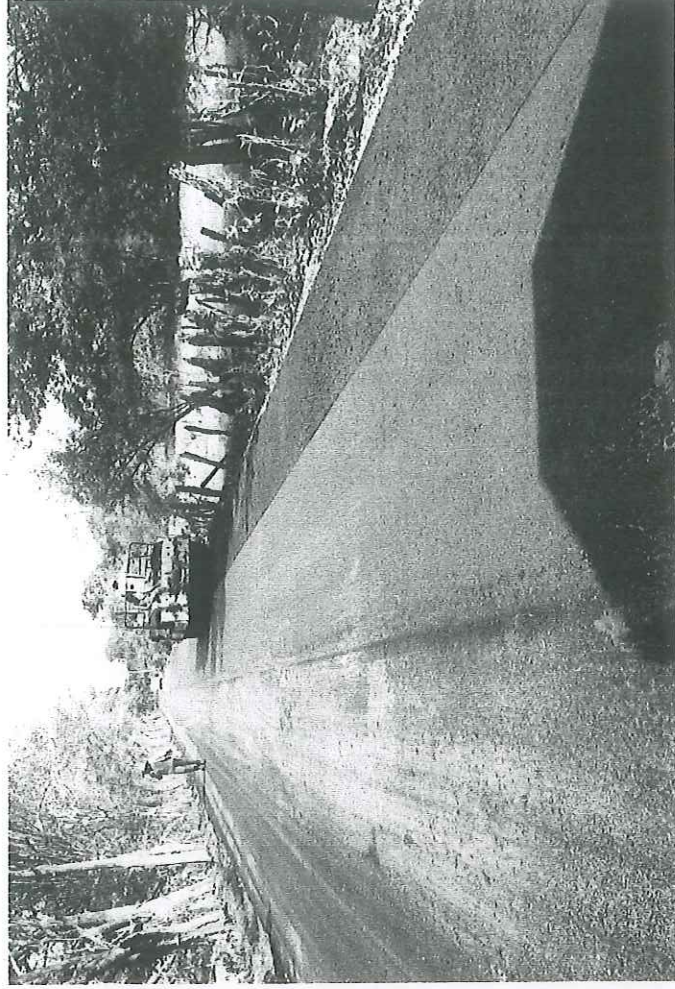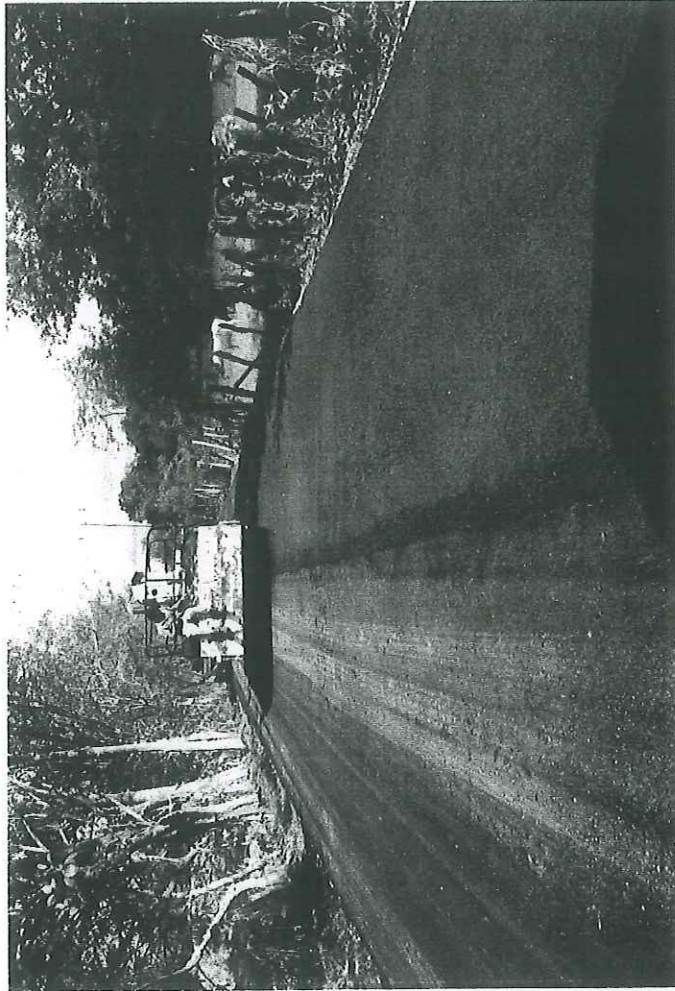

DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE
C.V. C.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

12 DE 12

OBRA:


10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

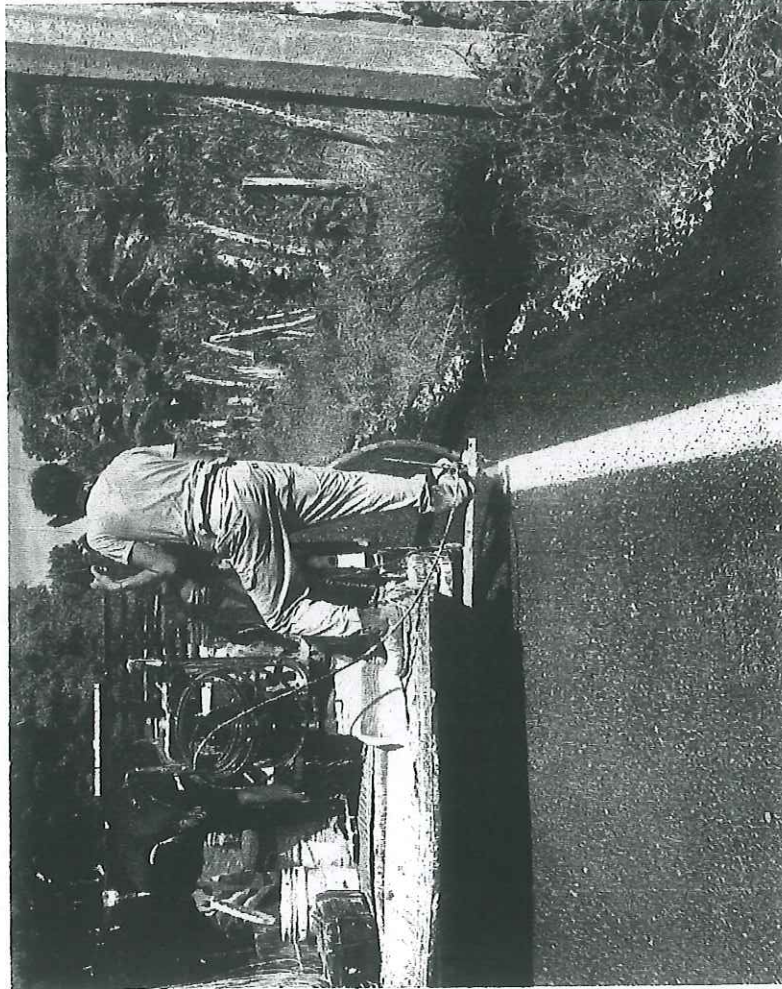

DURANTE

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

1 DE 2

OBRA:



10043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:


CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

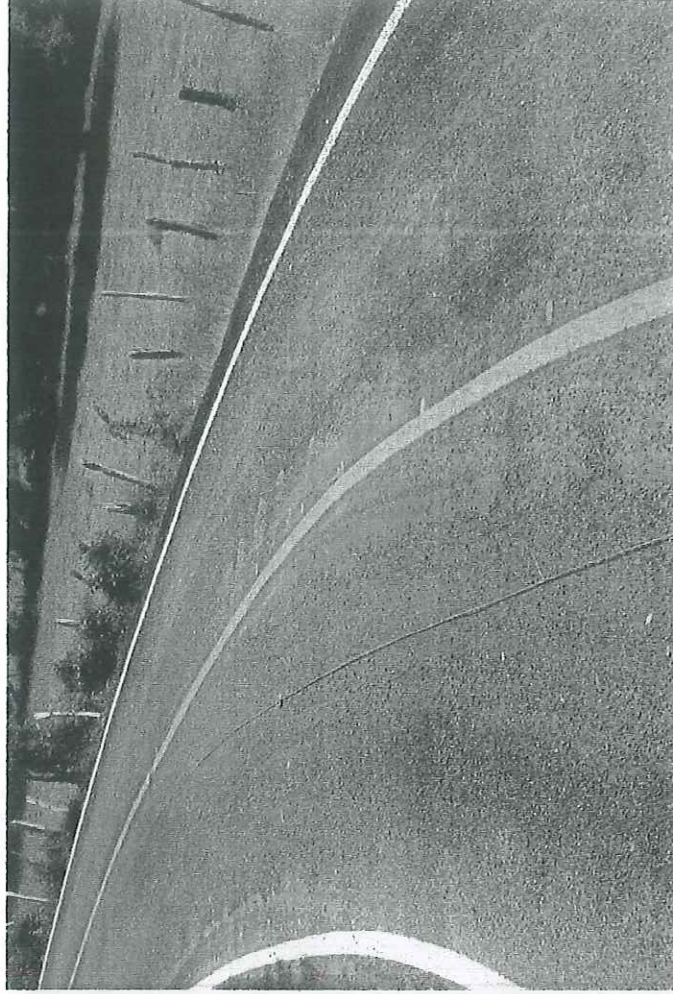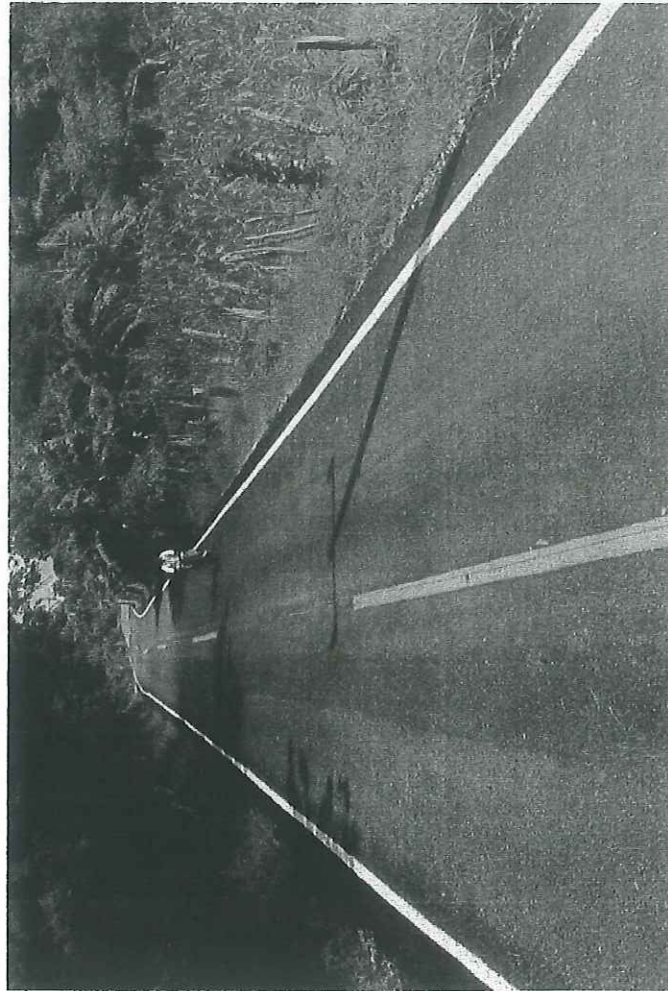

DESPUES


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



CONTRATISTA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE
R.F.C.: COS14032026A

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

2 DE 2

OBRA:



I0043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO:

CTO-OP-IMJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO:

DEL 23 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DE 2023

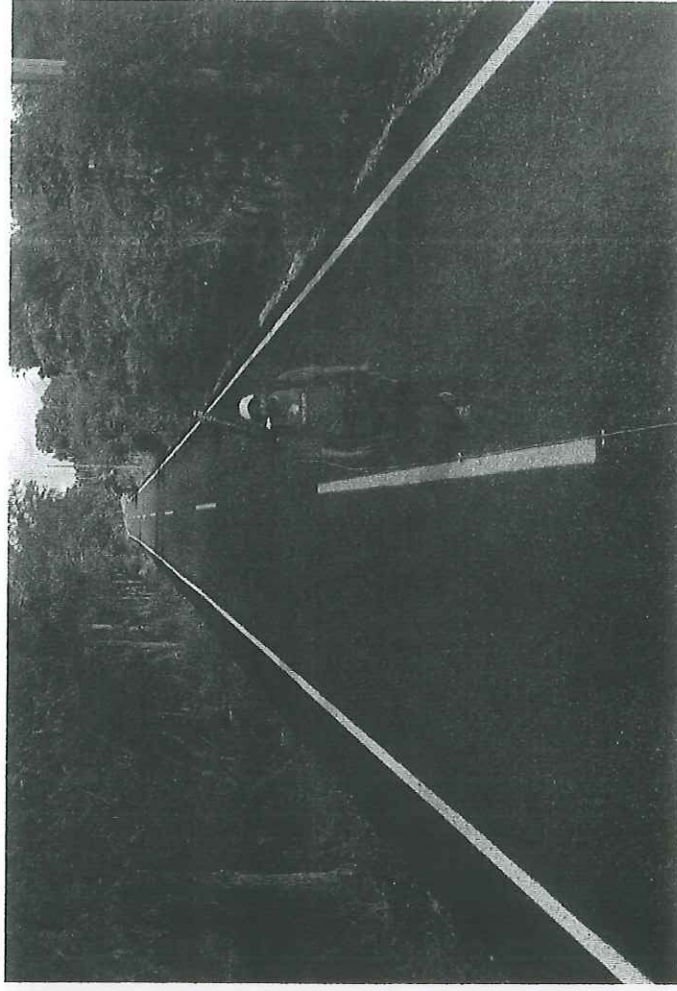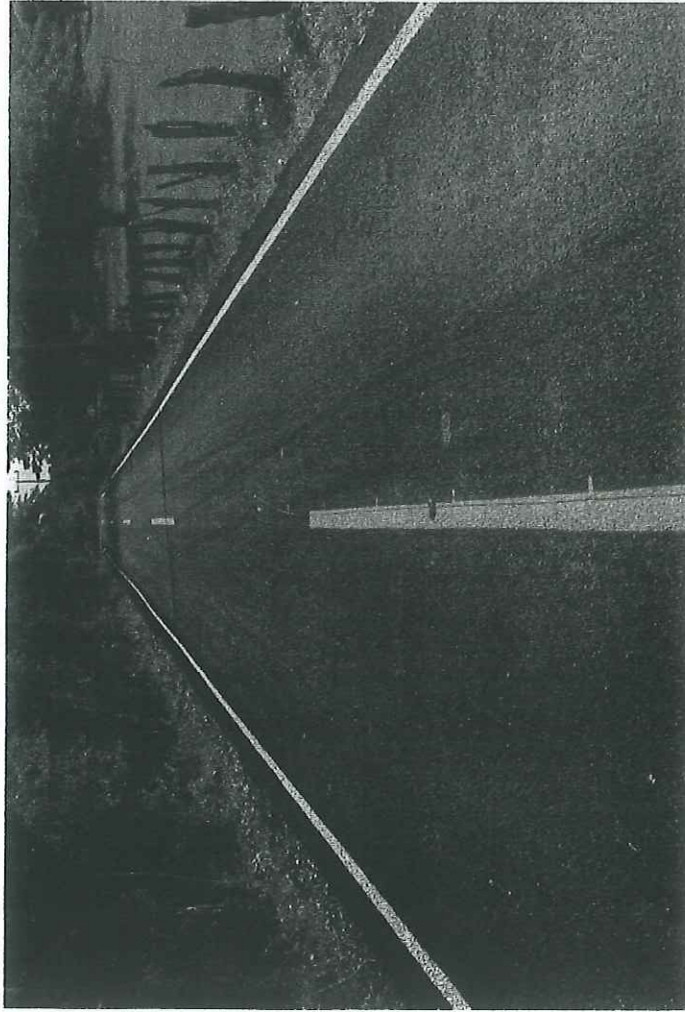

DESPUES

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

NOTA NO. 01 (UNO)	BITACORA DE OBRA,	FECHA DE FORMALIZACION.
TIPO DE NOTA: NOTA ESPECIAL		23 DE JUNIO DE 2023
CON ESTA FECHA Y EN CUMPLIMIENTO AL ART 95 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, SE ABRETIENDE LA PRESENTE BITACORA DE OBRA REFERENTE A LOS TRABAJOS DE LA OBRA 10043... CONSTRUCCION DE BARRIO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO AVILLENTE GUERRERO. CON NUMERO DE CONTRATO 070-OP-MPAL-016-2023		
DATOS GENERALES DE PROYECTO		
LOCALIDAD: 0053... EL PULPITO		
OBRA: 10043... CONSTRUCCION DE BARRIO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VILLENTE GUERRERO.		
PROYECTO: 10043		
NO DE CONTRATO: 070-OP-MPAL-00075M-016-2023		
OFICIO DE CASILDO:		
ORIGEN DE LOS RECURSOS: RANVO 33 FONDO 11		
PROGRAMA PRESUPUESTAL: K018- MEJORAMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION		
FECHA DE INICIO: 23 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACION: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
PLAZO DE EJECUCION: 90 DIAS NATURALES		
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA.		
MONTO CONTRATADO: \$ 2'215,146.32 (DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CINCO CUARENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.) INCLUYE I.V.A.		
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 664,543.90 (SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 90/100 M.N.) INCLUYE IVA.		
META		
DATOS DEL CONTRATISTA		
NOMBRE: CARNINDS, OBRAS, Y SERVICIOS TABASCO, S.A DE C.V.		
DOMICILIO: CALLE PRINCIPAL KM 5.5 SIN NUMERO. RA. ANAULETO CANABAL 2DA. SECCION, CENTRO, TABASCO, C.P. 86280		
REG. FED. DE CAUSANTES: COSITO 32026A		
REG. IMSS: E755 0646100		
REG. INFONAVIT: E7550646100		
REG. PADRON DE CONTRATISTA: SEP-RUC-03033		
NOMBRE DE LA AFIANZADOR:		
NO DE POLIZA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO		
NO DE POLIZA DE LA FIANZA DE ANTICIPO,		
NO DE TELEFONO.		

600002

DATOS DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOMBRE: FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ.
PROFESION: INGENIERO CIVIL.
DIRECCION: CALLE ADRIAL LOTE 7 MANZANA 29
BOLEONIA INDECO BO INDUSTRIAL.

CEDELA: 5673186
NO DE CEDELA: (993) 1365823
CORREO ELECTRONICO:

DATOS DEL RESIDENTE DE LA OBTEN

NOMBRE: JAIME HERNANDEZ VIRENEZ.
PROFESION: LICENCIATURA EN ARQUITECTURA.
DIRECCION: CALLE SAN ROMAN SIN VILLA JALAPA, VILLA DE VENEZ, TABASCO
CED. PROF. 2562054

NO DE CEDELA: 914 109 302
CORREO ELECTRONICO: herodminter@live.com.mx.

NOTA ELABORADA POR:

FIRMADA POR EMPRESERA CONTRATISTA

ABO. JAIME HERNANDEZ VIRENEZ.
RESIDENTE DE OBRA.

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

NO DE NOTA DE (OBS)

FECHA DE FORMULACION

TIPO DE NOTA: NOTA DE VERIFICACION

23 DE JUNIO DE 2023

- ESTA BITACORA DE OBRA SERA EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE FIRMAN EL CONTRATO NO. LTD-OP- MIAJ- OBTEN-011- 2023
- 1.- SE REGISTRAN POR AMBAS PARTES TODOS LOS ASUNTOS Y CUENTAS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
 - 2.- LA SIGUIENTE BITACORA QUEDA BAJO EL RESGUARDO DE LA RESIDENCIA DE LA OBRA DE LA CONTRATANTE Y SE HORARIO PARA CONSULTAR LAS NOTAS DE BITACORA SERA DE LAS 8:00 A LAS 16:00 HORAS
 - 3.- LAS FIRMAS Y EL DE CONDOMINIO DE LAS MISMAS, DEBERAN SER CON UN PLAZO NO MAYOR DE TRES DIAS, ACOMODANDO QUE EN CASO DE VERSE EL PLAZO PARA LA FIRMA DE LA NOTA, SE PARA POR ACEPTADA LA "O" LAS NOTAS REFERIDAS, LAS NOTAS PODRAN SER RECIBIDAS HASTA QUE ESTEN COMPLETAS Y FIRMADAS D EN SU CASO VERIDO EL PLAZO DE LA FIRMA, SE EFECTUA LA PROHIBICION DE MODIFICACION DE LAS NOTAS FIRMADAS.
 - 4.- LOS PLAZOS PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES Y NUMEROS GENERACIONES, SE HARAN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLASULA OBTEN DEL CONTRATO "FORMA DE PAGO" DEBIENDO EL CONTRATISTA PRESENTAR LA ESTIMACION DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DIAS PRECEDENTES A LA FECHA DE VORTE, ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 54 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

5.- LA CONTRATISTA SÓLO PODRÁ EJECUTAR OBTENCIONES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL PLANO ORIGINAL DE CONTRATO, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

6.- EL CONTRATISTA DEBERÁ OBEDECER LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALIZAN TRABAJOS PRECAMPANALES COMO EL DESORDE EN AMBOS HOMBROS DEL CAMINO, EN OBRAS DE TERRACERIAS SE REALIZAN CORTES ADICIONALES ABAJO DE LA SUBCANTANTE, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TERRENO NATURAL DESPUÉS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ESCANEO Y CORTES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLES, HASTA SU CONFORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA.

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: SE ENTREGA PLANO CONDIGNO DE LA PLANTA TOPOGRÁFICA, TALLAS Y SECCIONES DEL CAMINO AL RESIDENTE DE LA CONTRATISTA QUE DEBE.

NOTA LIGA POR

FIRMADO POR EMPRESA CONTRATISTA

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING FRANCISCO DE RAÚL PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

NO DE NOTA 03 (TRES)
TIPO DE NOTA: ENTREGA DEL
INMUEBLE.

FECHA DE FORMULACIÓN
23 DE JUNIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE ENTREGA EL INMUEBLE INDICANDO LOS PUNTOS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE TRAMO DE LA OBRA ENTREGA EL ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ (RESIDENTE) Y PEREZ EL ING FRANCISCO DE RAÚL PEREZ (SUPERINTENDENTE)

NOTA ELABORADA POR

FIRMADO POR LA CONTRATISTA

ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING FRANCISCO DE RAÚL PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

OBRA: 10043. CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO

CONTRATO NO. CTD-OP-4 JUL-DOOT504-016-2023
DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023

NO DE NOTA: 04 (CUATRO)
TIPO DE NOTA: INICIO DE OBRA.

FECHA DE FORMULACION:
23 DE JUNIO/2023

CON ESTA FECHA SE DA INICIO A LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO EN CUESTION DE LA OBRA 10043 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.

NOTA CREADA POR

FIRMA POR LA PRESIDENCIA

ING FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

ARQ. NATALIE HERNANDEZ SIMON
PRESIDENTE DE OBRAS.

NO DE NOTA: 05 (CINCO)
TIPO DE NOTA: REPORTE ACTIVIDADES

FECHA DE FORMULACION
27 DE JUNIO DE 2023

CON ESTA FECHA 27 DE JUNIO DE 2023, EL ING HERNAN HERNANDEZ HERNANDEZ, (SUPERINTENDENTE) INFORMA QUE SE ESTA REALIZANDO EL DESORILLE CON DOS EQUIPOS DE MAQUINARIA PESADA DE MOTOR FORMADORA CARTERPILLER, A PARTIR DEL KM 0+000 PUNTO DE ARRANQUE O DE INICIO, ASI MISMO SE AVISA QUE SE TIENEN 2 FRENTES DE TRABAJOS, CON EL PROPOSITO DE TERMINAR LOS TRABAJOS EN EL MENOS TIEMPO POSIBLE YA QUE SE TIENEN PRONOSTICOS DE LLUVIAS INTENSAS.

NOTA CREADA POR

FIRMA POR LA PRESIDENCIA

ING FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE.

ARQ. NATALIE HERNANDEZ SIMON
PRESIDENTE.

OBRA: 10043. CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO NO. 070-OP-MVAL-D007SM-016-2023
DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023.

NO DE NOTA: 06 (SEIS)

FECHA DE FORMULACION
30 DE JUNIO /2023

TIPO DE NOTA: REPORTE DE ACTIVIDADES

CONTENIDO.

EN ESTA FECHA 30 DE JUNIO DE 2023, SE CONTINUAN CON LAS TRABAJOS DE DESORIBE Y SE DA INICIO A LA CONSTRUCCION DE LAS TERRACERAS CON EL COMPACTADO DE LA SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL, DESPUES DE HABER TERMINADO EL TRAMO INICIAL APROXIMADO AL KM 0+500 DE PORTE ADICIONAL CON LA MOTORCOMPACTADORA. SE REALIZA LA CARGA Y DESCARGO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

NOTA ORADA POR

FIRMA POR LA DEPENDENCIA

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ.
SUPERINTENDENTE DE CONST.

ABD. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE.

NO DE NOTA: 07 (SETE)

FECHA DE FORMULACION
03/ JULIO DE 2023

TIPO DE NOTA: ACTIVIDADES DIARIAS

ENTREGA PEREPCION DE NUMEROS GENERADORES.

CONTENIDO

SE CONTINUA CON LA COMPACTACION DE LA BAMA DE LOS CORTES EN QUE SE HAYA ORDENADO LA EXCAVACION. ASI MISMO CON FECHA 03 DE JULIO/23 SE RECIBI DEL CONTRATISTA, LOS NUMEROS GENERADORES, RELATIVO A LA ESTIMACION DE TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE JUNIO /2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023 A COMPANADO DE LA DOCUMENTACION SOPORTE, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION O EN SU CASO PARA SU DEVOLUCION POR ERROR.

NOTA ORADA POR

FIRMA POR LA EMPRESA CONT

ABD. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE.

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

OBRA: 10043.- CONSTRUCCION DE LARIND CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO AVIENTE GUERRERO


CONTRATO NO: ETO-OP-MUAL-016-2023
DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023


FECHA DE FORMALIZACION
05 DE JULIO 2023

NO. DE NOTA: 08 (OCHO).

TIPO DE NOTA: APROBACION DE LOS NUMEROS GENERADORES

CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2023, SE APRUEBAN LOS NUMEROS GENERADORES 01 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS CORRESPONDIENTE AL AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NOTA LEIDA POR 

FIRMADA POR EMPRESA CONTRATISTA 

ABO. ARMANDO HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE.

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

NO DE NOTA 09 (NUEVE).

FECHA DE FORMALIZACION


TIPO DE NOTA: ENTREGA DE ESTIMACION.

06 DE JULIO DE 2023

CONTENIDO.

CON FECHA 06 DE JULIO DE 2023, SE PRESENTA LA ESTIMACION 01 (UNO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO /2023, DE TRABAJOS EJECUTADOS, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION O EN SU CASO PARA SU CORRECCION, A LA RESIDENCIA DE OBRA. H. AYUNTAMIENTO DE VALPA DE MENDEZ, DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS (00075M).

NOTA LEIDA POR 

FIRMADA DE PENDERGIA 

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONST.

ABO. ARMANDO HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE.

OBRA: 10043 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO No. CTO-OP-MIAL-D.00TSM-016-2023

No. NOTA 10 (DIEZ)

08 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONCLUYERON EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA, COMPACTADO AL 95%; CON ESTA FECHA SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE RIEGO DE IMPREGNACION DE LA BASE HIDRAULICA, AL TERMINO DEL MISMO SE REALIZA EL POREO DE BASE HIDRAULICA CON ESTA MISMA SE A REALIZA LA VISITA DEL DRO EL CUAL REALIZA LA VERIFICACION DE LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,

NOTA REALIZADA POR

ING. FRANCISCO DELA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARG. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

No. DE NOTA 11 (ONCE)

10 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE DE BASE HIDRAULICA IMPREGNADA Y POREADA PARA EL PROCESO DE RIEGO DE LIGA DE PARA EL PROCESO DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL PETRO DE 1/2" A PINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG 64-22 COMPACTADO AL 95%; SE UTILIZA LA MAQUINARIA NECESARIA Y SE IMPLEMENTA EL DOBLE DE FUERZA DE TRABAJO PARA LA PRONTA TERMINACION DE LOS TRABAJOS PARA EVITAR LA TEMPORADA DE LLUVIAS.

ING. FRANCISCO DELA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARG. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA: T0043 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

No. DE NOTAS 12 (DOCE)

12 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE RIEGO DE LIGA PARA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO DE VEA FINOS EL CUAL ES TENDIDO Y COMPACTADO AL 95%; CON ESTA MISMA FECHA EL PRO VERIFICA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON ESTA MISMA FECHA SE SOLICITA AUTORIZACION DE EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES.

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARG. JAIME MERVANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA.

No. DE NOTA: 13 (TRECE)

14 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE, RIEGO DE LIGA PARA CARPETA, SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO PG-64-22 COMPACTADO AL 95%, SE CONTINUA IMPLEMENTANDO EL DOBLE DE FUERZAS DE TRABAJO PARA TERMINAR LOS TRABAJOS ANTES POSIBLE; CON ESTA MISMA FECHA SE AUTORIZA LA EJECUCION DE CANTIDADES ADICIONALES.

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARG. JAIME MERVANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA.


OBRA: 0043 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.


CONTRATO No. : CTO-OP-MJAL-DOTSM-076-2023

No. DE NOTA: 14 (CATORCE).

15 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DEL RIZGO DE LIGA PARA CARPETA EL CUAL SE SUMINISTRA, TIENDE Y COMPACTA AL 95% LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CON MATERIAL PETREO DE V^o A FINOS; SE UTILIZA EL EQUIPO ADECUADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y SE LLEVA EL CONTROL DE CALIDAD DEL MISMO; SE HACE MENCIÓN QUE CON ESTA MISMA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DEL TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA Y VERIFICADOS POR EL ORO.



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE
CONSTRUCCION



ARQ. JAIME HERNANDEZ
JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

No. DE NOTA: 15 (QUINCE)

19 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE DE LA CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE PARA DAR INICIO AL TRABAJO DE SUMINISTRO Y APLICACION DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO CON EQUIPO COMPUTANZADO (MACROSELLADORA) EL CUAL ES TENDIDO Y COMPACTADO CON MAQUINARIA PESADA; ESTOS TRABAJOS SON VERIFICADOS POR EL ORO Y POR LA RESIDENCIA DE OBRA.


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE


ARQ. JAIME HERNANDEZ
JIMENEZ


OBRA: 10043 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.


CONTRATO No.: CIO-OP-MOAZ-DOOTSM-016-2023

No. DE NOTA: 16 (DIECISIS)

21 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE HACE ENTREGA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA ESTIMACION 02 (005) TRABAJOS EJECUTADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 19 DE JULIO DE 2023, PARA SU REVISION Y AUTORIZACION.



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. JAIMÉ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

No. DE NOTA: 17 (DIESIETE)

25 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE DE LA CARPETA PARA EL PROCESO DE TENDIDO Y COMPACTADO DE SELLO PREMELCIADO SINCRONIZADO CON EQUIPO COMPUTALIZADO, UTILIZANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA SU CARPETA EJECUCION.


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. JAIMÉ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

OBRA 10043 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

No. DE NOTA: 18 (DIESECHOCHO)

28 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE PARA EL SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE SELLO PRIMERCLASO SIN CRONIZADO COMPTANIZADO EL CUAL ES VERIFICADO POR EL LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD. Y POR EL PRO.

ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARO. JAIME HERNANDEZ
JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

No. DE NOTA 19 (DIECINUEVE).

31 DE JULIO DE 2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA QUE SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE PARA APLICACION DE PINTURA DE RAYAS CENTRAL DE COLOR AMARILLO Y RAYA LATERAL STENCILLA CONTINUA DE COLOR BLANCO PARA FOOD TIPO DE CLIMA APLICANDO EL EQUIPO ADECUADO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A LO INDICADOS EN EL PROYECTO.

ING. FRANCISCO DE LA
CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION

ARO. JAIME HERNAN-
DEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA.


OBRA: 10043. - CONSTRUCCION DE CAMINO CON
MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A
VICENTE GUERRERO.


CONTRATO No. CTO-OP-MIAL-DOOTSM-016-2023

No DE NOTA: 20 (VENTE)

03/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LE INFORMA A LA RESI-
DENCIA DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA
DE MENOR DE ACORDO A LO INVOCADO POR LA
SUPERVISION DE LA COLOCACION DE LETRERO
ALUSIVO DE OBRA CON EL MONTO TOTAL EJERCIDO.
DE IGUAL MANERA SE REALIZA UN RECORRIDO
CON EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA PARA
VERIFICAR LA CORRECTA DIRECCION DE LOS TRABAJOS



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ
PEREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ARQ. JAIME HERNANDEZ
JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA.

No. DE NOTA: 21 (VEINTIUNO)

05/AGOSTO/2023

CON ESTA FECHA SE LE HACE ENTREGA DE LA
ESTIMACION No. 03 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JULIO AL
31 DE JULIO DE 2023, PARA SU REVISION Y AUTO-
RIZACION.


ING. FRANCISCO DE LA
CRUZ PEREZ
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCION


ARQ. JAIME HERNANDEZ
JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA


OBRA: 10043 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

No. DE NOTA: 22 (VEINTIDÓS)

07 / AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO PARA LA TERMINACIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO PREMEZCLADO SINCRONIZADO CON EQUIPO COMPUTARIZADO Y TERMINACIÓN DE DETALLES DE APLICACIÓN DE PINTURA EN RAYAS LATERALES Y RAYAS CENTRALES DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA RESIDENCIA DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y VERIFICADOS POR EL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ
PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

No. DE NOTA: 23 (VEINTITRÉS)

10 / AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE INFORMA QUE SE CONTINÚA CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA GENERAL DEL CAMINO DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DE LA SUPERVISIÓN, CON MISMA, SE CONCLUYE EN SU TOTALIDAD, LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO DE ACUERDO AL PROYECTO.


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA


OBRA: 10043 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.


CONTRATO No: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

No. DE NOTA: 24 (VEINTICUATRO)

12 / AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA SE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE LA COLOCACION DEL LETRERO ALUSIVO A LA OBRA MEDIDAS DE 2.44M x 1.22M A BASE DE ESTRUCTURA METALICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL 16, LAMINA NEGRA CAL 22 INCLUYE: VINIL AUTO ADHERIBLE CON DISEÑO, ROTULO DE LEYENDA QUE INDIQUE DEPENDENCIA, EXCAVACION HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD Y 2 DADOS DE CONCRETO $f'c = 150 \text{ KG/CM}^2$ DE $30 \times 30 \times 100 \text{ CM}$ PARA EMPOTRAR MARCO METALICO, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METALICA, APLICACION DE PRIMARIO ROJO OXIDO Y ACABADO ESMALTE A DOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; EL CUAL ES COLOCADO EN EL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

No. DE NOTA: 25 (VEINTICINCO)

16 / AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA Y ESTA NOTA, SE LE INFORMA A LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2023 SE HAN TERMINADO AL 100% LOS TRABAJOS CONTRATADOS Y CONVENIDOS DE LA OBRA ANTES MENCIONADA POR TAL RAZÓN SOLICITO LA REVISION FISICA DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR ENTREGA-RECEPCION.


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN


ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA


OBRA: 10043 - CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN TRAMO EL PULPITO A VICENTE GUERRERO.


CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

No. DE NOTA: 26 (VEINTISEIS)

16 / AGOSTO / 2023

CON ESTA FECHA SE ENTREGA ESTIMACIÓN N. 04 (CUATRO) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2023, PARA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN ACOMPAÑADA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: BORRADOR DE FACTURA, CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, CRUVIS, ALBUM FOTOGRÁFICO Y NOTAS DE BITACORA.



ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN



ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

No DE NOTA: 27 (VEINTISIETE)

30 / AGOSTO / 2023

CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2023 SE LLEVA A CABO EL CIZARE DE LA PRESENTE BITACORA, DANDO POR TERMINADOS LOS TRABAJOS, QUE AM- PARAN, LOS CUALES FUERON CONCLUIDOS EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2023, VERIFICADOS EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2023, Y RECIBIDOS FISICAMENTE EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.


ING. FRANCISCO DE LA CRUZ PÉREZ
SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION


ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD:001 JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. SE ENCUENTRAN EL ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; ING. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO (ADMINISTRADOR UNICO); PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
	Letrero		
LET-OBRA	Construcción de letrero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de ptr de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² . de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1.00
	Preliminares		
CCC-027.1	Desorille en ambos hombros del camino por medios mecánicos para un ancho promedio, depositando el material fuera de los hombros del camino	km	0.53
	Terracerías		
CCC-033	Excavación en cortes y adicionales abajo de la subrasante, en ampliaciones de corte, en abatimiento de taludes, en rebajes de la corona y/o de terraplenes existentes	m ³	21.00
CCC-012	Carga mecánica a camión volteo, de material producto de cortes y excavaciones de terreno	m ³	25.20
CCC-004	Acarreo de material producto de excavaciones y cortes al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m ³ /km	25.20
CCC-013	Compactación de la cama de los cortes en que se haya ordenado excavación adicional con equipo mecánico al noventa por ciento (90%) M.V.S.M.	m ³	4.50
CCC-099	Escarificación, disgregado y acamellonado con maquinaria (motoconformadora), por alas de la capa superior de la subrasante existente en cortes y terraplenes construidos con anterioridad y su posterior tendido y compactación al noventa por ciento (90%) de su M.V.S.M.	m ³	297.00
CCC-288	Formación y compactación de terraplenes de relleno para formar la subrasante con material de banco (arena), en los cortes en que se haya ordenado excavación adicional al noventa por ciento (90%) de su M.V.S.M.	m ³	403.28
CCC-016	Construcción de base hidráulica empleando material pétreo triturado, grava de 38 mm (1 1/2") a finos, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su P.V.S.M.	m ³	450.00
	Pavimento Asfáltico		
CCC-010	Barrido de la superficie por tratar por medios mecánicos, para recibir riego de impregnación	ha	0.31
CCC-028	Emulsión asfáltica empleada en riegos de impregnación (base hidráulica, emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L	4,612.50
CCC-061A	Arena para cubrir base impregnada (poreo) P.U.O.T. (N.CTR.CAR.1.04.004/15).	m ³	24.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

CCC-010	Barrido de la superficie por tratar por medios mecánicos, para recibir riego de impregnación	ha	0.30
CCC-030	Emulsión asfáltica empleada en riegos de liga (sobrecarpeta y carpeta, emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L	3,600.00
CCC-014.1	Construcción de carpeta con concreto asfáltico en caliente con material pétreo (grava de 13 mm 1/2" a finos) y cemento asfáltico PG 64-22 compactada al noventa y cinco por ciento (95%), incluye el costo del cemento asfáltico	m³	180.00
CCC-118	Barrido de la superficie por tratar por medios mecánicos, para recibir riego de liga	ha	0.30
CCC-030	Emulsión asfáltica empleada en riegos de liga (sobrecarpeta y carpeta, emulsión asfáltica catiónica de rompimiento medio de alta viscosidad ECM-65)	L	
CCC-157	Suministro y aplicación de sello premezclado sincronizado con equipo computarizado, incluye: emulsión asfáltica de rompimiento rápido modificada con polímero tipo I alta viscosidad para riego de liga, sello 3-A premezclado con asfalto PG 64-22	m²	3,000.00
	Señalamiento		
CCC-096	Raya lateral sencilla continua de 10 cm de ancho, con un espesor húmedo de 21 milésimas de pulgada (0.5334 mm) con pintura para tráfico 100% acrílica base agua color blanco para todo clima (AWP) marca 3M o similar, con microesferas de vidrio (0.262 kg/m²) y elementos cerámicos (0.109 kg/m²) aplicados con equipo	m	1,000.00
CCC-049	Raya central sencilla continua o discontinua de 10 cm de ancho, con un espesor húmedo de 21 milésimas de pulgada (0.5334 mm) con pintura para tráfico 100% acrílica base agua color amarillo para todo clima (AWP) marca 3M o similar, con microesferas de vidrio (0.262 kg/m²) y elementos cerámicos (0.109 kg/m²) aplicados con equipo	m	500.00

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	23 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	20 de septiembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION :	90 DIAS NATURALES
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 2,259,892.22
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 2,215,146.32
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$ 2,215,144.75
FIANZAS	
No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	2802834
EMPRESA AFIANZADORA:	SOFIMEX
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	20/06/2023
No. DE FIANZA DE ANTICIPO:	2802837
EMPRESA AFIANZADORA:	SOFIMEX
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	20/06/2023
No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS:	2828600
EMPRESA AFIANZADORA:	SOFIMEX
FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:	30/08/2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO:

23 de junio de 2023

FECHA DE TERMINACION REAL:

15 de agosto de 2023

RELACION DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 812,632.71	\$ 243,789.81
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 1,074,770.33	\$ 322,431.10
EST. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 258,906.75	\$ 98,322.99
EST. 4 (CUATRO) FINIQUITO, TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES.	\$ 68,834.96	\$ -
	\$ 2,215,144.75	\$ 664,543.90

LA CONTRATISTA ENTREGA A ESTE H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001 JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DE 2023.

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
ADMINISTRADOR UNICO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO; ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRAS DEL AYUNTAMIENTO; C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO, ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA CAMINOS, OBRAS Y SERVICIOS TABASCO, S.A. DE C.V.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023		
FECHA DE FORMALIZACION:	29-may-2023		
OBJETO DEL CONTRATO:	I0043.-CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN TRAMO EL PÚLPITO A VICENTE GUERRERO.		
MONTO AUTORIZADO:	\$	2,259,892.22	
MONTO CONTRATADO:	\$	2,215,146.32	
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$	-	
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	90 DIAS NATURALES		
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	23-jun-23		
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	20-sep-23		
FECHA DE TERMINACION REAL:	15-ago-23		

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	06-jul-23	DEL	23/06/2023	AL	30/06/2023	\$ 812,632.71	\$ 812,632.71
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	21-jul-23	DEL	01/07/2023	AL	15/07/2023	\$ 1,074,770.33	\$ 1,887,403.04
EST. 3 (TRES) TRABAJOS EJECUTADOS	05-ago-23	DEL	16/07/2023	AL	31/07/2023	\$ 258,906.75	\$ 2,146,309.79
EST. 4 (CUATRO) FINIQUITO, TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES.	16-ago-23	DEL	01/08/2023	AL	15/08/2023	\$ 68,834.96	\$ 2,215,144.75

9



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA 2828600 SOFIMEX PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-016-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

ING. MARIA GABRIELA PARDO CORNELIO
ADMINISTRADOR UNICO
