



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

LOCALIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

10050

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** Bacheo de Pavimento Asfaltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

**PROYECTO:** 10050

61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL  
**PARTIDA** ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y  
TELECOMUNICACIONES.

**LOCALIDAD:** 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 106.2 M2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



**2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO**

## REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

### CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$28,195.81

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$28,195.81

### METAS

UNIDADES DE MEDIDA: M2

TOTALES DE PROYECTO: 106.20

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 10-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 04-ago-23

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_

PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION: {

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

**Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( ) EN PROCESO: ( ) AMPLIACION: ( )
REHABILITACION: ( X ) COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 887 hombres y 894 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

INICIO : 10-jul-23

CANTIDAD: 106.20

TERMINO : 04-ago-23

UNIDAD: M2

PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						
<b>CAPITULO: 24901.- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.</b>						\$18,776.73
JCEMULROMMED	EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (RM-2K) (ECM 62-20)	TON	0.16	\$ 9,478.91	\$	1,509.71
MEZCLA FIO	Mezcla Asfáltica en Frío, Arena-Emulsión Para Carpeta Asfáltica	m³	10.62011	\$ 1,625.88	\$	17,267.02
<b>CAPITULO: 24701.- Artículos Metalicos para la Construcción.</b>						\$ 5,530.00
DISCO-AUSTRODIAR	DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CONCRETO 14 PULGADAS AUSTROMI	PZA	2.00	\$ 2,765.00	\$	5,530.00
<b>Total de Materiales</b>						\$24,306.73
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						\$0.00
<b>Total de Mano de Obra</b>						\$ -
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>						\$ -
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>						\$ -
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>						\$ 24,306.73

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOUTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 10-jul-23

TERMINO: 04-ago-23

PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

CANTIDAD: 106.20

UNIDAD: M2

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	Jul.-23	ago.-23	
BACHEO-MEZ-FRIO-01	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSIÓN PARA CARPETA ASFÁLTICA.	M3	10.62	\$ 17,266.85	\$ 14,611.21	\$ 2,655.64	
BACHEO-EMUL-ECM-6	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD ECM-62.	LT	159.27	\$ 1,509.88	\$ 1,277.66	\$ 232.22	
DISCO-DIAM-14"	SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO.	PZA	2.00	\$ 5,530.00	\$ 4,679.49	\$ 850.51	
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**							

SUBTOTAL: \$ 24,306.73 \$ 20,568.36 \$ 3,738.37  
 16% IVA: \$ 3,889.08 \$ 3,290.94 \$ 598.14  
 TOTAL: \$ 28,195.81 \$ 23,859.30 \$ 4,336.51  
 PARCIAL: 84.62% 15.38%  
 ACUMULADO: 84.62% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
 ANALISTA DE OBRAS

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023  
 F. DE INICIO PROBABLE: 10-jul-23  
 F. DE TERMINO PROBABLE: 04-ago-23  
 PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

CANTIDAD: 106.20

UNIDAD: M2

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA M2	CANTIDAD 106.20	MONTO (PESOS) \$28,195.81
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO	84.62%	\$ 23,859.30
AGOSTO	15.38%	\$ 4,336.51
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 28,195.81</b>



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 10-jul-23

COMUNIDAD: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

F. DE TERMINO PROBABLE: 04-ago-23

CANTIDAD: 106.20

PLAZO DE EJEC.: 26 DIAS NAT.

UNIDAD: M2

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA M2	CANTIDAD 106.20	MONTO (PESOS) \$28,195.81
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 28,195.81
JULIO	84.62%	
AGOSTO	15.38%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 28,195.81</b>




DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

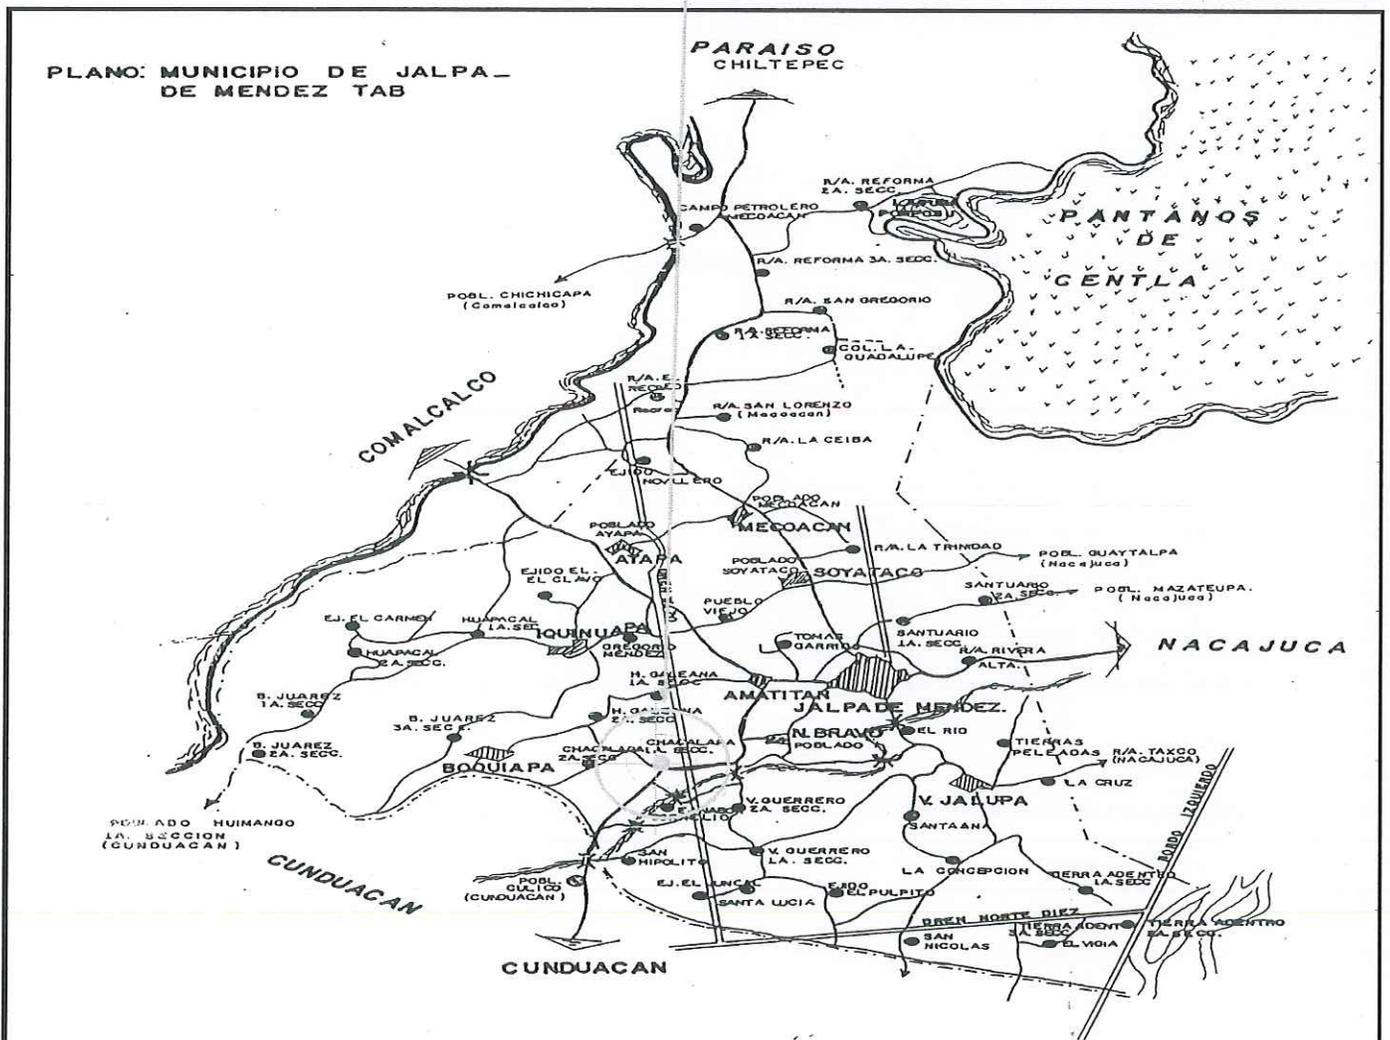

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



**MACROLOCALIZACION DEL (LA):**



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

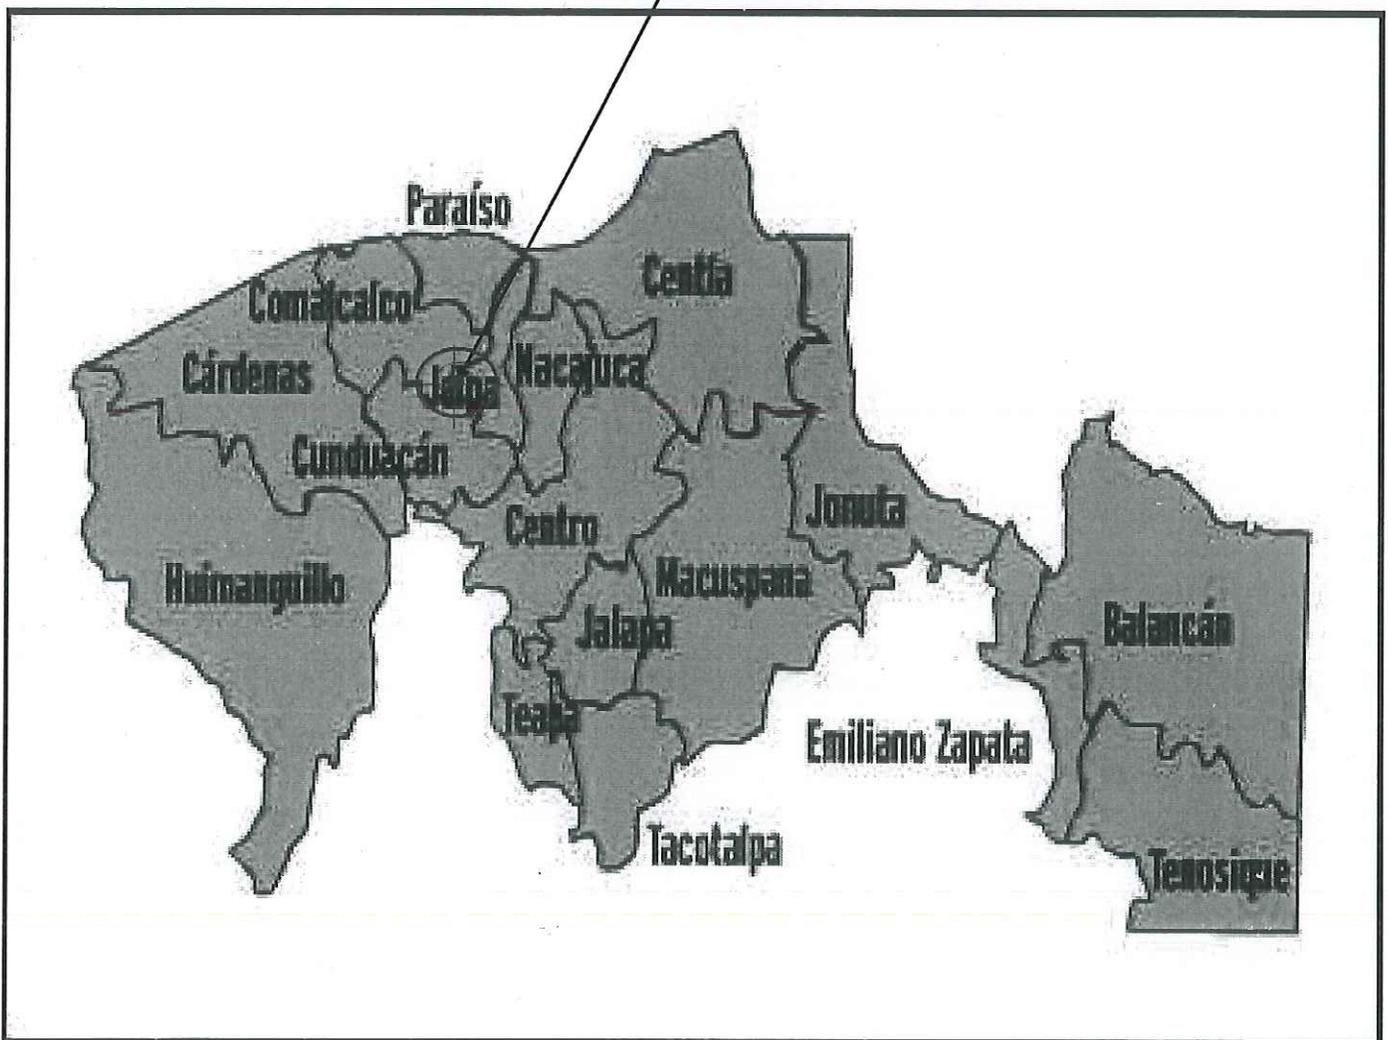

**DATOS DEL PROYECTO:**

PROYECTO: I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab. # 2





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

I0050.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.

0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: \_\_\_\_\_



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**

Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez., a ejecutarse en: 0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10050	Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.	0011.- R/a. Chacalapa 1ra. Sección.	106.2 M2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 28,195.81

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*				I0050
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Calles, Parques y Jardines				1.6.4
Línea de acción	Saneamiento de calles, avenidas, banquetas y guarniciones de la ciudad.				1.6.4.1
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10050		BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*					
Localidad (clave y descripción)	0011		Chacalapa 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,781	Hombres	887	Mujeres	894	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023			Inversión pendiente		
0.00	0.00		0.00			0.00		
Meta total	Unidad de medida		Meta programada			Meta pendiente		
106.20	M2		106.20			0.00		
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:				
Inicio 10/07/2023				Administración				
Término 04/08/2023								
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	84.62	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	15.38	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				28,195.81
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	23,859.29	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	4,336.52	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	28,195.81	4to Trim.	0.00	

<b>ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS</b>								
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO				
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado	
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00	
01/06/2023	TPN-JM-HT-PN-001	TPN-JM-HT-PN-001	01/06/2023	0.00	28,195.81	0.00	28,195.81	



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10050	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,414.80
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	21,781.01
Total Capitulo		28,195.81
Global		28,195.81

Vo. Ro.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 19 DE OCTUBRE DE 2023  
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10050 DESCRIPCIÓN: BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD: 0011.- R/A. CHACALAPA 1RA. SECCION MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K0018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION MUNICIPAL INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 28,195.81

META: 106.20 PLAZO DE EJECUCIÓN: 21 DIAS NAT.

UNIDAD: M2 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 25-sep-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 15-oct-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 1,781 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	<b>ADQUISICION DE:</b>				
BACHEO-MEZ-FRIO	SUMINISTRO DE MEXCLA ASFALTICA EN FRIO ARENA EMULSON PARA CARPETA SFALTICA	M3	10.60	\$ 1,625.12	\$ 17,226.27
BACHEO-EMULSION-ECM	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD ECM-62.	TN	0.16	\$ 9,478.64	\$ 1,516.58
DISCO-DIAM-14"	SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO.	PZA	2.00	\$ 2,699.00	\$ 5,398.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 24,140.85</b>
<b>16% IVA</b>					<b>\$ 3,862.54</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 28,003.39</b>

META ALCANZADA: CANTIDAD: 106.20 INICIO REAL: 1-oct-2023  
UNIDAD: M2 TERMINO REAL: 18-oct-2023  
PLAZO DE EJECUCIÓN: 18 DIAS NAT.

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 28,003.39 SALDO POR CANCELAR: \$ 192.42

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Acta De Cabildo  
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha  
18-may-2023

Inversion Programada  
\$ 28,195.81

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 **Francisco VILA** GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE TABASCO

**TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCIÓN**

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS

POR LA COMUNIDAD: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024

CARGO: JUAN PABLO BADAL HERNANDEZ DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD DELEGACIÓN MUNICIPAL R/A. CHACALAPA TRA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.


Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Razones: \_\_\_\_\_  
Nombre y firma: \_\_\_\_\_





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23

PROYECTO: I0050.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ


LOCALIDAD: 0011.- RA. CHACALAPA 1RA SECC. PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
<b>RA. CHACALAPA 1RA</b>								
BACHEO-MEZ-FRIO		SUMINISTRO DE MEXCLA ASFALTICA						
		EN FRIO ARENA EMULSON PARA						
		CARPETA SFALTICA						
			1.00	1.30	0.80		1.04	
			2.00	1.50	0.25		0.38	
			3.00	2.70	0.20		0.54	
			4.00	2.50	0.15		0.38	
			5.00	3.40	0.20		0.68	
			6.00	1.90	0.20		0.38	
			7.00	9.40	0.20		1.88	
			8.00	38.00	0.20	7.60		
			9.00	18.00	0.20	3.60		
			10.00	36.00	0.20	7.20		
			11.00	3.00	0.20	0.60		
			12.00	2.00	2.15	4.30		
			13.00	1.00	1.15	1.15		
			14.00	2.50	0.30	0.75		
			15.00	3.50	0.90	3.15		
			16.00	20.00	0.20	4.00		
			17.00	4.20	0.20	0.84		
							38.46	

Supervisor de Obra  
Ing. Guadalupe Juárez Ruiz



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23

PROYECTO: I0050.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD: 0011.- RA. CHACALAPA 1RA SECC.

PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
			18.00	1.50	0.20		0.30	
			19.00	2.10	0.20		0.42	
			20.00	1.20	0.20		0.24	
			21.00	3.60	0.20		0.72	
			22.00	2.40	1.00		2.40	
			23.00	3.20	2.20		7.04	
			24.00	1.60	0.20		0.32	
			25.00	1.91	1.30		2.48	
			26.00	1.70	1.20		2.04	
			27.00	0.50	0.30		0.15	
			28.00	7.00	0.20		1.40	
			29.00	2.30	1.00		2.30	
			30.00	7.10	0.20		1.42	
			31.00	5.90	0.20		1.18	
			32.00	11.30	0.40		4.52	
			33.00	3.00	0.20		0.60	
			34.00	1.80	0.30		0.54	
			35.00	7.50	0.20		1.50	
			36.00	1.40	0.40		0.56	
			37.00	2.50	1.70		4.25	
			38.00	3.50	0.50		1.75	
			39.00	2.80	0.90		2.52	
			40.00	25.00	0.30		7.50	
			41.00	7.60	0.20		1.52	47.67

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23

PROYECTO: 10050.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ

LOCALIDAD: 0011.- RA. CHACALAPA 1RA SECC.

PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
			42.00	9.00	0.20		1.80	
			43.00	1.20	0.70		0.84	
			44.00	0.70	0.40		0.28	
			45.00	9.20	0.20		1.84	
			46.00	6.10	0.20		1.22	
			47.00	2.91	0.20		0.58	
			48.00	2.50	0.50		1.25	
			49.00	2.50	0.50		1.25	
			50.00	10.00	0.30		3.00	
			51.00	4.00	2.00		8.00	20.06
							<b>TOTAL</b>	<b>106.20</b>
		SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA						
		CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO						
		DE BAJA VISCOSIDAD ECM-62.						
BACHEO-EMULSION-ECM				106.20	1.50		159.29	<b>159.29</b>

Supervisor de Obra

Ing. Guadalupe Suarez Ruiz



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23

**PROYECTO: 10050.-BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ**

**LOCALIDAD: 0011.- RA. CHACALAPA 1RA SECC.**

**PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.**

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
DISCO-DIAM-14"		SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO.			PZ		2.00	

Supervisor de Obra  
Ing. Guadalupe Suárez Ruiz

Con este hecho se da apertura a la presente Bitacora de obra Referente a los trabajos del Proyecto que a continuación se describe.

Proyecto: I0050 Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

Localidad: 0011 - Rta. Chacalupa 1ra Sección

Meta: 106.20 m<sup>2</sup>

Inversión Programada: \$ 28,195.81

Origen de los Recursos: Ramo 23 Hidrocarburos Terrestre

Modalidad: Administración Directa

Fecha de Inicio: 01 de Octubre de 2023

Fecha de Terminación: 18 de Octubre de 2023

Residente de obra

Ingr. Guadalupe Juárez Ruiz

01/oct/23

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto NO. E0050 Bacheo de Pavimento Asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez, en la Rta. Chacalapa Iru Secc.

En este día solo se recibió el Material correspondiente al Proyecto para su ejecución.

Residente de obra.

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz.

02/oct/23

Nota: 02.

Se inicia con los trabajos de bacheo de Pavimento, se realiza acorteo del Material Mezcla Asfáltica en frío para proceder a su aplicación.

Se realiza limpieza del bache a tractor retiro del Material donado para su completa adrencia a la carpeta y base existente, aplicación del riego de Impregnación con emulsion Asfáltica catiónica de imprimiento Medio y tendido de la Mezcla Asfáltica en frío Arena-emulsión, y nivelado para realizar compactación con placa vibratoria Manual quedando 1cm por encima de la carpeta existente, iniciando en los límites de esta bachería con cuadración. Trab. realizando el tratado de 7 baches, en este día.

Residente de obra

Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

04/oct/23

Nota: 03

Se continua con el bacheo con Mezcla Asfáltica en frío en la carretera principal de la Rta. Chacalapa día sección. Se realiza carga del material en camioneta chevrolet de bacheo, y se procede a trasladarse al lugar.

Se procede a la limpieza del bache a bache para recibir el riego de impregnación para posterior realización del bacheo de la Mezcla Asfáltica en frío. A continuación se compacta el material quedando con la superficie de la carpeta existente, en este día se llega hasta el bache No. 14 de acuerdo al croquis de localización.

Residente de obra.

  
 Ing. Guadalupe Juárez Ruiz.

Nota: 04

07/oct/23

Se continua con el bacheo en carretera principal de la Rta. Chacalapa día sección del Municipio de Soles de Hidalgo.

Se realiza el mismo procedimiento de bacheo de bacheo, concluyendo hasta el bache No. 21 de acuerdo al croquis de localización.

Residente de obra

  
 Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

10/oct/23

Nota: 05

Se continua con el bacheo con Mezcla Asfáltica en frío en carretera principal de la Rta. Chacalapa 1ra. Sección.

Se realiza carga del Material y se trasladada al lugar para realizar limpieza del bache a través riego de impregnación, tendido y compactado del material. en este día se realiza el bacheo hasta el no. 28 de acuerdo al croquis.

Debe Señalar que los trabajos descritos solo se realizan con 3 personas por eso es que es poco el avance físico del Proyecto.

Residente de obra

  
 Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

Nota: 06

13/oct/23

Se continua con el bacheo con Mezcla Asfáltica en frío A/cera Emulsión, en carretera principal de la Rta. Chacalapa 1ra Sección.

En este día se continúan baches hasta el no. 35 de acuerdo al croquis.

Residente de obra

  
 Ing. Guadalupe Juárez Ruiz

Nota: 07

16/oct/23

Se continua con el bacheo en calle principal de la Rta. Chacalapa 1ra Secc.

Se realiza limpieza de la superficie, tiego de impregnación con emulsión Asfáltica Cationica de rompimiento medio por medio de una Escofa de paja a razón de 1.5 Lts por  $m^2$  aproximadamente para después realizar el tendido de la Macela y compactado, dejando aproximadamente 1cm por encima de la Carpeta existente en este día se llega al bache No. 42 - de acuerdo al Croquis de localización.

Residente de obra Ing. Guadalupe Juarez Ruiz.

Nota: 08.

18/oct/23.

Con esta fecha se dan por concluidos los trabajos de bacheo con Macela Asfáltica en día hasta el bache No. 51 de acuerdo al croquis de localización, teniendo un total de 106.20  $m^2$  de bacheo correspondiente al Proyecto 10050 Bacheo de Pavimento Asfáltico en el municipio de Jalpa de Méndez en la Rta. Chacalapa 1ra Secc.

Residente de obra.

Ing. Guadalupe Juarez Ruiz



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23  
PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.

PROYECTO: I0050 .BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ  
LOCALIDAD: 0011.- R/A. CHACALAPA 1RA SECCION

### ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA  
ING. GUADALUPE SUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23  
PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.

PROYECTO: I0050 .BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ  
LOCALIDAD: 0011.- R/A. CHACALAPA 1RA SECCION

### ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRAS  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO  
01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION  
18-oct-23  
PLAZO DE EJECUCION  
18 DIAS NAT.

PROYECTO: I0050 .BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ  
LOCALIDAD: 0011.- R/A. CHACALAPA 1RA SECCION

### ALBUM FOTOGRAFICO

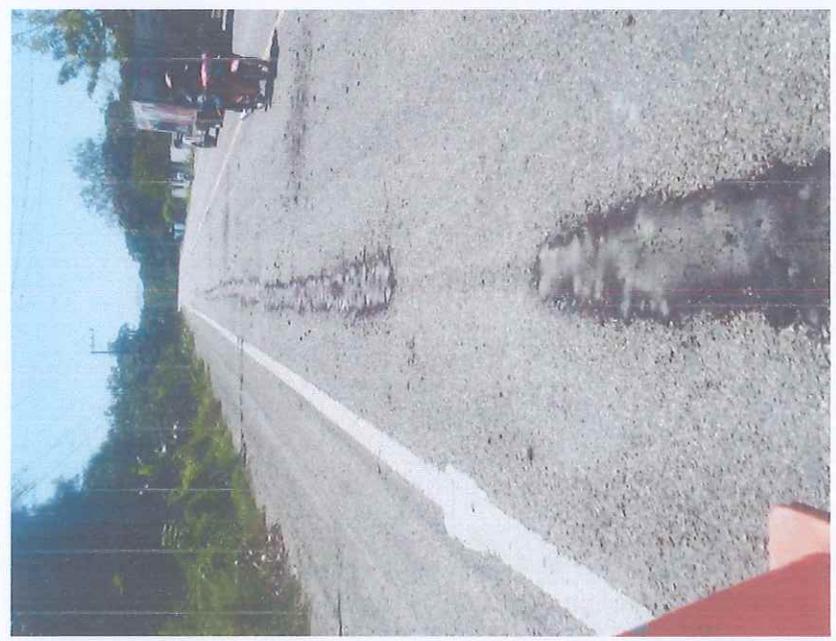

RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE LÓPEZ RUIZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS ORDENAMIENTO  
MUNICIPALES Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




FECHA DE INICIO  
01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION  
18-oct-23  
PLAZO DE EJECUCION  
18 DIAS NAT.

PROYECTO: 10050 .BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE  
MENDEZ

LOCALIDAD: 0011.- R/A. CHACALAPA 1RA SECCION

### ALBUM FOTOGRAFICO

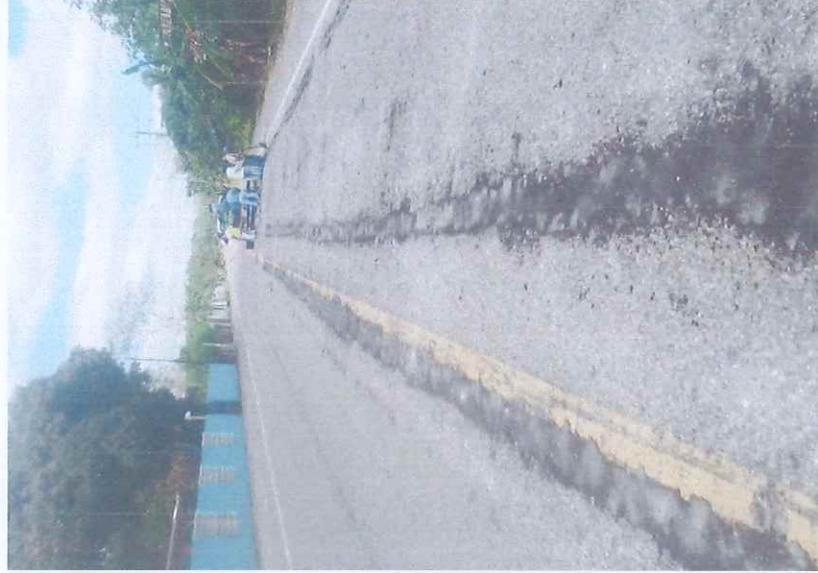

RESIDENTE DE OBRA  
ING. GUADALUPE SUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 01-oct-23  
FECHA DE TERMINACION 18-oct-23  
PLAZO DE EJECUCION 18 DIAS NAT.


PROYECTO: I0050 .BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ  
LOCALIDAD: 0011.- R/A. CHACALAPA 1RA SECCION

### ALBUM FOTOGRAFICO




RESIDENTE DE OBRA  
ING. GUADALUPE DIAZ RUIZ

LOCALIZACION



UBICACION



ELABORA  
ING. GUADALUPE HERRERA RUIZ  
RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE JALPA DE MENDEZ

DIRECCION: OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL CEMENTERIO DE JALPA DE MENDEZ  
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TAMAULI  
FECHA: 05.10.12

PROGRAMA: RAMO DE INGENIERIA CIVIL  
PROYECTO: CROQUIS DE BACHEO


ESTADO: TAM.  
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ  
PROYECTO: CROQUIS DE BACHEO  
CROQ-01



**CEMENTERIO**



LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORÓ  
ING. GUADALUPE HERRERIZ  
RESIDENTE TÉCNICA

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

ENTIDAD: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

PROGRAMA: RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES  
PROYECTO: CROQUIS DE BACHEO

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14


ESTADO: ODLI. P.A. CHALAPA 1RA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, PUNICO  
MAYE: 19/03/14

**GASOLINERA**




**ENTRADA A RA.  
CHALAPA 2DA. SECC**


**ENTRADA A RA.  
NABOR CORNELIO**

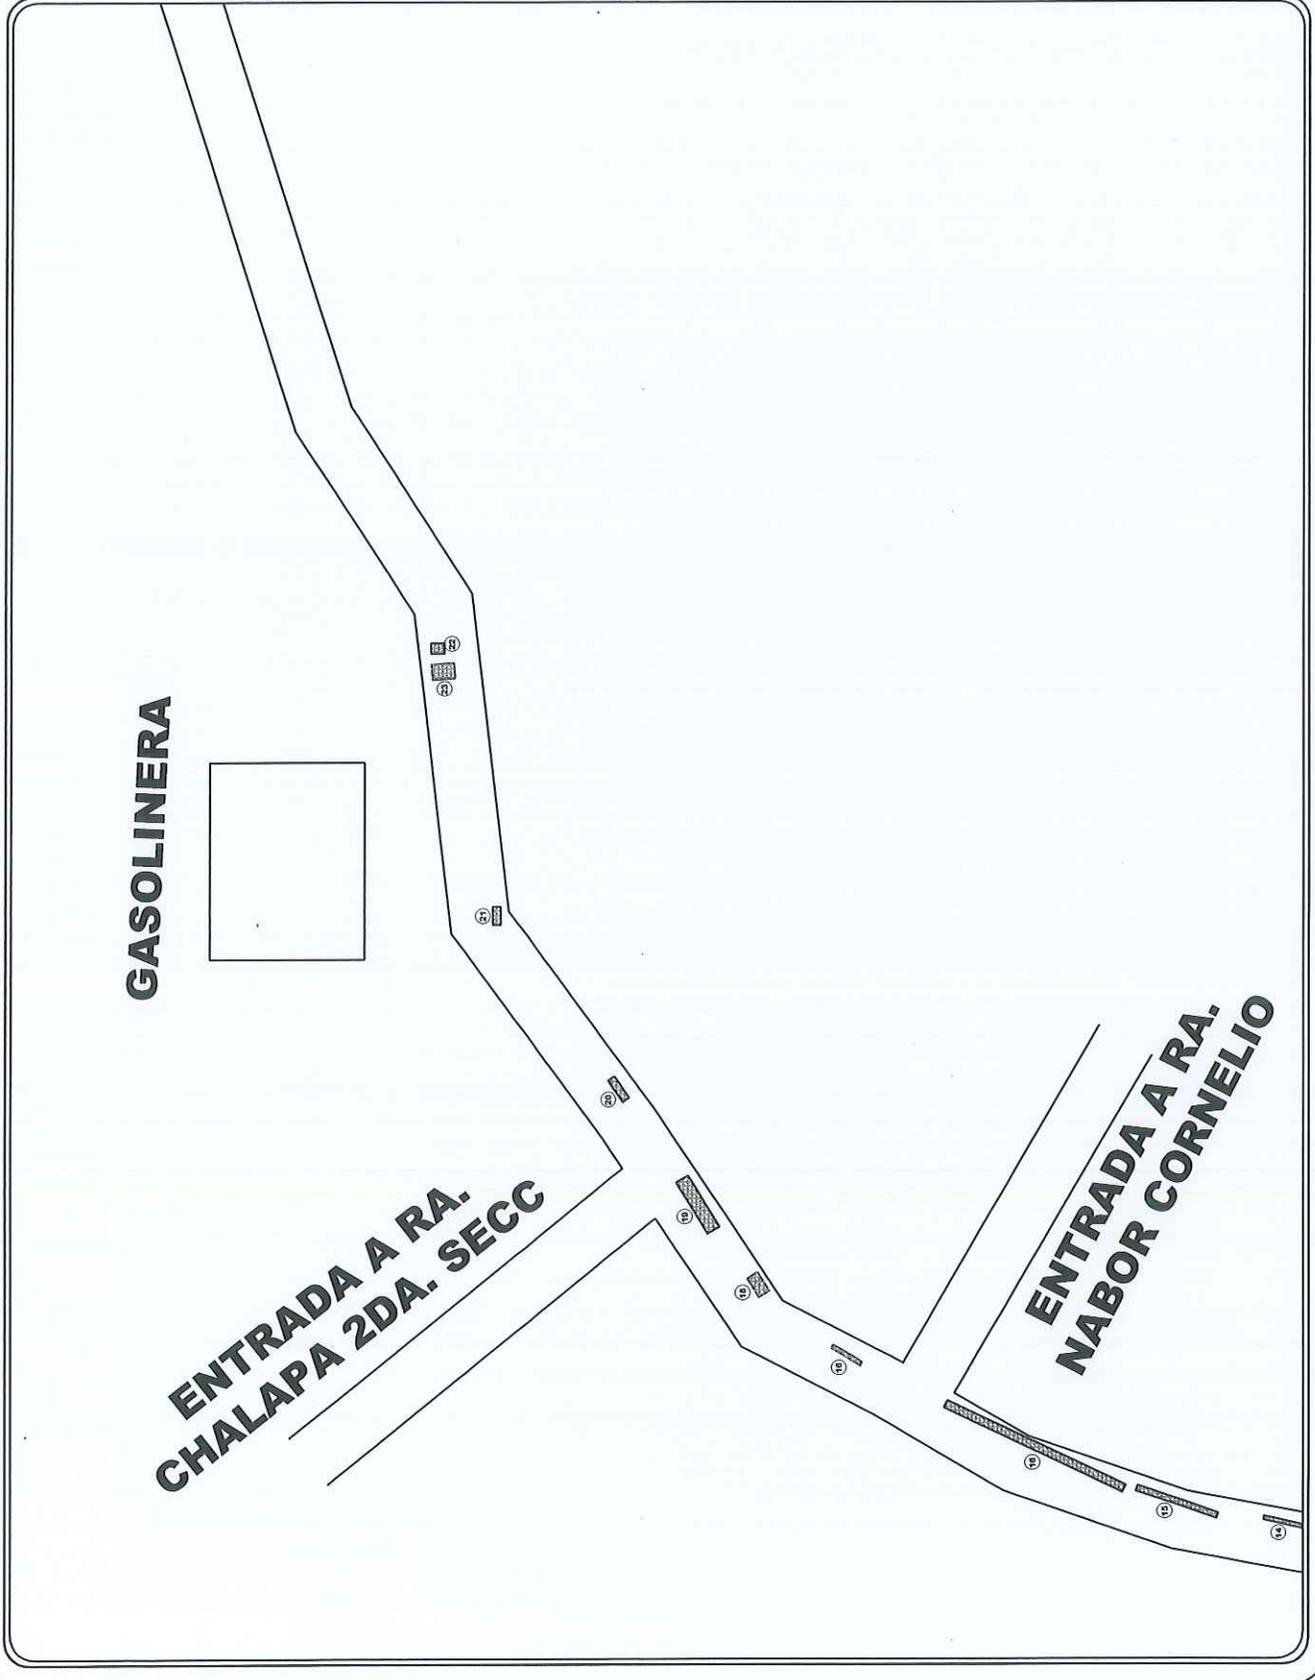

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORÓ  
ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ  
RESIDENDE DE OIBKA




PROYECTO: REDES: BACHOS DE PARRALES, MANANTIALES DE EL BARRIO DE JALPA DE MÉNDEZ

DIRECCIÓN: 0014 - RA. CACALAPAN 1MA. SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
AÑO: 1982-1983


PROGRAMA: BACHOS 23 HIDROCARBIDOS TERRESTRES  
CROQUIS DE BACHOS

ESTADO DE TABASCO  
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ  
CROQ-01


**ENTRADA A RA. NICOLAS BRAVO**  
**ENTRADA A RA. VICENTE GUERRERO**  
**2DA. SECC**



LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORÓ  
ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ  
RESIDENTE DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE PAQUETES, ANILLOS Y DE ALARGOS DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

ENTRADA: 2011 A LA CALLE CHICALPANA VAL SECCION  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, JALISCO  
MADE: 10/03/12

PROGRAMA: PAM 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES  
PROYECTO: CROQUIS DE BACHEO

ESTADO: JALISCO  
MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ  
PROYECTO: CROQUIS DE BACHEO  
CROQ-01

